



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2021
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
6. Listado de Casos que presentan las Direcciones de Construcción de Obras Públicas "A" y "B"
 - 6.1 Listado de Casos número DCOP"A"/01/2021
 - 6.2 Listado de Casos número DCOP"B"/03/2021
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10 ª. SESION ORDINARIA 2021

3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2021

000 0004



ACTA DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 30 de septiembre del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Dr. Roberto Beristáin Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudasio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas y el Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1". -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Novena Sesión Ordinaria 2021, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de Octava Sesión Ordinaria de 2021. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2021. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2021, y se recabará sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta **Acuerdo 08-09/2021** referente a la aprobación del Acta de la Segunda Convocatoria de la Séptima Sesión Ordinaria 2021 aprobándose de manera unánime en la Octava Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 26 de agosto de 2021, algún comentario al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----



5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 31 de agosto de 2021, se indica que se realizaron 5 contrataciones por Adjudicación Directa; informa que se realizaron 9 contratos por Invitación Restringida a cuando menos tres personas; así como también la realización de un contrato por Licitación Pública, algún comentario al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el informe correspondiente al mes de agosto de 2021, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios 2008 al 2018, con corte al 31 de agosto de 2021, debido a que estos no han presentado variación alguna, por lo cual somete a consideración del Pleno su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con la Orden del Día propuesta.

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, continúa con el Orden del Día propuesto.

6. Listado de Casos que presentan las Direcciones de Construcción de Obra Pública "B" y "D".

6.1 Listado de Casos Número DCOP" B" /02/2021.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos Número DCOP" B" /002/2021, referente a la contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa de los "Trabajos de Infraestructura Emergente para la puesta en Operación de la Línea "T" en Tláhuac"; con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 inciso a fracción I, 5, 23, 24, inciso C, 61, 63, fracciones II y VII de la Ley de Obras



Públicas del Distrito Federal y artículos 75 y 75B fracciones I, II, III de su Reglamento Con un monto aproximado de \$6'000,00.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.) incluye IVA. Para lo cual cedo la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, para exposición del Caso. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** comenta como se presentó en la Segunda Convocatoria del Subcomité en la 7ª. Sesión Ordinaria de fecha 5 de agosto, solo me referiré a los datos más particulares de esta obra para lo cual cedo la palabra al Ing. José Luis Pichardo Hernández para la exposición de estos trabajos. -----

El **Ing. José Luis Pichardo Hernández** mediante diapositivas expone, en la sesión en comento expusimos los trabajos emergentes que realizamos para la Línea 12 de Tláhuac, como es la instalación de la Línea del metrobús, en la cual nos habían solicitado una estación adicional que es Periférico Oriente, como pueden ver en la presentación se distinguen las 5 estaciones construidas; se mencionó también que aunque son estaciones provisionales se debe contar con todas las medidas de seguridad y es a lo que se avocó la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, construyó la infraestructura para el funcionamiento de las instalaciones en la estación Atlalilco, la plataforma de concreto para colocar las escaleras, las plataformas metálicas para el acceso, la colocación de las líneas de paro, barandales que limitan el acceso para la estación para dar un flujo adecuado, rampa de acceso universal, todas las escaleras cuentan con una rampa para el acceso de las personas que tengan alguna discapacidad, además a todas las rampas y escaleras se les colocó una cinta antiderrapante para cualquier accidente, el metrobús nos solicitó colocar unas gavetas para el resguardo de una planta de energía eléctrica, así como los objetos del personal que labora en la estación, también las pantallas de su sistema que muestra el estado de los autobuses; se pintaron de 2 colores diferentes uno para los usuarios en general y otro exclusivo para las mujeres y niños menores de 12 años. -----

Respecto a la estación Periférico Oriente en general son los mismos conceptos, en algunas estaciones implementamos pasos seguros en las banquetas laterales para el acceso a personas con discapacidad, con la finalidad de que contaran con las medidas de seguridad necesarias para su acceso al sistema del metrobús. -----

Las escaleras se diferencian respecto a cada estación, así como su ubicación, algunas tienen tipo "L" otras tipo "C", además de la señalización como en cualquiera estación del metrobús. - En la estación terminal Tláhuac es más amplia al ser la terminal y cuenta con 4 plataformas de ascenso y descenso para los usuarios. -----

Estos son los trabajos realizados, la Línea se encuentra en operación, el sistema del metrobús nos comenta que está transportando más de 45 mil personas al día con 60 autobuses resolviendo la problemática derivada por el colapso de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México; la solicitud al Pleno del Subcomité es la aprobación de este Caso, a través de adjudicación directa al rebasar el monto de actuación para tal situación, estoy atento para cualquier duda o pregunta. Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa que ya se cuenta con la suficiencia presupuestal, para la formalización del contrato si es que se aprueba el Caso; es importante mencionar que



estos trabajos están funcionando de manera adecuada además con la estación que se instaló en Tezonco y de la habilitación de 2 rutas, una que llega al metro Atlalilco que es la conexión con la Línea 8 del metro y otra más que se conecta a la Línea 5 que es la más reciente y llega al metro Coyuya, estos trabajos han impactado de manera significativa al igual que otros sistemas de transporte al brindar el servicio que dejó de prestar la Línea 12 del Metro. -----

Pregunta si existen comentarios o preguntas al respecto, al no haberlas somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, en contra ninguno, abstención ninguna, por lo que se aprueba el caso No. DCOP "B" /02/2021, por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

6.2 Listado de Casos No. DCOP"D"/01/2021. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos Número DCOP" D" /001/2021, referente a Los Trabajos de Apuntalamiento y Reforzamiento de la Cubierta de la Fase II del Templo Mayor; con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 inciso a, 24 inciso C, 61, 63, fracciones I y II, 64 BIS de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y artículos 75B fracciones I, II, III de su Reglamento. Con un monto aproximado de \$2'500,00.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) incluye IVA. Para lo cual cedo la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez, para exposición del Caso. ----

El Mtro. **Efraín Álvarez Martínez** informa que en la 6ª. Sesión Ordinaria del día 24 de junio del presenta año el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH), solicitó llevar a cabo unos trabajos de reforzamiento en la techumbre de la Casa de las Águilas a causa del fenómeno pluvial acontecido durante ese mes y dañando dicha estructura; en esa Sesión en comento hice la presentación en que consistían los trabajos, además de no contar con la suficiencia presupuestal. -----

Es por eso que el día de hoy al contar con el presupuesto a favor, donde nos otorgan 2 millones y medio de pesos para la realización de estos trabajos; el avance con que se cuenta ahora es sumamente importante al conciliar con el (INAH) la protección de los espacios escultóricos con un material específicamente autorizado por ellos, que se trata de un geomaya para la protección de pisos y escaleras para iniciar los trabajos de reforzamiento el cual nos ha llevado bastante tiempo, vamos a colocar apuntalamiento en la estructura que tenemos actualmente y reforzar las bases en este caso la cimentación, con base en lo que le he presentado, solicito la autorización del Pleno del Subcomité la contratación a través de adjudicación directa para la realización de estos trabajos con un monto aproximado de 2 millones y medio, gracias. ----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existen comentarios o preguntas al respecto, al no haberlas somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, en contra ninguno, abstención ninguna, por lo que se aprueba el caso No. DCOP "D" /01/2021, por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2021

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
09-10/2021	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ORGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria, el día 30 de septiembre de 2021.
09-11/2021	LISTADO DE CASOS No. DCOP ^B 02/2021 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EMERGENTE PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LÍNEA "T", EN TLÁHUAC.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria, el día 30 de septiembre de 2021.
09-12/2021	LISTADO DE CASOS NO. DCOP ^D 01/2021, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA FASE II DEL TEMPLO MAYOR	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria, el día 30 de septiembre de 2021.



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
		NO APLICA PARA ESTE MES							

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ADRIÁN MOLNAR EYSEL
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
B	OPR-DCOB-L-037-2021	09CCOP-M-L-S-114-21	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR INFERIOR CHAMIXTO EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	\$ 2,453,190.57	DYAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		X	23-sep-21	23-nov-22
B	OPR-DCOB-F-002-2021	09CCOP-M-F-S-109-21	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CINETECA NACIONAL, CHAPULTEPEC Y ÁREAS EXTERIORES	\$ 5,911,552.42	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.		X	07-sep-21	31-dic-21
B	OPR-DCOB-F-003-2021	09CCOP-M-F-S-112-21	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO CON PLAZA DE ACCESO DE LA CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC.	\$ 2,899,886.64	CAMEDI INGENIERIA, S.A. DE C.V.		X	20-sep-21	31-dic-21


DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS



MTO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELE
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TERMINO
D	999000000-DGCOF-L-440-2021	DGCOF-LPN-L-1-196-21	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA (QUETZAL) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 7,153,165.32	GRUPO ROLLOS, S.A. DE C.V.	X		05-sep-21	26-dic-21
D	999000000-DGCOF-L-441-2021	DGCOF-LPN-L-1-196-21	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA (QUROGA) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 7,190,846.30	INCONST INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		05-sep-21	26-dic-21
B	999000000-DGCOF-L-442-2021	DGCOF-LPN-L-4-111-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR INFERIOR CHAMXTO EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 82,386,962.88	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	X		20-sep-21	19-dic-21
B	999000000-DGCOF-F-403-2021	DGCOF-LPN-F-4-103-21	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y PLAZA DE ACCESO A LA CNETSCA NACIONAL CHAPULTEPEC	\$ 72,700,011.11	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		27-sep-21	31-dic-21
C	999000000-DGCOF-F-403-2021	DGCOF-LPN-F-1-116-21	TRABAJOS DE READECUACIÓN PARA LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESUS CARRANZA 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 96200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 13,094,234.04	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	X		10-sep-21	29-dic-21
C	999000000-DGCOF-F-404-2021	DGCOF-LPN-F-1-113-21	TRABAJOS DE OMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESUS CARRANZA 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 96200, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 29,734,338.33	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVARA, S.A. DE C.V.	X		20-sep-21	31-dic-21
B	999000000-DGCOF-F-405-2021	DGCOF-LPN-F-4-118-21	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AGORA, ARCOTECHOS Y 1 Y 2. PORD AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS	\$ 90,314,166.50	ACCUBO, S.A. DE C.V.	X		01-oct-21	18-mar-21


DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERON
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


MTO. RICARDO CEDILLO DEL RIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. ADRIAN MOLINA EYSELE
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	221049K006	25P210	63212179	O13ML0002	878,653,162.00	878,653,162.00	801,792,367.88	625,103,459.33	878,653,162.00
07C001	221049K005	15O210	61512179	O19ML0007	0.00	203,300,000.00	203,300,000.00	199,073,268.38	200,000,000.00
07C001	221049K005	15O810	61512179	O19ML0007	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343117E116	25P210	61212179	O19ML0009	383,983,773.00	383,983,773.00	255,247,028.04	79,419,550.45	298,488,002.33
07C001	221049K005	15O210	61512179	O20ML0017	30,000,000.00	30,000,000.00	27,757,780.50	26,593,614.32	27,035,031.34
07C001	356024E042	15O210	61512179	O20ML0019	11,790,432.00	490,432.00	399,953.87	399,953.87	399,953.88
07C001	356024E042	15O810	61512179	O20ML0019	0.00	10,425,059.75	2,224,838.40	0.00	0.00
07C001	251024K002	15O110	61212179	O20ML0064	50,000,000.00	12,000,000.00	3,132,557.65	2,901,184.13	5,207,542.77
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0074	57,000,000.00	46,576,225.64	40,734,338.72	33,822,210.83	46,576,225.64
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0075	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15O810	61212179	O20ML0076	150,000,000.00	128,147,550.16	126,156,457.08	88,649,862.77	128,138,548.14
07C001	221049K005	15O110	61512179	O21ML0024	0.00	50,000,000.00	9,021,907.81	0.00	0.00
07C001	268294P004	15O210	61212100	O21NR0036	40,000,000.00	39,440,000.00	34,887,442.38	30,529,734.18	39,439,999.99
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0037	10,000,000.00	10,000,000.00	6,534,563.82	4,492,294.52	9,985,721.78
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0038	7,000,000.00	7,000,000.00	6,319,869.51	5,805,236.75	6,951,285.83
07C001	221049K005	15O110	61512100	O21NR0038	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0039	40,000,000.00	40,000,000.00	23,223,903.36	23,035,812.15	36,055,279.50
07C001	221049K005	15O810	61512100	O21NR0039	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0040	35,000,000.00	31,700,000.00	11,313,721.14	5,088,709.62	23,152,290.98
07C001	221049K005	15O810	61512100	O21NR0041	50,000,000.00	599,778.65	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O110	61212100	O21NR0042	987,665.00	987,665.00	296,299.67	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P210	61212100	O21NR0042	19,012,335.00	19,012,335.00	11,343,807.11	5,172,040.23	16,907,788.93
07C001	343024K010	15O810	61212100	O21NR0043	50,000,000.00	50,000,000.00	27,655,214.73	11,310,044.03	47,385,803.25
07C001	343024K010	15O110	61212100	O21NR0044	80,000,000.00	30,100,000.00	1,709,089.07	1,709,089.07	26,060,640.42
07C001	251024K002	15O110	61212100	O21NR0233	50,000,000.00	50,000,000.00	27,724,310.91	12,199,420.64	43,473,235.02
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0234	25,000,000.00	25,000,000.00	11,608,428.64	4,108,428.64	24,065,054.56
07C001	222024K004	15O810	61512100	O21NR0290	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00

01X0017



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	221049K005	15O110	61512100	O21NR0291	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61212100	O21NR0325	0.00	8,000,000.00	7,534,827.94	7,534,827.94	8,000,000.00
07C001	343024K010	15O210	61212100	O21NR0326	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	231087K001	15O110	61212187	O21NR0327	0.00	741,761.24	741,761.24	0.00	510,328.01
07C001	343024K010	25R513	61212100	O21NR0501	0.00	325,000,000.00	225,000,000.00	40,500,054.54	135,000,181.79
07C001	343024K010	25M205	61212100	O21NR0502	0.00	97,455,468.42	97,455,468.42	97,455,468.42	97,455,468.42
07C001	343024K010	15O210	61512100	O21NR0529	0.00	11,300,000.00	5,759,843.60	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O810	61512100	O21NR0529	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O110	61512100	O21NR0529	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0531	0.00	560,000.00	560,000.00	110,662.14	533,551.11
07C001	251024K002	25E113	61212100	O21NR0588	0.00	70,533,000.00	23,511,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O110	61512100	O21NR0803	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O110	61512100	O21NR0878	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O110	61512100	O21NR0879	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	25P612	61212100	O21NR0910	0.00	36,762,348.48	36,762,348.48	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P612	61212100	O21NR0911	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00
07C001	222024K004	15O110	61512100	O21NR0957	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O110	61512100	O21NR0959	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
07C001	231087K001	15O210	85311100		0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
					2,368,427,367.00	2,737,468,559.34	2,148,809,129.97	1,355,014,926.95	2,149,475,095.69

4 000 0018



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0021

IMPORTE DE AVANCE PÉRDIDO PARA OBRAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DEL COMÚN PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS QUE NO SON

Fecha al 31 de septiembre de 2011

CÓDIGO	CONTRATO	H	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONFIRMADOS EJECUCIÓN (M\$)	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERDIDO - MONTE			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	RECIBO	PAGADO	EN TRÁMITE	PÉRDIDA	FINANCIERO (PAGADO)	
					Contratación del Asesorado Consultoría (Las Torres) ubicado en la intersección de Av. Cuauhtémoc y Av. Benito Juárez (26 de Febrero) en las Delegaciones Centro Histórico y Miguel Alemán			\$1,275,000.00	\$0.00					\$0.00	\$1,275,000.00	\$0.00			
1	VOT-11-2-00000000	00	00	SEMPER S.A. DE C.V.	Asesoría de la Construcción del Sistema de Transporte Público en la Delegación Centro Histórico	20/09/2011	31/03/2012	\$1,275,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,275,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.F. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN
					Portal de Puente, ubicado en las líneas 201400, 201401 y 201402 de la Autopista México-Puerto en las líneas de la Delegación Miguel Alemán con el Municipio de la Paz, Estado de México			\$1,128,000.00	\$0.00					\$0.00	\$1,128,000.00	\$0.00			
2	VOT-11-2-00000000	00	00	GRUPO VOT-11-2-00000000 S.A. DE C.V.	Construcción de Puente de Acceso Carretero en la Autopista México - Puerto	01/02/2011	10/06/2011	\$1,128,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,621,000.00	NA	NA	\$0.00	\$2,128,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO DE INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ AL CUENTA EL IMPORTE DE \$258,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62. ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS POR IR L.2 008, INDE AD L.2 415 Y - POR AD L.2 390. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								\$2,403,000.00							\$2,403,000.00				
					Asesoría de la Unidad del Ite 10 Sur, Puente Vehicular Dependiente del Muro de la Autopista México - Puerto, en la intersección de Av. Toluca y Puente Vehicular, ubicado en las líneas de la Delegación Centro Histórico y Puente Vehicular, ubicado en las líneas de la Delegación Centro Histórico			\$17,318,000.00	\$0.00					\$0.00	\$17,318,000.00	\$1,963,377.40			
3	VOT-11-2-00000000	00	00	Correa de Buen S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Unidad del Ite 10 Sur, en la intersección de Av. Toluca y Puente Vehicular, ubicado en las líneas de la Delegación Centro Histórico y Puente Vehicular, ubicado en las líneas de la Delegación Centro Histórico	20/09/2011	30/09/2011	\$4,048,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$404,800.00	NA	NA	\$0.00	\$4,048,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-09-08.
					Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y fijos determinado del Puente Vehicular Dependiente del Muro de la Autopista México - Puerto, en la intersección de Av. Toluca y Puente Vehicular, ubicado en las líneas de la Delegación Centro Histórico y Puente Vehicular, ubicado en las líneas de la Delegación Centro Histórico	01/01/2011	01/01/2011	\$4,272,815.50	\$0.00	ANTICIPO	\$607,361.58	NA	NA	\$0.00	\$4,272,815.50	\$0.00	100.00%	10.20%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.
4	VOT-11-2-00000000	00	00	Correa de Buen S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y fijos determinado del Puente Vehicular Dependiente del Muro de la Autopista México - Puerto, en la intersección de Av. Toluca y Puente Vehicular, ubicado en las líneas de la Delegación Centro Histórico y Puente Vehicular, ubicado en las líneas de la Delegación Centro Histórico	01/01/2011	01/01/2011	\$4,272,815.50	\$0.00	AMORTIZADO	\$607,361.58	NA	NA	\$0.00	\$4,272,815.50	\$0.00	100.00%	10.20%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.
5	VOT-11-2-00000000	00	00	Ingente y Osear de las Torres S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en la intersección de las líneas de la Delegación Centro Histórico y Puente Vehicular, ubicado en las líneas de la Delegación Centro Histórico	01/01/2011	01/01/2011	\$2,048,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$204,800.00	NA	NA	\$0.00	\$2,048,000.00	\$1,363,377.40	100.00%	10.00%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADO EL 24-07-08.
SUBTOTAL								\$17,318,000.00	\$0.00					\$0.00	\$17,318,000.00	\$1,963,377.40			
GRAN TOTAL								\$25,721,000.00	\$0.00					\$0.00	\$25,721,000.00	\$1,963,377.40			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
\$25,721,000.00	\$0.00	ANTICIPO \$2,048,000.00 AMORTIZADO \$2,414,868.00 POR AMORTIZAR \$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADO EN TRÁMITE PÉRDIDA FINANCIERO	
\$1,963,377.40	100.00% \$3,455,000.00


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas
A2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

000 0023



SECRET//NOFORN

Divisão de Comunicação de Obras Públicas - DCO

Fecha de corte: Al 30 de septiembre de 2021

INFORME DE GASTOS FISCOS PARA OBRA PÚBLICA
RELACION DE CONTRATOS 2008[illegible]

TOTAL CONTRATADO	TOTAL EXERCÍCIO	TOTAL DE ANCIOSOS	
AL 31/12/2012		BR/2012	5.628,125,77
		RM/2012	1.287,198,26
		PC/2012	1.360,687,46

TOTAL DE ESTIMACIONES		SERVICIO GENERAL AL FISCAL	
PAGARAS	EN TRAMITE	FISCO	FINANCIERO
100.000.00	200.000.00	100.000.00	100.000.00

[View all comments on this page](#)

100. EXERCISES PROBLEMS QUESTIONS
CONSTRUCTIONS DE CONSTRUCTIONS DE CONSTRUCTIONS DE



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/09/2011

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTEA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADELUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 28 de septiembre de 2011

CARGO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO, MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	FINANCIADO	
					Construcción del Distribuidor Vía Anillo Periférico Anillo Norte y Anillo Sur.															
1	101-01-2-007-0004	Fuente Márquez-Ramírez	UP	Alfa Construcción y Construcción S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vía Anillo Periférico Anillo Norte y Anillo Sur. Contrato adjudicado al 18 de septiembre del 2010 a través de la Licitación Pública N.º 101-01-2-007-0004.	10/09/2010	30/09/2011	172,370,342.35	1,427,198.75	0.00	ANTICIPO	0.00								RECEPCIONADO EL 21-MAR-12 PENDIENTE DE LIQUIDAR. EXISTE UN ADEUDO DE \$241,125.52. DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ADP/03/10 DE LA CMHALDF PARA CP 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADP/03/11 DE LA CMHALDF PARA CP 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VÍCIOS OCULTOS
					TOTALES			172,370,342.35	1,427,198.75	0.00					1,427,198.75	1,427,198.75	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZACIÓN 0.00 POR INCORPORAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	FINANCIADO
1,427,198.75	0.00	100.00%	99.74%



Raúl Márquez-Ramírez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014 Y ESTÁ CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/09/2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez
La Dirección de Construcción de Obras Públicas

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de septiembre de 2014

NUMERO		F.O.	REALIZADO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CARGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PROGRESO	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana Mantenimiento de Puente Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00				0.00	187,106.04	0.00				
C	CONTRATO 14-000114	FONDO: 2014-2015	P.O.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN VIALIDADES PRIMARIAS DEL D.F.	Mejoramiento de Infraestructura Urbana Mantenimiento de Puente Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal	2014-01-01	2014-12-31	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00	NO	NO	0.00	187,106.04	0.00	100.00%	00.00%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar la cual se considera en la totalidad de ADEPAS
											ABONOS	0.00								
											POR ABONOS	0.00								
TOTAL								208,394.16	208,394.16	0.00				0.00	187,106.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00
		ABONOS	0.00
		POR ABONOS	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PROGRESO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
187,106.04	0.00	100%	00.00%



Ing. Raúl Márquez Martínez
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENEOCHTTLAN
SETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



DIAGRAMA AL 30-09-2014

INFORME DE AVANCE PAGO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2014

ORDEN	CONTRATO	F.F.	RESOLUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejecutado al 30/09/14	ECONOMÍA	ANEXOS		OBRAS (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANEXOS	NO	PROYECTO	TRABAJO	MONTO	PROYECTO	TRABAJO	PROYECTO	TRABAJO	
1	DOOP/LP/AL-1-000-14	14/04/14	L.P.	PROCESO DE AGILIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014 (PAQUETE 4) INTEGRADO POR LAS AGILIZADAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICA NO. 01, SECUNDARIA "MATEO SAMO", PRIMARIA VILLA DE SAN LUIS Y LA ESCUELA SECUNDARIA GUERRA NO. 204 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN GUERRA	01-04-14	31-09-14	\$27,187,375.54	\$27,187,375.54	0.00	ANEXOS	NO	NA	NA	NA	\$2,387,375.54	\$2,438,348.79	100.00%	27.21%	

NOTA: DADO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2" HA EFECTUO LAS ACCIONES DE AGILIZACIÓN A LAS FACULTADES DESIGNADAS LICITACIÓN Y PAGO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA AREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DAN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN AVANCE, DADO QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE ANTERIOR POR LA SUBSECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ANEXOS
\$27,187,375.54	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
\$2,387,375.54	\$2,438,348.79
	100.00%
	27.21%

SR. GUERRA GUERRA GUERRA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª, SESIÓN ORDINARIA 2021

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	4	0	0	1	3	0	4	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO ES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y ESTÁ CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2012

• Generali del 18 de septiembre de 1994

TOTAL DE ESTIMACIONES		ANEXO GENERAL AL PRESUPUESTO	
PAGOS	EN TRANSITO	FINCO	FINANCIERAS
3,796,394.64	0.00	100.00%	95.34%


 Eng. Rui Marques Martins
 Coordenador do Curso de Engenharia de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SOTE ROLLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0

000 0038



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
Tercera Sección de Contratos de Obra Pública "C"



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

ORDEN	CONTRATO	P.E.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS PAGADOS EJERCICIO 2015	SEGURIDAD	ANTICIPA		COMANDO PERMANENTE			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	ANTICIPA	INICIO	TERMINO	MONTOS	PROYECTO	DE TOTAL	PROYECTO	DE TOTAL	
1	000P-LP-1-1-05-15	000000	L.P.	GRUPO VORP S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TETAPALAPA II"	25-jun-15	21-dic-15	\$64,351,487.20	\$64,351,487.20	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$64,000,000.00	\$0.00	100.00%	99.98%	CONTRATO RESEPCIONADO. EL ORGANISMO DE CONTROL LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
2	000P-BL-5-016-15	000000	LA	ARMANDO Y ARCONDO ROSALES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TETAPALAPA II"	8-jul-15	31-dic-15	\$2,385,142.09	\$2,385,142.09	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$2,323,500.00	\$0.00	100.00%	99.44%	CONTRATO RESEPCIONADO. EL ORGANISMO DE CONTROL LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
3	000P-BL-4-021-15	000000	LA	GRUPO VORP S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRIA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PEREZ	8-ago-15	31-dic-15	\$9,898,795.33	\$9,898,795.33	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$9,898,795.33	\$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A INICIAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS.
						TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE PAGOS		TOTAL DE ANTICIPA		TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERIODO					
						\$17,724,827.61		\$17,724,827.61		\$17,724,827.61		\$17,724,827.61			0.00		100.00% 99.41%			


ING. BERNARDO GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	23	0	0	12	11	0	23	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016 EL TOTAL DE LOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas,
Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas "A"

009 0042

Copyright © 1998 by John Wiley & Sons, Inc.

2.000 0043

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BARRIOS DE DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO 2016

* Tabelle 41.19 eine detaillierte Liste des IAS 39.

SUMARIO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO EN	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			DETALLACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FINCO	FINANCERO			
6	0007-A-1-080-16	RECURSOS FISCALES	SI	ELCOSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE CV	Superación Técnica y de Control de Construcción e Instalación de la Estación de Monitoreo de Presión y Caudales en 38 Módulos de Perforación Culebras y Seguridad Pública ubicadas en las Delegaciones Tlácala con 1 Módulo, Ahuacanes con 4 Módulos, Tlácala con 4 Módulos, Ahuacanes con 10 Módulos, Coyoacán con 1 Módulo, Ahuacanes con 5 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 4 Módulos, Magdalena Contreras con 9 Módulos, Miguel Alemán con 5 Módulos, Anáhuac con 15 Módulos, Cuauhtémoc con 5 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a número de folio de personal de la Ciudad de México, a precio unitario a tenerse determinado.	20122016	20132016	837,355.45	837,205.45	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	775,845.44	0.00	100.00%	90.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Rehabilitación e Instalación de Escuelas Básicas de la Ciudad de México			50,790,853.52	50,790,853.53	0.00					0.00	49,297,295.24	0.00			
7	0007-A-1-102-16	RECURSOS FISCALES	SI	PROVEEDORA CONCACO S.A. DE CV	Rehabilitación a 4 Escuelas (Folios 11 Integrado por: Esc. Juana María Torres Benítez, Anáhuac 15, Anáhuac Benito Juárez, Carmen Benito Juárez, Cuauhtémoc No. 60, ubicadas en la Delegación Anáhuac, Ciudad de México, a precio unitario y a tenerse determinado).	20122016	20132016	9,598,425.29	9,598,425.29	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	9,308,988.00	0.00	100.00%	87.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
8	0007-A-1-102-16	RECURSOS FISCALES	SI	PROVEEDORA CONCACO S.A. DE CV	Rehabilitación a 7 escuelas (Folios 25 Integrado en: Escuela Secundaria 111, Asagasta Van Nuys, Primaria Juana María de Zaragoza, Secundaria 278, Juan Diego, Primaria Benito Juárez, Primaria Valentín Arriaga, Héroes, Primaria Adolfo Ruiz Cortés, Secundaria 1er. 60, Primaria Juan Boscán, en las Delegaciones Ahuacanes).	20122016	20132016	10,218,773.09	10,218,773.09	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	87.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-sep-17.
9	0007-A-1-102-16	RECURSOS FISCALES	SI	PROVEEDORA CONCACO S.A. DE CV	Rehabilitación a 10 Escuelas (Folios 8) Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Prof. Emma Gueña, Escuela Primaria Francisco de México, Escuela Primaria Antonio Gallo, Primaria Benito Juárez, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Intergeneracional de Héroes, Primaria Ciudad México, Escuela Secundaria No. 20 José Felipe Lugo, Escuela Secundaria 19, 60, "Luisa Cordero", Escuela Primaria Ángel Arguero, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Cuauhtémoc, Escuela Primaria Francisco GARCÍA, Escuela Primaria Agustín Aragón, Escuela Secundaria 285, Escuela para todos, Jardín de niños Francisco G. Padilla, Jardín de niños Santo Reginaldo, Pasa M. 800/19801, Jardín de niños Francisco L. González, en las Delegaciones Miguel Alemán y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	20122016	20132016	9,997,679.40	9,997,679.40	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	9,338,801.58	0.00	100.00%	87.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-sep-17.
10	0007-A-1-080-16	RECURSOS FISCALES	SI	DISTRIBUCION SAN S.A. DE CV	Rehabilitación a 10 escuelas (Folios 9) Integrado por: Escuela Pasa Amado Rami, Pasa Enrique de Salazar y García, Anáhuac La, Asagasta Cuauhtémoc, Pasa Toluquense, Pasa Centro, Centro, Pasa Miguel Alemán, Pasa Carlos A. Cotto, Pasa Ciego, Pasa José Joaquín Torres, Pasa Intergeneracional, Pasa Pasa Enrique de Salazar y García, en las Delegaciones Benito Juárez y Ahuacanes, en la Ciudad de México. A precio unitario, a tenerse determinado).	20122016	20132016	10,444,836.85	10,444,836.85	0.00	ANTICIPA	0.00	NA	NA	0.00	10,131,090.54	0.00	100.00%	87.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.

Conto di R. 99. 14/09/2021

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
89.682.991,47		0,00	ANTICIPO	0,00
			AVANCE (A/D)	0,00
			PRO ABONOS	0,00

TOTAL DE ESTIMACIONES		RANGO GENERAL AL PERÍODO	
AGUAS	DE TRAMITE	PHICO	FINANCIERO
ESTIMACIONES	0.00	1.00.00%	00.00%

2.000 0045



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENEOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0

00000046



SECRETARÍA DE FINANZAS Y SERVICIOS
Contraloría General de la Federación
Paseo de la Liberación No. 1000, Colonia Juárez, México, D.F.



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	F.F.	SOLICITANTE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto comprometido total	Monto comprometido al 30 de septiembre de 2017	EQUIPAMIENTO	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		PROMEDIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	MONTO	TERMINO	MONTO	TRÁMITE	DE TRÁMITE	PROMEDIO	TERMINO	
1	DOOPAD-L-1-005-16	10/04/16	AD	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA INTEGRAL PAPERSONAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJUALMALPA, UBICADO EN LA "W DE SEPTIEMBRE" SIN MONERO, ESQUINA CON MANRANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUJUALMALPA DE MORELOS.	15-ago-16	11-ago-16	\$200,185.12	\$000,185.12	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A FINQUITAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS.
2	DOOPAD-L-5-013-16	10/04/16	AD	IMPUESTO Y ASIGNACIÓN RESERVA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ETAPALAPA II, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLES RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN ETAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-16	31-ago-16	\$1,882,894.46	\$1,882,894.46	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	\$1,872,893.46	\$0.00	100.00%	98.47%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A FINQUITAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS.
3	DOOPAD-L-5-014-16	10/04/16	IR	AGENCIARIA INTEGRAL CONTRA TORNOS MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTA SANCHEZ", UBICADA EN SIDA Y ROVERA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	22-ago-16	30-ago-16	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	\$3,360,542.02	\$1,333.44	100.00%	98.24%	CONTRATO AUDITADO. SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ORGANO DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
4	DOOPAD-L-1-024-16	10/04/16	L.F.R.	IRON HOLDINGS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTA SANCHEZ", UBICADA EN SIDA Y ROVERA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	9-ago-16	31-ago-16	\$62,346,323.82	\$62,346,323.82	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	\$61,646,214.44	\$0.00	100.00%	98.38%	CONTRATO AUDITADO. SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ORGANO DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
5	DOOPAD-L-1-025-16	10/04/16	L.F.R.	GRUPO KOPAL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ETAPALAPA II, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLES RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN ETAPALAPA.	24-ago-16	31-ago-16	\$26,942,825.03	\$26,942,825.03	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	\$26,806,542.03	\$0.00	100.00%	97.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A FINQUITAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS.
6	DOOPAD-L-5-036-16	10/04/16	L.F.R.	ARMAR S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJUALMALPA, UBICADO EN "W DE SEPTIEMBRE" SIN ESQUINA CON MANRANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUJUALMALPA MORELOS.	15-ago-16	30-ago-17	\$16,796,320.33	\$1,227,086.26	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	\$15,569,234.07	\$0.00	96.44%	91.46%	SE INFORMO A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO.
7	DOOPAD-L-5-035-16	10/04/16	AD	ING. RAFAEL JUAN CARRANZA CONTRERAS BARRAZA	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTA SANCHEZ", UBICADA EN SIDA Y ROVERA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-ago-16	30-ago-16	\$296,224.14	\$296,224.14	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	\$100,887.52	\$0.00	100.00%	61.67%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A FINQUITAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS.
8	DOOPAD-L-5-040-16	10/04/16	AD	ARMAR S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJUALMALPA, UBICADO EN "W DE SEPTIEMBRE" SIN ESQUINA CON MANRANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUJUALMALPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-ago-16	31-ago-17	\$1,681,911.46	\$285,187.30	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	\$675,147.86	\$0.00	71.38%	21.41%	SE INFORMO A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

4.000.0047



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Calle de la Constitución No. 2000, Colonia Centro
Ciudad de México, CDMX, México



CIUDAD DE MÉXICO, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

FEEDBACK		P.F.	SEALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJECUTADO (Mx)	ECONOMÍA	ANTICIPOS		GASTOS (PERÍODO ANTE)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
ORDEN	CONTRATO					INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTOS	PROCESO	EN TERMINO	PROCESO	TERMINADO			
9	DOOP-LL-5-048-16	UNIDAD	16	CONSTRUCCION INTERNA EN ASIENTO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJMALPA.	1-06-16	31-05-17	\$11,512,671.79	\$070,181.77	0.00	ANTICIPOS	NO	N/A	N/A	N/A	\$0,216,200.04	\$0.00	00.00%	04.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	NO								
											POR AMORTIZAR	NO								
10	DOOP-AD-1-5-051-16	UNIDAD	42	MR. KATNE ALTO CERRO CONSTRUCCION SORBUYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJMALPA.	1-06-16	31-05-17	\$296,158.24	\$26,367.80	0.00	ANTICIPOS	NO	N/A	N/A	N/A	\$26,367.80	\$0.00	00.00%	0.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	NO								
											POR AMORTIZAR	NO								
11	DOOP-LPN-7-2-055-16	HOSPITAL	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCION OMAHENOVA S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAJMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-06-16	31-05-17	\$257,634,458.75	\$1,808,163.08	0.01	ANTICIPOS	NO	N/A	N/A	N/A	\$4,574,723.91	\$0.00	00.00%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA, SE INFORMÓ A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	NO								
											POR AMORTIZAR	NO								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL EN ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$274,845,952.83	\$26	ANTICIPOS 0.00
		ANTICIPADO 0.00
		FOR ANTICIPOS 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
CONTRATOS	EN TRÁMITE	FINC.	FINACER
117.805.508,24	87.833,48	82,61%	58,22%


ING. BERNARDO GUTIÉRREZ OROZCO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	8	1	0	7	2	1	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	18	4	0	9	13	1	21	4

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2018 Y 8 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS NUEVE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	8	1	0	7	2	1	8	0
TOTAL	8	1	0	7	2	1	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y OCHO EN EL 2018 Y LOS NUEVE ESTÁN CONCLUIDOS.


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

Copyright © 1999 by the author(s).

- 000 0052

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de septiembre de 2018

CARGO	NÚMERO DE CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PROBADA	EN TRÁMITE	PROBADA	FINANCIERO	
4	0001-0118-1-1-001-18		18	SA. 0001-0118-1-1-001-18	Manejo de residuos sólidos y líquidos en Puente Pedestre y Estación de Transferencia de Residuos Sólidos y Líquidos en la Ciudad de México, derivado de acciones realizadas mediante contratos, licitaciones y otros recursos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.	01/01/2018	31/12/2018	3 102 073.30	3 102 073.30	0.00	ANTICIPADO	0.00			0.00	2 401 329.28	241 460.21	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. Recepcionados el 28-jun-18. Liquidados. Se reporta por última vez.
5	0001-0118-1-1-001-18		18	SA. 0001-0118-1-1-001-18	Supervisión técnica y de calidad de ejecución y Planeación de obras de Mantenimiento Contractual y ejecución de 81 Puente Pedestre y 9 estaciones de transferencia de residuos sólidos y líquidos mediante contratos, licitaciones y otros recursos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.	01/01/2018	31/12/2018	999 063.08	999 063.08	0.00	ANTICIPADO	0.00			0.00	676 729.96	0.00	100.00%	36.21%	Servicios concluidos. Rendición de Cuenta y Recepción.
TOTAL: 08								47 881 996.14	47 881 996.14	0.00					36 548.19	36 548.19	241 460.21			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
47 881 996.14	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PROBADA	EN TRÁMITE	PROBADA	FINANCIERO
36 548.19	241 460.21	100.00%	81.30%

NOTA: SE SEÑALA EN ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.


E. Víctor Manuel Rodríguez López
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4



SECRETARIA DE COMÉRCIO Y TURISMO
 Ministerio General de Comercio Exterior
 Dirección de Promoción de Exportaciones



CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

ORDEN	REFERENCIAL	P.F.	MUNICIPIO	CATEGORIA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		Monto contratado 2016	Monto contratado ejercicio 2016	ECONOMIA	ANTICIPO	FORMA DE PAGOS			ESTIMACION		FINANCIACION		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					HECT	TERMINO	SECTOR	TRABAJO	EN TRABAJO	PROG	FINANCIACION	
1	DOOP-OPRE-C-3-2016-18	LOCALIDAD	18	PLANEACION URBANA Y CONSTRUCCION NIVEL OBRA S.A DE CV	ELABORACION DE LA ADECUACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUJAMMALPA UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SAN COLONA CONTADERO, DELEGACION CUJAMMALPA, CIUDAD DE MEXICO.	27-10-16	28-06-18	\$4,028,327.89	\$4,028,327.89	0.00	ANTICIPO ANTICIPO POR ACORTAR	NA	NA	NA	\$0,000,000.00	\$0.00	71.62%	87.64%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACION ANTICIPADA Y FINQUITO.
2	DOOP-EL-3-048-18	LOCALIDAD	18	HECO (CONSTRUCCION) NIVEL S.A DE CV	TRABAJO DE GESTORIA Y APOYO TECNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONDIENTES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTONICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUJAMMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SAN COLONA CONTADERO, DELEGACION CUJAMMALPA, CIUDAD DE MEXICO.	15-10-16	31-05-18	\$1,990,010.89	\$1,986,798.00	0.00	ANTICIPO ANTICIPO POR ACORTAR	NA	NA	NA	\$716,222.50	\$0.00	35.49%	3.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACION ANTICIPADA Y FINQUITO.
3	DOOP-EL-3-048-18	LOCALIDAD	18	INGENIERIA GENERAL MEXICANA S.A DE CV	TRABAJO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUJAMMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SAN COLONA CONTADERO, DELEGACION CUJAMMALPA, CIUDAD DE MEXICO.	25-10-16	31-05-18	\$11,489,182.36	\$2,236,221.89	0.00	ANTICIPO ANTICIPO POR ACORTAR	NA	NA	NA	\$236,221.89	\$0.00	3.98%	19.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACION ANTICIPADA Y FINQUITO.
4	DOOP-LTA-F-3-048-18	TERMINAL	18	OPERADEORA DE SERVICIOS DE PASAJE AEREO S.A. DE CV en participacion con INGENIERIA GENERAL MEXICANA S.A DE CV	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUJAMMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE SAN COLONA CONTADERO, DELEGACION CUJAMMALPA, CIUDAD DE MEXICO.	3-10-16	22-05-18	\$271,264,821.83	\$38,315,324.89	0.00	ANTICIPO ANTICIPO POR ACORTAR	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	1.56%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACION ANTICIPADA Y FINQUITO.

[illegible]

11

[illegible]

TOTAL CONTRACTS	TOTAL IN DISCOUNT	TOTAL IN DISCOUNT	
42,577,385.48	0.00	DISCOUNT	NA
		DISCOUNT	NA
		DISCOUNT	NA

TOTAL DE CONTRATOES		AVANCE DESEMPL. ALIQUOTADO	
PROCESOS	EN TRAMITE	PROCESOS	PROCESOS
4.958.800.38	5.00	28.17%	21.88%

Todos los derechos reservados. © 2016. Los servicios de IBM Engineering y las soluciones S.A., de C.V., así como sus respectivos productos son la propiedad intelectual de International Business Machines Corporation o de una de sus filiales. IBM, el logo de IBM y el símbolo de "e" son marcas de IBM Corporation. Microsoft, Windows y Office son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation y/o sus afiliados. SAP es una marca registrada de SAP AG o de uno de sus afiliados. VMware es una marca registrada de VMware Inc. o de uno de sus afiliados. Red Hat es una marca registrada de Red Hat Inc. o de uno de sus afiliados. Linux es un nombre comercial registrado de Linus Torvalds y/o sus colaboradores. El software de IBM Engineering y las soluciones S.A., de C.V., se ejecuta sobre hardware de IBM System z.

El presente artículo se basa en datos de la Encuesta General de Población de Censo 2005, obtenidos directamente mediante el sistema electrónico de los centros de datos censales.

EN REPORTE OUTRERZ ORIGINAL
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS T2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA:


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO EFRÁIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0056

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CÓMPUTO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RESECCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA RESECCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Entrevista del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y artesanías de San Juan			5,877,748.84	0.00	0.00					0.00	5,877,748.84						
1	000P-43-4-000-18		CONTRATACIÓN	CONSTRUCIONES S. A. DE C. V.	Entrevista del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y artesanías de San Juan	15/11/2018	01/12/2018	5,877,748.84	0.00	0.00	ANTICIPO				0.00	5,877,748.84	100.00%	0.00%				Los trabajos están concluidos en su totalidad.
											ABORTADO				0.00	5,877,748.84	100.00%	0.00%				Se recibieron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fuera de control por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromisos por las fechas límite para validar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.
											POR ABORTAR				0.00	5,877,748.84	100.00%	0.00%				Se recibió su pago como ADEFA.
					Trabajo de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlixpote, San Juan Atlixpote y el edificio de Administración y Área de Servicio del mercado público Santa Cecilia a Puerto Atlado y Templo Guadalupe.			10,432,842.34	0.00	0.00					0.00	10,432,842.34						
2	000P-43-4-000-18		CONTRATACIÓN	CONSTRUCIONES S. A. DE C. V.	Trabajo de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlixpote, San Juan Atlixpote y el edificio de Administración y Área de Servicio del mercado público Santa Cecilia a Puerto Atlado y Templo Guadalupe.	15/11/2018	01/12/2018	10,432,842.34	0.00	0.00	ANTICIPO				0.00	10,432,842.34	100.00%	0.00%				Los trabajos están concluidos en su totalidad.
											ABORTADO				0.00	10,432,842.34	100.00%	0.00%				Se recibieron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fuera de control por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromisos por las fechas límite para validar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.
											POR ABORTAR				0.00	10,432,842.34	100.00%	0.00%				Se recibió su pago como ADEFA.
					Entrevista del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlixpote			4,175,507.42	0.00	0.00					0.00	4,175,507.42						
3	000P-43-4-000-18		CONTRATACIÓN	CONSTRUCIONES S. A. DE C. V.	Entrevista del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlixpote	15/11/2018	01/12/2018	4,175,507.42	0.00	0.00	ANTICIPO				0.00	4,175,507.42	100.00%	0.00%				Los trabajos están concluidos en su totalidad.
											ABORTADO				0.00	4,175,507.42	100.00%	0.00%				Se recibieron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fuera de control por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromisos por las fechas límite para validar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.
											POR ABORTAR				0.00	4,175,507.42	100.00%	0.00%				Se recibió su pago como ADEFA.
TOTAL								1,191,886,185.27	0.00	0.00					1,191,886,185.27	35,701,355.74						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,191,886,185.27	0.00	ANTICIPO 16,914,016.79 ABORTADO 14,602,821.91 POR ABORTAR 3,711,884.60

HUGO ANDRÉS VÁSQUEZ
Jefe de Unidad de Control y Supervisión de Construcción de

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
1,191,886,185.27 35,701,355.74 100.00% 41.21%	

ING. EFRAÍN GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2021

CONTRATOS REPORTADOS POR LA DICCCOP	DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
				CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN O/Y FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
45	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	30	15	30	15	0
40	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	33	7	2	28	10	28	10	0
229	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	171	58	171	58	0
113	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	88	22	88	22	0
427	TOTAL	419	8	5	317	105	317	105	0

NOTA: DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B", CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS DGPE/PPS/01/2013, APARECE EN EL EJERCICIO 2021, CON LOS CONTRATOS SIGUIENTES: DGOP-LPI-F-009-17, DGCOP-LPN-L-2-123-19, DGCOP-LPN-L-4-170-19, DGCOP-LPN-L-5-167-19, DGCOP-LPN-L-5-198-19, DGCOP-AD-L-5-380-19, CORRESPONDE A MULTIANUALIDADES, POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINA COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019; ASÍ MISMO SE CUENTA CON DOS CONTRATOS RECEPCIONADOS DGCOP-AD-L-5-068-19 Y DGCOP-AD-L-5-378-19, QUEDANDO ÚNICAMENTE 3 (TRES) CONTRATOS PENDIENTES DEL EJERCICIO 2019.



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	0	15	0
TOTAL	14	1	0	0	15	0	15	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CATORCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 12 CONCLUIDOS.


C. Víctor Manuel Rodríguez Solís,

Subsecretario de Construcción de Obras Públicas

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de septiembre de 2019

ORDEN	CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PLAZOS DE ENTREGA CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2019	OCORRERÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PROMESA - MONTO)			ENTRADA		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PROMESA	ENTRADA	FÍSICO	FINANCIERO	
					Reconstrucción del Museo Interactivo Infante Itaparape			805,140,862.63	350,000,000.00	0.00					0.00	61,263,166.31	608,479.00			
1	2019P-176-1-004-2018-01	2019-176-176-000	UPB	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Reconstrucción del Museo Interactivo Infante Itaparape.	01/11/2018	30/09/2019	182,948,831.03	100,242,240.16	0.00	805,140,862.63	0.00				22,415,400.27	608,479.00	15.36%	4.14%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación con fecha de término al 1 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2018, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.
2	2019P-80-1-004-19	2019-176-176-000	UPB	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo administrativo y financiero para el Museo Interactivo Infante Itaparape, primera etapa ubicada en Colonia Centro Histórico No. 220 esquina Calle Reforma, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, en la Ciudad de México.	01/06/2019	30/10/2019	1,358,651.94	1,358,651.94	0.00	805,140,862.63	0.00				1,340,365.32	0.00	100.00%	99.80%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
3	2019P-80-1-004-20	2019-176-176-000	UPB	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Reconstrucción del Museo Interactivo Infante Itaparape (segunda etapa) ubicada en Colonia Centro Histórico No. 220 esquina Calle Reforma, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, en la Ciudad de México.	01/06/2019	30/10/2019	668,636,378.84	40,000,000.00	0.00	805,140,862.63	0.00				22,995,136.02	0.00	20.84%	10.84%	Trabajos en proceso de ejecución. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (20.84%), corresponde al 100% por el este ejercicio 2019, del contrato multianual.
					Reconstrucción del Búfalo y el Búfalo en Tláhuac			39,632,943.96	39,632,943.96	0.00						0.00	39,632,943.96	0.00		
4	2019P-176-1-004-19	2019-176-176-000	UPB	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Búfalo y el Búfalo en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia Tláhuac, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/06/2019	30/10/2019	18,172,861.78	18,172,861.78	0.00	805,140,862.63	0.00				18,134,613.84	0.00	99.94%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
5	2019P-176-1-004-20	2019-176-176-000	UPB	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Búfalo y el Búfalo en Tláhuac, segunda etapa ubicada en Av. Tláhuac No. 14, Colonia Tláhuac, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/06/2019	30/10/2019	19,839,982.18	19,839,982.18	0.00	805,140,862.63	0.00				18,628,036.40	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					Ampliación, Rehabilitación, Modernización y Mantenimiento mayor y menor a Centros de Salud			78,162,102.89	78,162,102.89	0.00						0.00	78,162,102.89	0.00		
6	2019P-176-1-004-19	2019-176-176-000	UPB	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Centro de Salud Tlalapa, Av. Tlalapa No. 14, Colonia Tlalapa, Alcaldía Tlalapa, Ciudad de México.	01/06/2019	30/10/2019	3,161,941.00	3,161,941.00	0.00	805,140,862.63	0.00				3,145,835.32	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
7	2019P-176-1-004-20	2019-176-176-000	UPB	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Centro de Salud Tlalapa, segunda etapa ubicada en Av. Tlalapa No. 14, Colonia Tlalapa, Alcaldía Tlalapa, Ciudad de México.	01/06/2019	30/10/2019	3,412,083.24	3,412,083.24	0.00	805,140,862.63	0.00				3,395,977.57	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
8	2019P-176-1-004-20	2019-176-176-000	UPB	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Centro de Salud Tlalapa, tercera etapa ubicada en Av. Tlalapa No. 14, Colonia Tlalapa, Alcaldía Tlalapa, Ciudad de México.	01/06/2019	30/10/2019	15,568,339.88	15,568,339.88	0.00	805,140,862.63	0.00				15,494,361.27	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Fecha al 31 de Septiembre de 2022

ORDEN	CONTRATO	P. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2019	SEGURIDAD	ANTICIPOS	CÓMPUTO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						2019	2020					2019	2020	2021	PAGADO	EN TENDIENTE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	060201-076-1-A-000-18	060201-076-1-A-000-18	17B	INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	Proyecto integral para la remodelación y ampliación de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, ubicada en Calle México 100, colonia San Miguel Tepequiles, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	42,871,439.80	23,112,000.00	25,481,439.80	23,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112,000.00	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
10	060201-076-1-A-000-18	060201-076-1-A-000-18	17B	INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	Proyecto integral para la remodelación y ampliación de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, ubicada en Calle México 100, colonia San Miguel Tepequiles, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	18,294,584.13	24,112,000.00	18,294,584.13	18,294,584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112,000.00	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
11	060201-076-1-A-000-18	060201-076-1-A-000-18	AD	INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	Proyecto integral para la remodelación y ampliación de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, ubicada en Calle México 100, colonia San Miguel Tepequiles, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	17,891,388.00	24,112,000.00	17,891,388.00	17,891,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112,000.00	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
Servicio Centro de Salud Tepequiles								4,873,818.20	4,873,818.20	0.00				0.00	4,873,818.20	0.00			
12	060201-076-1-A-000-18	060201-076-1-A-000-18	AD	INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	Trabajos y servicios para la remodelación y ampliación de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, ubicada en Calle México 100, colonia San Miguel Tepequiles, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	1,122,838.20	24,112,000.00	1,122,838.20	1,122,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112,000.00	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
13	060201-076-1-A-000-18	060201-076-1-A-000-18	AD	INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	Trabajos y servicios para la remodelación y ampliación de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, ubicada en Calle México 100, colonia San Miguel Tepequiles, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	1,808,000.00	24,112,000.00	1,808,000.00	1,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112,000.00	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
14	060201-076-1-A-000-18	060201-076-1-A-000-18	AD	INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	Trabajos y servicios para la remodelación y ampliación de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, ubicada en Calle México 100, colonia San Miguel Tepequiles, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	1,300,000.00	24,112,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112,000.00	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
15	060201-076-1-A-000-18	060201-076-1-A-000-18	AD	INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	Trabajos y servicios para la remodelación y ampliación de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, ubicada en Calle México 100, colonia San Miguel Tepequiles, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	750,000.00	24,112,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112,000.00	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
TOTAL								888,834,879.72	888,834,879.72	0.00				0.00	888,834,879.72	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE OBLIGACIONES	TOTAL DE ANTICIPOS
888,834,879.72	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE SUBSISTENTE AL EJERCICIO	
PAGADO	EN TENDIENTE	FÍSICO	FINANCIERO
183,834,830.00	608,475.00	99.99%	99.99%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MENCIONADOS.


C. Víctor Manuel Sánchez Salas
Director General de Construcción de Obras Públicas "A"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	2	3	2	3	0
TOTAL	5	0	0	2	3	2	3	0

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-968-19 Y DGCOP-AD-L-5-378-19, SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

At 10 de septiembre de 2021

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Journal of Economic Surveys (2015) Vol. 29, No. 1, pp. 1–51
© 2015 The Author. Journal compilation © 2015 Blackwell Publishing Ltd

TOTAL DE EXTRACCIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGARME	EN TRÁMITE	RECIBO	FINANCIERO
40,000.00	0.00	100.00	100.00

Ing. Enrique David Muñoz Espinoza



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENEOCHTITLAN
SETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	171	58	171	58	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE Construcción de Obras Públicas "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ORDEN	NOMBRE	C.O.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado total	Monto comprometido a ejercicio 2019	ETAPAS	ANEXOS		COMANDO (PERCENTAJES)			EFECTUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	AVANCE	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
1	DOOPADL-3-845-19	URBANA	A.D.	WANT GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC CUITZALCÓTLI, UBICADO EN CALLE DRAL JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TILATENCIO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-jun-19	9-ago-19	\$1,442,353.52	\$1,442,353.52	0.00	ANEXOS	NA	NA	NA	NA	\$1,442,353.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
2	DOOPADL-3-862-19	URBANA	A.D.	WANT GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC OTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA OTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA OTAPALAPA, C.P. 36510 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-jun-19	9-ago-19	\$1,379,525.95	\$1,379,525.95	0.00	ANEXOS	NA	NA	NA	NA	\$1,379,525.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
3	DOOPADL-3-894-19	URBANA	A.D.	WANT GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO ORRISON Y EL CDC LÁZARO CARDENAS, UBICADO EN POPOCATEPETL Y VOLCAN ACATEMANCO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 67580 Y AV. ACUEDUCTO Y TEEZEMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 67510, AMBOS EN GUSTAVO A. MADRERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNIDAD Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	10-ago-19	\$1,185,712.97	\$1,185,712.97	0.00	ANEXOS	NA	NA	NA	NA	\$1,185,712.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
4	DOOPUPNL-4-025-19	URBANA	L.P.R.	INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAUSES) II "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 PORTEÑO GUERRERO SAN, ESCURIA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	28-jun-19	5-dic-19	\$13,412,317.32	\$13,412,317.32	0.00	ANEXOS	NA	NA	NA	NA	\$13,412,317.32	\$0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
5	DOOPUPNL-4-077-19	URBANA	L.P.R.	AMBA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAUSES) "DEPORTE DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE REAL DE SAN MARTÍN Nº 275, COL. REYNOSA TAMPALAPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	27-jun-19	4-dic-19	\$15,073,326.58	\$15,073,326.58	0.00	ANEXOS	NA	NA	NA	NA	\$15,073,326.58	\$0.00	100.00%	99.39%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
6	DOOPUPNL-4-078-19	URBANA	L.P.R.	INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAUSES) "FRANQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA OTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	28-jun-19	5-dic-19	\$14,025,918.93	\$14,025,918.93	0.00	ANEXOS	NA	NA	NA	NA	\$14,025,918.93	\$0.00	99.99%	99.99%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTEPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
7	DOOPUPNL-4-089-19	URBANA	L.P.R.	ARTS, DISEÑO Y ARQUITECTURA VINCENSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAUSES) "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, 602, 196, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	12-jul-19	10-dic-19	\$7,193,915.84	\$7,193,915.84	0.00	ANEXOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTEPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
8	DOOPUPNL-4-101-19	URBANA	L.P.R.	AMBA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAUSES) II "CANCHA DEPORTIVA", CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLAPALAPA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN 5 ANZADOR CAMINO AL ATLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLAPALAPA, R. CARRETERA MÉXICO AL ALZADO, AV. MISAL, HEDALGO Nº 645, COLONIA SAN MIGUEL ALZADO, ALCALDÍA TLAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	15-jul-19	7-dic-19	\$28,537,983.89	\$28,537,983.89	0.00	ANEXOS	NA	NA	NA	NA	\$14,268,941.45	\$0.00	100.00%	40.98%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
9	DOOPADL-3-116-19	URBANA	A.D.	WANT GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL COORDINADO ZARAGOZA Y EL CDC MONTE GUERRERO UBICADOS EN DRAL ANTONIO DE LEÓN SUPER MADRONA Y U.H. EUGENIO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA OTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-jul-19	31-ago-19	\$1,864,359.83	\$1,864,359.83	0.00	ANEXOS	NA	NA	NA	NA	\$1,864,359.83	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO

000 0067



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Gobierno del Estado de México
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



BOEHO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CÓDIGO	NOMBRE	P.O.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTERIOR		CONVENIO (PERÍODO ANTERIOR)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	INICIO	TERMINO	FIN	FINANCIADA	ESTIMADA	FINANCIADA	ESTIMADA	
10	DOCOPLINL-4-145-19	USDA25	LPA	OSMAH, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BOCONIA SAN COLOMA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	\$8,382,338.82	\$8,382,338.82	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$7,948,388.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE PROPOSITO ADMINISTRATIVO
11	DOCOPLINL-4-149-19	USDA25	LPA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS INFORMATICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAN JUAN DE ARANJO Y SECCIÓN", UBICADO EN AV. 418 N° 191 COL. SAN JUAN DE ARANJO Y SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-ago-19	31-dic-19	\$11,595,790.38	\$11,595,790.38	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,707,880.70	\$0.00	17.26%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPAGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
12	DOCOPLINL-4-152-19	USDA25	LPA	UMA CONSTRUCCION S DE INGENIERIA S DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LAZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION SAN COLOMA LAZARO CARDENAS TIALPANA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$18,529,588.30	\$18,529,588.30	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$28,418.80	\$0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPAGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
13	DOCOPLINL-4-154-19	USDA25	LPA	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAN BRACILLO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE, FRANCISCO DEL PADO Y TRONCALO N° 985 COLONA LOS REYES, ALCALDÍA ESTACASOL, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$7,891,820.20	\$7,891,820.20	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$382,201.00	\$0.00	4.86%	4.86%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPAGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.
14	DOCOPLINL-4-156-19	USDA25	LPA	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CHURUBUSCO N. COLONA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VERGUSIANO GARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$18,257,908.17	\$18,257,908.17	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,151,361.04	\$0.00	2.97%	7.38%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPAGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
16	DOCOPLINL-5-181-19	USDA25	LPA	INGENIERIA Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL MAR N. COL. ALAMICO, C.P. SURE, ALCALDÍA DE COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	30-dic-19	\$28,554,572.57	\$28,554,572.57	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,739,417.00	\$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTEPAGA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROPOSITO.
18	DOCOPLINL-4-190-19	USDA25	AD	OSMAH, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "AL CHAMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA AL CHAMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$8,698,586.74	\$8,698,586.74	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$8,698,586.74	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PROPOSITO ADMINISTRATIVO
17	DOCOPLINL-4-223-19	USDA25	AD	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS INFORMATICA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS EDUCUARDAS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CAMINISTERA, PASEO ALFREDO EN S.S. ALCALDÍA TIALPANA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$1,896,344.10	\$1,896,344.10	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,896,344.10	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PROPOSITO ADMINISTRATIVO
19	DOCOPLINL-4-238-19	USDA25	AD	ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALLE DE TIALPANA, COLONA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$821,034.85	\$821,034.85	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$821,034.85	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PROPOSITO ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ORÇÃO E FINANÇAS
 Avenida Paulista, 1568 - 13º andar
 01306-900 - São Paulo, SP



UNIVERSITY OF ALABAMA, 100 UNIVERSITY BLVD., TUSCALOOSA, AL 35487-0001

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019[illegible]

0033 0069



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Oficina General de Planeación y Desarrollo Urbano
Oficina de Contratación y Ejecución de Obra Pública



DIOME AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CANT	NOMBRE	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPA		CUANTO PERÍODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	NA	INICIO	TERMINO	MONTO	FINANCIADO	ESTIMADO	FINANCIADO	ESTIMADO	
28	DOCOF-LPM-4-28-16	LOCALIDAD	L.P.M.	MECNO MEXICO S.A. DE C.V.	PROYECTO DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.A. N° 1 A "WELLER LERO DE TEJADA", COL. "FAMILIA JUÁREZ MADA", C.A.D. EN C.D. "CUAUHTEMOC", C.D. "TRINIDAD ESPAÑOLA" Y C.A.D. 18 EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-ene-16	11-mar-20	\$57,530,381.42	\$57,530,381.42	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$57,530,381.42	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
29	DOCOF-AD-L-1-29-16	LOCALIDAD	A.D.	IMPROMET S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.A. N° 1 A "WELLER LERO DE TEJADA", COL. "FAMILIA JUÁREZ MADA", C.A.D. EN C.D. "CUAUHTEMOC", C.D. "TRINIDAD ESPAÑOLA" Y C.A.D. 18 EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-ene-16	31-ago-16	\$4,961,585.55	\$4,961,585.55	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$4,961,585.55	\$4,961,585.55	100.00%	75.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
30	DOCOF-AD-L-2-29-16	LOCALIDAD	A.D.	IMPROMET S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES DE "GUAYABAL", UBICADA EN CALLE 19, ESQUINA MANUEL ESCOBAR EN COL. CHAMPAME, DE JUÁREZ ALCALDÍA DE TIAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ene-16	20-ene-16	\$1,285,186.25	\$1,285,186.25	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,285,186.25	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
31	DOCOF-AD-L-3-29-16	LOCALIDAD	A.D.	CONSTRUCTORA Y AGUAS DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES DE "ALVARO OBREGÓN", UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MEXICO, COLUMA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ene-16	20-ene-16	\$1,780,046.52	\$1,780,046.52	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,780,046.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
32	DOCOF-AD-L-3-30-16	LOCALIDAD	A.D.	CONSTRUCTORA Y AGUAS DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES DE "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PABO Y FRANCISCO DE SORIANO, FRAY BERNARDO TERESA DE MEXICO, COLUMA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ene-16	20-ene-16	\$1,298,865.63	\$1,298,865.63	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,298,865.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
33	DOCOF-AD-L-3-30-16	LOCALIDAD	A.D.	IMPROMET S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES DE "BARRIO", UBICADA EN GENERAL GARCÍA HERNÁNDEZ, NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ene-16	20-ene-16	\$1,820,442.20	\$1,820,442.20	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,820,442.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
34	DOCOF-AD-L-3-31-16	LOCALIDAD	A.D.	IMPROMET S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.A. N° 1 A "WELLER LERO DE TEJADA", COL. "FAMILIA JUÁREZ MADA", C.A.D. EN C.D. "CUAUHTEMOC", C.D. "TRINIDAD ESPAÑOLA" Y C.A.D. 18 EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ene-16	11-ene-16	\$1,781,361.62	\$1,781,361.62	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,781,361.62	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
35	DOCOF-AD-L-3-31-16	LOCALIDAD	A.D.	IMPROMET S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.A. N° 1 A "WELLER LERO DE TEJADA", COL. "FAMILIA JUÁREZ MADA", C.A.D. EN C.D. "CUAUHTEMOC", C.D. "TRINIDAD ESPAÑOLA" Y C.A.D. 18 EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ene-16	11-ene-16	\$1,796,015.55	\$1,796,015.55	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,796,015.55	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
36	DOCOF-AD-L-3-31-16	LOCALIDAD	A.D.	IMPROMET S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.A. N° 1 A "WELLER LERO DE TEJADA", COL. "FAMILIA JUÁREZ MADA", C.A.D. EN C.D. "CUAUHTEMOC", C.D. "TRINIDAD ESPAÑOLA" Y C.A.D. 18 EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ene-16	29-ene-16	\$1,855,851.84	\$1,855,851.84	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,855,851.84	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
37	DOCOF-AD-L-3-32-16	LOCALIDAD	A.D.	IMPROMET S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.A. N° 1 A "WELLER LERO DE TEJADA", COL. "FAMILIA JUÁREZ MADA", C.A.D. EN C.D. "CUAUHTEMOC", C.D. "TRINIDAD ESPAÑOLA" Y C.A.D. 18 EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ene-16	29-ene-16	\$1,855,851.84	\$1,855,851.84	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,855,851.84	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



DIJTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

IMPORTE DE SERVICIO FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CÓDIGO	NOMBRE	U.S.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPROBACIÓN DE PAGOS			DETALLES		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	NO	RECIBO	TERMINO	MONTOS	PROCESO	DETALLES	RECIBO	PROCESO	
38	DOCCOPAD-L-3-323-19	LOCALIZ	A.D.	SIAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) ZONA SUR 2	23-mar-19	29-mar-19	\$1,860,177.00	\$1,860,177.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	\$1,537,121.84	\$0.00	100.00%	92.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
39	DOCCOPAD-L-3-324-19	LOCALIZ	A.D.	SIAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) ZONA SUR 1	23-mar-19	29-mar-19	\$1,880,122.51	\$1,880,122.51	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	\$1,534,801.07	\$0.00	100.00%	92.40%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
40	DOCCOPAD-L-3-344-19	LOCALIZ	A.D.	PA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ACCION DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS E MANEJO INSTITUCIONAL), A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PLARES CANTERA, PLARES RICARDO MADRIGAL, PLARES WALL, PLARES EL CAPULAN, PLARES LA SANGA, PLARES SANTA FE, PLARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL, TILAPISCO, PLARES CENTRO DE ABASTO, PLARES SAN FRANCISCO, PLARES CENTRO DE VIGILANCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PLARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA, PLARES MARGARITA MORA DE JUAREZ, PLARES CENTRO DE DESARROLLO ORMANIA, PLARES ATLAPA, PLARES CENTRO COMUNITARIO FIDRA KAUIL, PLARES SANTA GABRIELA, PLARES CHA, PLARES JOSÉ MARÍA, PLARES GABRIELA MISTRAL, PLARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN BARTOLOME MOCHILLO, PLARES ACHAHUATEPEC Y PLARES SECCI SANTIANO TLATEVUALTE, EN LA CIUDAD DE MEXICO	23-mar-19	30-mar-19	\$905,539.78	\$905,539.78	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	\$905,539.78	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
41	DOCCOPAD-L-3-345-19	LOCALIZ	A.D.	RENOVACION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES PUERTO DE PALOPIA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOPIA ESCUERA CALLE PUERTO DEL COLOMIA PUERTO DE SAN JUAN DE ARAGON, ALDABONA GUSTAVO A. MADRIGAL, CIUDAD DE MEXICO	23-mar-19	11-mar-19	\$1,850,833.04	\$1,850,833.04	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	\$1,850,833.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
42	DOCCOPAD-L-3-352-19	LOCALIZ	A.D.	ENROL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) ZONA PONTENTE 2	23-mar-19	9-mar-20	\$1,817,860.38	\$1,817,860.38	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	\$1,289,989.37	\$0.00	100.00%	75.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
43	DOCCOPAD-L-3-353-19	LOCALIZ	A.D.	ENROL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) ZONA ORIENTE 2	23-mar-19	9-mar-20	\$1,802,889.92	\$1,802,889.92	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	\$1,802,889.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
44	DOCCOPAD-L-3-354-19	LOCALIZ	A.D.	CONSTRUCCION Y ACABADOS DINE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEREN PARA GUARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRIOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-mar-19	25-mar-19	\$487,226.58	\$487,226.58	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	\$487,226.58	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
45	DOCCOPAD-L-3-358-19	LOCALIZ	A.D.	BUTIN FRI S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL MAN COL. JUAROL, ALCAIDIA COYUNTAN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-mar-19	31-mar-19	\$026,370.00	\$026,370.00	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	\$026,370.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
46	DOCCOPAD-L-3-360-19	LOCALIZ	A.D.	MESENER Y CONSTRUCCION EN PAUL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI M Y EL CADI CICCULUX LIBERLUTANA	23-mar-19	21-mar-19	\$880,095.29	\$880,095.29	0.00	ANTICIPO	NO	NA	NA	NA	\$880,095.29	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

005 0071



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

DIORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ORDEN	NOMBRE	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO \$ MIL	MONTO CONTRATADO EJECUCION \$ MIL	ECONOMÍA	ANTICIPA		CUMPLIMIENTO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADO	ESTIMADO	2020	2020				
47	DGCOP-ADL-3-384-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS C.A. TALLERES DE AUTONOMIA ECONOMICA E INDOPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE POLYTECA PROLONGACION SIN. COLONA CENTRAL DE ABAMTO, ALCALDIA ETAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	23-mar-19	20-mar-20	\$1,137,001.24	\$1,137,001.24	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$1,137,001.24	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO	
48	DGCOP-LPNL-4-315-19	LOCALES	L.P.R.	EXAMINAR Y ANEXAR A D.O.C.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) D. PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUALTEPEC SIN. COL. SALINAS (SANTO DOMINGO) Y CONSTRUCCION EN ATCAPOZALCO, E. FRACCION DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUMBITENCO, NACIONAL JARDIN DE CUETO Y JARDIN DE MONTENEGROS (240 M2 * 2 NIVEL), ETAPALAPA.	23-mar-19	21-mar-19	\$13,558,195.14	\$13,558,195.14	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$13,558,195.14	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
49	DGCOP-LPNL-4-381-19	LOCALES	OR	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) 3 PARQUE ACUOCOMATEL, ARO DE JUAREZ, 1985, COL. SAN LUIS TLAXMALTEMALCO.	23-mar-19	21-mar-19	\$8,100,488.00	\$8,100,488.00	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$8,100,488.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
50	DGCOP-LPNL-4-382-19	LOCALES	L.P.R.	GRUP CONSTRUCTORA DEL SOL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) DIF. MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES SIN. MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, E. FRACCION DE TERRENO UBICADA EN EJE 3 AVENIDA 412 SIN. VILLA DE ARAGON, E. CDO ALVARO OBREGON, CALLE VOLCAN POPocatepetl, SIN. ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	23-mar-19	10-mar-19	\$44,794,147.48	\$44,794,147.48	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$44,695,747.41	\$0.00	100.00%	99.77%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
51	DGCOP-LPNL-4-383-19	LOCALES	L.P.R.	GRUP CONSTRUCTORA DEL SOL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAJO PUEBLO", UBICADO EN CALZ. MEXICO TACUBA Y AV. AGUILER BERNAL, COL. TACUBA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11000.	24-mar-19	21-mar-19	\$10,279,777.27	\$10,279,777.27	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$10,279,777.27	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
52	DGCOP-ADL-3-338-19	LOCALES	A.D.	GRUP CONSTRUCTORA DEL SOL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ASOCIACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCION DE SAJO PUEBLO EN EJE 3A AVENIDA GENERAL DALLAWO 2AFATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAM, COLONA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO.	18-mar-19	20-mar-20	\$1,858,000.00	\$1,858,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$1,858,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
53	DGCOP-LPNL-4-419-19	LOCALES	L.P.R.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) D. CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECNIA, NO PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 SIN. ENTRE LAS CALLES OTE 198 Y OTE 205, COL. AGROECIA ORIENTAL.	28-mar-19	25-mar-20	\$28,000,112.45	\$28,000,112.45	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$28,000,112.45	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
54	DGCOP-ADL-3-417-19	LOCALES	A.D.	GRUP DE OBRA, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ASOCIACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) ZONA NORTE III.	18-mar-19	7-mar-20	\$1,858,001.04	\$1,858,001.04	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$1,858,001.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
55	DGCOP-ADL-3-418-19	LOCALES	A.D.	GRUP DE OBRA, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ASOCIACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) ZONA NORTE IV.	18-mar-19	7-mar-20	\$1,858,001.04	\$1,858,001.04	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$1,488,808.04	\$0.00	100.00%	79.98%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
56	DGCOP-ADL-3-424-19	LOCALES	A.D.	SANJA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AUSTO, ALCALDIA TLALPAM, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	18-mar-19	15-mar-19	\$8,180,205.83	\$8,180,205.83	0.00	ANTICIPA	NO	N/A	N/A	N/A		\$8,838,038.94	\$3.00	100.00%	97.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO

000 0072



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "C"



BOGOTÁ, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CÓDIGO	NÚMERO	CÓDIGO	CÓDIGO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPO	CANTIDAD (PERCUDIMIENTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN					INICIO	FIN	MONT	PAGADO	EN TRÁMITE	PROG	FINANCERO	
01	DOCOPIAD-4-425-19	000000	00	CONSTRUCTORA YACAMAMA OPM SA DE CV	TRABAJO ADICIONAL DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES PASO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-03-19	15-06-19	\$1,704,962.95	\$1,704,962.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA NA NA	NA	NA	\$1,704,962.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
02	DOCOPIAD-4-425-19	000000	00	BAJOS MAGNANA Y CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), PLAZAS ESTACIÓN DE POLICIA TLAHUAC, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, USUADO EN EJE 18 SUR, ESQUINA MONTE DE LAS CORDILLERAS, COLONA GUADALUPE TLATEMOC ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-04-19	29-06-19	\$1,380,944.94	\$1,380,944.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NA NA NA	NA	NA	\$1,380,944.94	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATAS	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
401,400,000.00	0.00	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
PAGADO \$0.00	EN TRÁMITE \$0.00
100.00%	100.00%

ABD. CARLOS ANTONIO DOMÍNGUEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ING. JORGE ANTONIO DOMÍNGUEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	113	0	3	88	22	88	22	0
TOTAL	113	0	3	88	22	88	22	0

NOTA:


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

009 0074

[illegible]



NÚMERO	CONTRATO	P. A.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	RESUMEN DEL CONTRATO	FORMA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS VOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS HASTA	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPRON PROMISO - MONTOS			DETENCIÓN		AVANCE %		SEÑAL DE ENTREGA - RESERVA	FORMA DE ENTREGA - RESERVA		OBSERVACIONES	
						MODO	TÉRMINO				MODO	TÉRMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE	HECHO	FINANCIADO	SI	NO					
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para las obras de construcción y mantenimiento a diferentes escuelas de la zona de Tepic, Jalisco, siendo entre ellas: Secundaria Elena "José María Morelos" con CCT 0000000000, Secundaria "Carlos Chagas Ramírez" con CCT 0000000000, Primaria "J.R.S.S." con CCT 0000000000, Primaria "José Martí de Valencia" con CCT 0000000000, Jardín de niños "Santiago Ruiz" con CCT 0000000000, Jardín de niños "José" con CCT 0000000000, Primaria "García R. García" con CCT 0000000000, Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 0000000000, Primaria "Pablo M. de la Cruz Benito Rendón" con CCT 0000000000, Primaria "Hugo" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Primaria "Juan Ruiz" con CCT 0000000000, Primaria "Gregorio Márquez" con CCT 0000000000 y Primaria "Dolores Cárdenas Guzmán" con CCT 0000000000.			1,790,802.84	1,790,802.84						1,790,802.84	0.00								
10	0000000000-0000-00	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	COORDINACIÓN GENERAL	GRUPO DE OBRAS, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para las obras de construcción y mantenimiento a diferentes escuelas de la zona de Tepic, Jalisco, siendo entre ellas: Secundaria Elena "José María Morelos" con CCT 0000000000, Secundaria "Carlos Chagas Ramírez" con CCT 0000000000, Primaria "J.R.S.S." con CCT 0000000000, Primaria "José Martí de Valencia" con CCT 0000000000, Jardín de niños "Santiago Ruiz" con CCT 0000000000, Jardín de niños "José" con CCT 0000000000, Primaria "García R. García" con CCT 0000000000, Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 0000000000, Primaria "Pablo M. de la Cruz Benito Rendón" con CCT 0000000000, Primaria "Hugo" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Primaria "Juan Ruiz" con CCT 0000000000, Primaria "Gregorio Márquez" con CCT 0000000000 y Primaria "Dolores Cárdenas Guzmán" con CCT 0000000000.	00000000	31/12/2011	1,790,802.84	1,790,802.84	1.79	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	0.00	1,790,802.84	\$	-	100.00%	100.00%			X	Obras terminadas, con acta de entrega y recepción.
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para las obras de construcción y mantenimiento a diferentes escuelas de la zona de Tepic, Jalisco, siendo entre ellas: Secundaria Elena "José María Morelos" con CCT 0000000000, Secundaria "Carlos Chagas Ramírez" con CCT 0000000000, Primaria "J.R.S.S." con CCT 0000000000, Primaria "José Martí de Valencia" con CCT 0000000000, Jardín de niños "Santiago Ruiz" con CCT 0000000000, Jardín de niños "José" con CCT 0000000000, Primaria "García R. García" con CCT 0000000000, Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 0000000000, Primaria "Pablo M. de la Cruz Benito Rendón" con CCT 0000000000, Primaria "Hugo" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Primaria "Juan Ruiz" con CCT 0000000000, Primaria "Gregorio Márquez" con CCT 0000000000 y Primaria "Dolores Cárdenas Guzmán" con CCT 0000000000.			1,790,802.17	1,790,802.17								1,790,802.17	0.00						
11	0000000000-0000-00	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	COORDINACIÓN GENERAL	GRUPO DE OBRAS, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para las obras de construcción y mantenimiento a diferentes escuelas de la zona de Tepic, Jalisco, siendo entre ellas: Secundaria Elena "José María Morelos" con CCT 0000000000, Secundaria "Carlos Chagas Ramírez" con CCT 0000000000, Primaria "J.R.S.S." con CCT 0000000000, Primaria "José Martí de Valencia" con CCT 0000000000, Jardín de niños "Santiago Ruiz" con CCT 0000000000, Jardín de niños "José" con CCT 0000000000, Primaria "García R. García" con CCT 0000000000, Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 0000000000, Primaria "Pablo M. de la Cruz Benito Rendón" con CCT 0000000000, Primaria "Hugo" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Primaria "Juan Ruiz" con CCT 0000000000, Primaria "Gregorio Márquez" con CCT 0000000000 y Primaria "Dolores Cárdenas Guzmán" con CCT 0000000000.	00000000	31/12/2011	1,790,802.17	1,790,802.17	1.79	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	0.00	1,790,802.17	\$	-	100.00%	100.00%			X	Obras terminadas, con acta de entrega y recepción.
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para las obras de construcción y mantenimiento a diferentes escuelas de la zona de Tepic, Jalisco, siendo entre ellas: Secundaria Elena "José María Morelos" con CCT 0000000000, Secundaria "Carlos Chagas Ramírez" con CCT 0000000000, Primaria "J.R.S.S." con CCT 0000000000, Primaria "José Martí de Valencia" con CCT 0000000000, Jardín de niños "Santiago Ruiz" con CCT 0000000000, Jardín de niños "José" con CCT 0000000000, Primaria "García R. García" con CCT 0000000000, Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 0000000000, Primaria "Pablo M. de la Cruz Benito Rendón" con CCT 0000000000, Primaria "Hugo" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Primaria "Juan Ruiz" con CCT 0000000000, Primaria "Gregorio Márquez" con CCT 0000000000 y Primaria "Dolores Cárdenas Guzmán" con CCT 0000000000.			1,790,802.17	1,790,802.17								1,790,802.17	0.00						
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para las obras de construcción y mantenimiento a diferentes escuelas de la zona de Tepic, Jalisco, siendo entre ellas: Secundaria Elena "José María Morelos" con CCT 0000000000, Secundaria "Carlos Chagas Ramírez" con CCT 0000000000, Primaria "J.R.S.S." con CCT 0000000000, Primaria "José Martí de Valencia" con CCT 0000000000, Jardín de niños "Santiago Ruiz" con CCT 0000000000, Jardín de niños "José" con CCT 0000000000, Primaria "García R. García" con CCT 0000000000, Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 0000000000, Primaria "Pablo M. de la Cruz Benito Rendón" con CCT 0000000000, Primaria "Hugo" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Secundaria "Luisa Rosa Gómez" con CCT 0000000000, Primaria "Juan Ruiz" con CCT 0000000000, Primaria "Gregorio Márquez" con CCT 0000000000 y Primaria "Dolores Cárdenas Guzmán" con CCT 0000000000.			1,790,802.17	1,790,802.17								1,790,802.17	0.00						

[illegible]



NÚMERO		F. P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN (CONTRATACIÓN)		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPTA	SOLICITA DE ENTREGA RECEPTA		OBSERVACIONES	
	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PASADO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO					
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VIGINTIUNO CARRANZO Y QUETZCO A MAESTRO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA "TRINIDAD I. MADRUGA", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA GONZALEZ Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL BOLLER", ESCUELA PRIMARIA "MARTÍN GARCÍA", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSA", ESCUELA PRIMARIA "RODRIGO QUIROGA", ESCUELA PRIMARIA "JACOB DE NIVEL "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			16,841,801.27	16,841,801.27						16,841,801.27	0.00								
13	0000P-001-1-000-0	PROCESO FINANCIERO PARA PAGAR CONTRATOS	CONTRATO POR OLA	CONTRATO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VIGINTIUNO CARRANZO Y QUETZCO A MAESTRO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA "TRINIDAD I. MADRUGA", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA GONZALEZ Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL BOLLER", ESCUELA PRIMARIA "MARTÍN GARCÍA", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSA", ESCUELA PRIMARIA "RODRIGO QUIROGA", ESCUELA PRIMARIA "JACOB DE NIVEL "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	01/10/2019	31/12/2019	16,841,801.27	16,841,801.27	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	0.00	\$	16,841,801.27	\$	-	100.00%	100.00%		X	Clase terminada, con todo pagado y recibido.
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VIGINTIUNO CARRANZO Y QUETZCO A MAESTRO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA "TRINIDAD I. MADRUGA", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA GONZALEZ Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL BOLLER", ESCUELA PRIMARIA "MARTÍN GARCÍA", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSA", ESCUELA PRIMARIA "RODRIGO QUIROGA", ESCUELA PRIMARIA "JACOB DE NIVEL "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			16,325,505.64	16,325,505.64							16,325,505.64	0.00							
14	0000P-02-0-001-0	PROCESO FINANCIERO PARA PAGAR CONTRATOS	CONTRATO POR OLA	CONTRATO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VIGINTIUNO CARRANZO Y QUETZCO A MAESTRO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA "TRINIDAD I. MADRUGA", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA GONZALEZ Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL BOLLER", ESCUELA PRIMARIA "MARTÍN GARCÍA", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSA", ESCUELA PRIMARIA "RODRIGO QUIROGA", ESCUELA PRIMARIA "JACOB DE NIVEL "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	01/10/2019	31/12/2019	16,325,505.64	16,325,505.64	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	0.00	\$	16,325,505.64	\$	-	100.00%	100.00%		X	Clase terminada, con todo pagado y recibido.
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VIGINTIUNO CARRANZO Y QUETZCO A MAESTRO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA "TRINIDAD I. MADRUGA", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA GONZALEZ Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL BOLLER", ESCUELA PRIMARIA "MARTÍN GARCÍA", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSA", ESCUELA PRIMARIA "RODRIGO QUIROGA", ESCUELA PRIMARIA "JACOB DE NIVEL "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			14,858,811.07	14,858,811.07							14,858,811.07	0.00							
15	0000P-03-0-001-0	PROCESO FINANCIERO PARA PAGAR CONTRATOS	CONTRATO POR OLA	CONTRATO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VIGINTIUNO CARRANZO Y QUETZCO A MAESTRO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA "TRINIDAD I. MADRUGA", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA GONZALEZ Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL BOLLER", ESCUELA PRIMARIA "MARTÍN GARCÍA", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSA", ESCUELA PRIMARIA "RODRIGO QUIROGA", ESCUELA PRIMARIA "JACOB DE NIVEL "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	01/10/2019	31/12/2019	14,858,811.07	14,858,811.07	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	0.00	\$	14,858,811.07	\$	-	100.00%	100.00%		X	Clase terminada, con todo pagado y recibido.
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VIGINTIUNO CARRANZO Y QUETZCO A MAESTRO LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA "TRINIDAD I. MADRUGA", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA GONZALEZ Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL BOLLER", ESCUELA PRIMARIA "MARTÍN GARCÍA", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSA", ESCUELA PRIMARIA "RODRIGO QUIROGA", ESCUELA PRIMARIA "JACOB DE NIVEL "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			14,858,811.07	14,858,811.07							14,858,811.07	0.00							



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª, SESION ORDINARIA 2021

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	3	53	0	56	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	6	0	1	9	1	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	182	0	0	0	182	0	182	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	35	3	0	11	27	11	27	0
TOTAL	276	10	0	15	271	12	274	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 15 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 41 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES TRES ESTAN RECEPCIONADOS).

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-037-20, SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	3	53	0	56	0
TOTAL	55	1	0	3	53	0	56	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 15 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 41 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 3 ESTÁN RECEPCIONADOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

4.000.0084

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2023

Fecha al 30 de septiembre de 2023

NUMERO		R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTOS)			ENTREGA		AVANCE %		OBSERVACIONES
CANT	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Ampliación, Modernización, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y menor al Centro de Salud			77,258,872.87	28,966,487.42	0.00					0.00	28,312,017.78	0.00			
1	0000P-001-A-000-20	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCIONES DEL MUNICIPIO S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud James M. Escobedo, ubicado en Calle Alvarado No. 144, Col. A. del Centro del Sur, Cuatrecasas, C.P. 07130, Alcaldía Cuauhtémoc y México, Ciudad de México.	01/01/2022	30/09/2023	4,236,135.99	4,124,135.99	0.00	ARTÍCULO 100	0.00	N/A	N/A	0.00	4,124,135.99	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
2	0000P-001-A-000-20	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCIONES DEL MUNICIPIO S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Bernardino, ubicado en Calle del Camello de Aragón C.P. A. del Sur, Cuatrecasas, C.P. 07130, Alcaldía Cuauhtémoc y México, Ciudad de México.	01/01/2022	30/09/2023	3,488,275.88	3,488,275.88	0.00	ARTÍCULO 100	0.00	N/A	N/A	0.00	3,479,987.88	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
3	0000P-001-A-000-20	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCIONES DEL MUNICIPIO S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y financiero para la ejecución de los trabajos de construcción de los Centros de Salud James M. Escobedo, ubicado en Calle Alvarado No. 144, Col. A. del Centro del Sur, Cuatrecasas, C.P. 07130, y Centro de Salud Felipe Bertrando, ubicado en Calle del Camello de Aragón C.P. A. del Sur, Cuatrecasas, C.P. 07130, ambos en la Alcaldía Cuauhtémoc y México, Ciudad de México.	01/01/2022	30/09/2023	1,794,813.99	1,488,883.88	0.00	ARTÍCULO 100	0.00	N/A	N/A	0.00	1,488,883.88	0.00	99.99%	99.99%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2023, del contrato multianual.
4	0000P-001-A-000-20	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCIONES DEL MUNICIPIO S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Veracruz, ubicado en Calle Santa Cruz S/N, entre Calle Jaramila y Veracruz, Col. Veracruz, C.P. 06660, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/01/2022	30/09/2023	13,883,549.99	6,961,308.10	0.00	ARTÍCULO 100	0.00	N/A	N/A	0.00	6,968,486.10	0.00	61.98%	61.98%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2023, del contrato multianual.
5	0000P-001-A-000-20	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCIONES DEL MUNICIPIO S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción del Centro de Salud Veracruz, ubicado en Calle Santa Cruz S/N, entre Calle Jaramila y Veracruz, Col. Veracruz, C.P. 06660, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/01/2022	30/09/2023	1,247,126.23	536,139.24	0.00	ARTÍCULO 100	0.00	N/A	N/A	0.00	511,399.39	0.00	61.98%	61.98%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2023, del contrato multianual.
6	0000P-001-A-000-20	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCIONES DEL MUNICIPIO S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción, Ampliación y Modernización del Centro de Salud Quetzalcóatl, ubicado en Calle Higuera, No. 244, Quetzalcóatl, C.P. 06660, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/01/2022	30/09/2023	13,447,823.99	7,369,190.89	0.00	ARTÍCULO 100	0.00	N/A	N/A	0.00	7,382,308.14	0.00	58.11%	60.90%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2023, del contrato multianual.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - EJERCICIO 2020

Fecha al 30 de septiembre de 2020

CARGO	CONTRATO	C.C.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	MONTOS CONTRACTUALES	SOLICITUD	ANTECEDENTES		COMPROBACIÓN (PERÍODO: MES)			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2020				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAIDOS	DE PAGAR	PAIDOS	FINANCIADOS	
22	0000P-03-1-1-104-01	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Centro Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Solidaridad Tepejala, ubicado en Calle Viala y Calle de la Salud, C.P. 1200, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/08/2020	31/08/2020	1,390,155.04	580,225.12	0.40	ACTIVO	0.00				595,783.82	0.00	41.88%	38.39%	Servicios Cancelados. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ANULADO	0.00	0.0	0.0	0.00			●	●	
											PROYECTADO	0.00								
23	0000P-03-1-1-104-02	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Solidaridad Tepejala, ubicado en Calle Viala y Calle de la Salud, C.P. 1200, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/08/2020	31/08/2020	1,737,155.25	6,194,858.03	0.35	ACTIVO	0.00				6,714,889.32	0.00	66.87%	66.84%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ANULADO	0.00	0.0	0.0	0.00			●	●	
											PROYECTADO	0.00								
24	0000P-03-1-1-104-03	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Centro Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Solidaridad Tepejala, ubicado en Calle Viala y Calle de la Salud, C.P. 1200, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/08/2020	31/08/2020	1,434,188.18	540,385.17	0.38	ACTIVO	0.00				618,718.22	0.00	64.51%	42.41%	Servicios Cancelados. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ANULADO	0.00	0.0	0.0	0.00			●	●	
											PROYECTADO	0.00								
25	0000P-03-1-1-104-04	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Solidaridad Tepejala, ubicado en Calle Viala y Calle de la Salud, C.P. 1200, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/08/2020	31/08/2020	1,800,024.20	1,808,824.20	0.00	ANULADO	0.00				1,008,898.31	0.00	100.00%	99.92%	Trabajos concluidos. Planteamiento de Liquidación y Desagüe.
											ANULADO	0.00								
											PROYECTADO	0.00								
26	0000P-03-1-1-104-05	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Centro Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Viala y Calle de la Salud, C.P. 1200, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/08/2020	31/08/2020	1,911,314.98	389,894.17	0.20	ACTIVO	0.00				600,174.22	0.00	31.94%	22.89%	Servicios Cancelados. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ANULADO	0.00	0.0	0.0	0.00			●	●	
											PROYECTADO	0.00								
27	0000P-03-1-1-104-06	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Viala y Calle de la Salud, C.P. 1200, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/08/2020	31/08/2020	1,421,275.04	2,800,000.00	0.19	ACTIVO	0.00				1,781,898.86	0.00	65.14%	24.94%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ANULADO	0.00	0.0	0.0	0.00			●	●	
											PROYECTADO	0.00								
28	0000P-03-1-1-104-07	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Viala y Calle de la Salud, C.P. 1200, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/08/2020	31/08/2020	1,570,921.30	1,889,240.06	0.12	ACTIVO	0.00				1,833,240.06	0.00	91.99%	91.99%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ANULADO	0.00	0.0	0.0	0.00			●	●	
											PROYECTADO	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Fecha al 30 de septiembre de 2021

NÚMERO		C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	OTROS DATOS	CONVENIO (PERÍODO: MONEDAS)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES		
CANTO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONEDAS	PAGADA	DE TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyecto integral para los trabajos de construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI)			14,898,896.73	14,898,896.73	0.00			0.00	14,822,747.10	0.00					
20	2020/01/18 / 4,204.30	148/10/2019	01	ARQUITECTA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Carrasco No. 407 esquina Calle Plan de San Luis, Colonia Santa Teresa, C.P. 06800, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/08/2020	30/09/2020	13,829,897.05	13,829,897.05	0.00	ARQUITECTA	0.00	N/A	N/A	0.00	11,586,582.34	0.00	95.83%	95.78%	Trabajos en proceso de ejecución.
											PROYECTO DE OBRA	0.00			0.00					
21	2020/01/18 / 1,225.89	148/10/2019	01	ARQUITECTA S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral para los trabajos de construcción de la Clínica Especializada en Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Calle Manuel Carrasco No. 407 esquina Calle Plan de San Luis, Colonia Santa Teresa, C.P. 06800, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/08/2020	30/09/2020	1,225,898.72	1,225,898.72	0.00	ARQUITECTA	0.00	N/A	N/A	0.00	1,210,794.96	0.00	100.00%	99.82%	Servicios concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											PROYECTO DE OBRA	0.00			0.00					
					Proyecto integral para los trabajos de construcción de la Clínica Especializada.			15,127,106.73	15,127,106.73	0.00					0.00	15,095,088.38	0.00			
22	2020/01/18 / 1,378.47	148/10/2019	01	ARQUITECTA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Carrasco No. 407 esquina Calle Plan de San Luis, Colonia Santa Teresa, C.P. 06800, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/08/2020	30/09/2020	13,878,136.47	13,878,136.47	0.00	ARQUITECTA	0.00	N/A	N/A	0.00	13,845,211.65	0.00	99.90%	98.79%	Trabajos en proceso de ejecución.
											PROYECTO DE OBRA	0.00			0.00					
23	2020/01/18 / 1,348.22	148/10/2019	01	ARQUITECTA S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral para los trabajos de construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Carrasco No. 407 esquina Calle Plan de San Luis, Colonia Santa Teresa, C.P. 06800, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/08/2020	30/09/2020	1,348,222.26	1,348,222.26	0.00	ARQUITECTA	0.00	N/A	N/A	0.00	1,347,876.80	0.00	100.00%	99.81%	Servicios concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											PROYECTO DE OBRA	0.00			0.00					
					Proyecto Operativo de Centro de Salud.			5,790,900.38	5,790,900.38	0.00					0.00	5,778,015.48	0.00			
24	2020/01/18 / 1,340.58	148/10/2019	01	ARQUITECTA S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo del Centro de Salud (Centro de Especialidades No. 5), ubicada en Avda de Salud No. 27, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	01/08/2020	30/09/2020	1,340,587.07	1,340,587.07	0.00	ARQUITECTA	0.00	N/A	N/A	0.00	1,338,552.51	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 2-sep-2021. Pendiente de liquidar.
											PROYECTO DE OBRA	0.00			0.00					
25	2020/01/18 / 1,384.70	148/10/2019	01	ARQUITECTA S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo para la Atención y Rehabilitación del Centro de Salud (Centro de Especialidades No. 5), ubicada en Avda de Salud No. 27, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	01/08/2020	30/09/2020	1,384,702.28	1,384,702.28	0.00	ARQUITECTA	0.00	N/A	N/A	0.00	1,382,705.14	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											PROYECTO DE OBRA	0.00			0.00					

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Cuota al 30 de septiembre de 2021

NÚMERO	CONTRATO	S.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ARTÍCULO		CÓMPUTO PERÍODO (MONTOS)			DETALLADO		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	APORTA	PROGRESO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIARIO	
16	00000P AD 1.1.200.20	INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIÓN)	AD	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud "Dr. Francisco J. Gamio", ubicado en la Independencia No. 26, Col. Independencia, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	14/06/2020	30/12/2020	1,340,881.66	1,340,881.66	0.00	ARTÍCULO	0.00				1,340,881.66	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
											ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00					
											ARTÍCULO	0.00								
17	00000P AD 1.1.207.20	INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIÓN)	AD	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud "Dr. Rafael Hernández", ubicado en la Independencia No. 26, Col. Independencia, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	14/06/2020	30/12/2020	305,290.19	305,290.19	0.00	ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	305,290.19	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
											ARTÍCULO	0.00								
											ARTÍCULO	0.00								
18	00000P AD 1.1.200.20	INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIÓN)	AD	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud "Dr. Rafael Hernández", ubicado en la Independencia No. 26, Col. Independencia, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	14/06/2020	30/12/2020	1,340,881.66	1,340,881.66	0.00	ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,340,881.66	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
											ARTÍCULO	0.00								
											ARTÍCULO	0.00								
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos Camarines de salud de la Ciudad de México.			11,730,651.97	11,730,651.97	0.00					0.00	11,730,651.97	0.00			
19	00000P AD 1.1.200.20	INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIÓN)	AD	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Sur de la Ciudad de México, ubicado en la Independencia No. 26, Col. Independencia, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	14/06/2020	30/12/2020	1,274,360.64	1,274,360.64	0.00	ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,274,360.64	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
											ARTÍCULO	0.00								
											ARTÍCULO	0.00								
20	00000P AD 1.1.200.20	INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIÓN)	AD	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Sur de la Ciudad de México, ubicado en la Independencia No. 26, Col. Independencia, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	14/06/2020	30/12/2020	673,273.28	673,273.28	0.00	ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	673,273.28	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
											ARTÍCULO	0.00								
											ARTÍCULO	0.00								
21	00000P AD 1.1.211.20	INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIÓN)	AD	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Sur de la Ciudad de México, ubicado en la Independencia No. 26, Col. Independencia, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	14/06/2020	30/12/2020	974,825.82	974,825.82	0.00	ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	974,825.82	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
											ARTÍCULO	0.00								
											ARTÍCULO	0.00								
22	00000P AD 1.1.200.20	INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIÓN)	AD	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Sur de la Ciudad de México, ubicado en la Independencia No. 26, Col. Independencia, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	14/06/2020	30/12/2020	1,857,257.88	1,857,257.88	0.00	ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,857,257.88	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
											ARTÍCULO	0.00								
											ARTÍCULO	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Cuota al 30 de septiembre de 2020

NÚMERO	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CENTRO	PERÍODO DE EJERCICIO CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS	OTORGADO	ANTE-POR		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ENTRADA		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPADO	RENTAS	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	TRÁMITE	FINANCIADO	
24	024/OP-02-L-1-201-20	100-00000000	AD	GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospital General Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Estado y Distrito Federal, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	133,158.82	133,158.82	0.00	ANTICIPADO	RENTAS	01/04	30/09	0.00	133,158.82	0.00	100.00%	99.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptoría.
25	025/OP-02-L-1-201-20	100-00000000	AD	GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospital General Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Estado y Distrito Federal, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	191,291.98	191,291.98	0.00	ANTICIPADO	RENTAS	01/04	30/09	0.00	191,291.98	0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptoría.
26	026/OP-02-L-1-201-20	100-00000000	AD	GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospital General Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Estado y Distrito Federal, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	296,488.29	296,488.29	0.00	ANTICIPADO	RENTAS	01/04	30/09	0.00	296,488.29	0.00	100.00%	99.27%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptoría.
28	028/OP-02-L-1-201-20	100-00000000	AD	GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospital General Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Estado y Distrito Federal, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	1,205,736.68	1,205,736.68	0.00	ANTICIPADO	RENTAS	01/04	30/09	0.00	1,205,736.68	0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptoría.
29	029/OP-02-L-1-201-20	100-00000000	AD	GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospital General Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Estado y Distrito Federal, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	946,755.27	946,755.27	0.00	ANTICIPADO	RENTAS	01/04	30/09	0.00	946,755.27	0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptoría.
30	030/OP-02-L-1-201-20	100-00000000	AD	GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospital General Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Estado y Distrito Federal, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	734,636.70	734,636.70	0.00	ANTICIPADO	RENTAS	01/04	30/09	0.00	734,636.70	0.00	100.00%	99.19%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptoría.
31	031/OP-02-L-1-201-20	100-00000000	AD	GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospital General Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Estado y Distrito Federal, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	585,981.83	585,981.83	0.00	ANTICIPADO	RENTAS	01/04	30/09	0.00	585,981.83	0.00	100.00%	91.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Receptoría.



Dieta al 90 de vegetarismo de 1984.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Cuota al 20 de septiembre del 2020

NÚMERO	CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	MONTOS CONTRACTUALES EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ESTIMACIONES		COMPARO PERÍODO - MONTOS			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
101	2016-07-01-1-0-07-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	OB	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Servicio de Apoyo Técnico, Administrativo y Operativo para la Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento, Conservación y Adquisición de los Bienes Culturales y Especiales de los Museos y Teatros del Sistema Cultural Nacional de Ciudad de México, en el Sistema Nacional de Museos de Ciudad de México, Avenida Miguel Alemán s/n 11440.	2016-07-01	31-12-2020	9,196,381.12	0.00	0-00	MANEJO OBRAS	1,176,000.11	N/A	N/A	0-00	0.00	0.00	0.00%	15.30%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato en proceso de ejecución.
102	2016-07-01-1-0-07-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	OP	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Proyecto integral para la Construcción de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisición de los Bienes Culturales y Especiales de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno, en el Sistema Nacional de Museos de Ciudad de México, en el Sistema Nacional de Museos de Ciudad de México, Avenida Miguel Alemán s/n 11440.	2016-07-01	31-12-2020	50,000,532.28	0.00	0-00	MANEJO OBRAS	11,548,352.13	N/A	N/A	0-00	0.00	0.00	0.00%	30.30%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato en proceso de ejecución.
TOTAL								59,196,963.40	0.00	0-00					0.00	447,836,487.31	0.00			


C. Víctor Manuel Hernández Salas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
59,196,963.40	0.00	40,768,352.13
		40,768,352.13
		11,548.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
447,836,487.31	0.00	0.00%	30.30%

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	0	0	1	9	1	9	0
TOTAL	4	0	0	1	9	1	9	0


EL CONTRATO DGCOP-AD-L-6-637-26, SE ENCUENTRA RECEPCIONADO.


 

00000094

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	RECURSOS DE LA ENTIDAD		NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO DE GASTOS			CÓDIGO DE GASTOS		CÓDIGO DE GASTOS		DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
					PROPIOS	TRANSFERIDOS				PROPIOS	TRANSFERIDOS	PROPIOS	TRANSFERIDOS	PROPIOS	TRANSFERIDOS			
1	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
2	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
3	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
4	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
5	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
6	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
7	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
8	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
9	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
10	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	10	100	Secretaría de Economía	Presupuesto de la Secretaría de Economía		1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía			1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	Presupuesto de la Secretaría de Economía	
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							
										SECRETARÍA	1000							

El presente documento es una copia de la información registrada.


Ing. [Nombre] [Apellido]
Secretaría de Economía y Finanzas Públicas


Ing. [Nombre] [Apellido]
Dirección de Gastos Públicos

TOTAL	TOTAL	TOTAL
PROPIOS	TRANSFERIDOS	PROPIOS
1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

TOTAL DE GASTOS	TOTAL DE GASTOS	TOTAL DE GASTOS	TOTAL DE GASTOS
PROPIOS	TRANSFERIDOS	PROPIOS	TRANSFERIDOS
1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENEOCHTILAN
SIETE MILES DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	182	0	0	0	182	0	182	0

00000096



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



DIOMEDES ALFONSO GARCÍA GARCÍA

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

ORDEN	NOMBRE	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado TOTAL	Monto comprometido EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPA		CUMPLIMIENTO (PERÍODO-MES)			ESTIMACIÓN		AVANCE		SITUACIÓN
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	NO	INICIO	TERMINO	MES	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	
1	DOCCOPAD-1-007-20	URBANA	AD	SAEIN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES BUNDADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "CUAHTEMOC", UBICADO EN JESÚS GARRANDA N°38, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAHTEMOC, C.P. 06030, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	20-may-20	\$536,438.79	\$536,438.79	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	\$527,870.01	\$0.00	100.00%	98.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
2	DOCCOP-LPN-1-012-20	URBANA	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA OTZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$13,549,224.85	\$13,549,224.85	0.00	ANTICIPA	NO	11-may-20	15-oct-20	NA	\$4,742,028.89	\$17,214,890.21	100.00%	94.11%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
3	DOCCOP-LPN-1-013-20	URBANA	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL, 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	0.00	ANTICIPA	NO	11-may-20	8-sep-20	NA	\$2,000,000.00	\$10,000,000.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
4	DOCCOP-LPN-1-014-20	URBANA	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INGENIERIA S.A. Y MAGNANA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CABO FINSTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINSTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-abr-20	25-may-20	\$13,870,451.89	\$13,870,451.89	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	\$0,000,000.00	\$0.00	100.00%	49.99%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
5	DOCCOPAD-1-019-20	URBANA	AD	GRUPO FINE DEL COMPLEJO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIÓN DE POLICIA RECONTE" UBICADO EN CALLE RECONTE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-may-20	24-may-20	\$1,181,385.77	\$1,181,385.77	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	\$1,181,385.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
6	DOCCOPAD-1-025-20	URBANA	AD	GRUPO CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PLAZAS ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL, 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO; 2.- "PLAZAS CABO FINSTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINSTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTO ATZACALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO; 3.- "PLAZAS SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA OTZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	17-may-20	\$2,229,867.88	\$2,229,867.88	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	\$2,010,000.00	\$0.00	100.00%	93.14%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
7	DOCCOPAD-1-034-20	URBANA	AD	GRUPO GUAY S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIÓN DE POLICIA FLUTANTE ELIAS CALLES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, COLONIA COYULA, ALCALDÍA OTZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	27-may-20	\$1,484,336.84	\$1,484,336.84	0.00	ANTICIPA	NO	NA	NA	NA	\$1,484,336.84	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
8	DOCCOP-EL-1-029-20	URBANA	IR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS GUATEMALA", UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A. VERA N° 28, COLONIA GUATEMALA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-may-20	9-may-20	\$7,184,444.03	\$7,184,444.03	0.00	ANTICIPA	NO	9-may-20	9-may-20	NA	\$1,740,000.00	\$8,447,000.00	100.00%	91.70%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO	CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	COMENTA	ANTICIPA		CÓMPUTO (PERÍODO ANTERIOR)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		
8	DGCOF-AD-L-000-20	100409	A.O.	JANA JUNE ANTONIO RUIZ DEL HERTO	REHABILITACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ACQUISICIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS SAMO" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 SUR, LT-18, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCA, ALCALDÍA STANISLAO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	17-jun-20	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,800,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOF-AD-L-001-20	100409	A.O.	GRUPO QUIROGA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS SAMO" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 SUR, LT-18, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCA, ALCALDÍA STANISLAO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-may-20	26-may-20	\$1,858,882.82	\$1,858,882.82	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,858,882.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOF-LPML-1-000-20	100409	L.P.A.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 1-P", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-may-20	22-ago-20	\$12,423,442.59	\$12,423,442.59	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	NA	\$12,423,442.59	\$0.00	100.00%	99.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOF-LPML-1-000-20	100409	L.P.A.	DE ARQ. (MONTAÑES), S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 1-P", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-20	3-sep-20	\$5,776,034.00	\$5,776,034.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$5,776,034.00	\$0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOF-AD-L-000-20	100409	A.O.	GRUPO QUIROGA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, HONOLUCAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OTRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 1-P", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	16-may-20	14-ago-20	\$1,847,000.00	\$1,847,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,847,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOF-AD-L-000-20	100409	A.O.	MAXTEL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PELOPONEO N.º 11, LOTES 25 Y 26, COLONIA BELVEDERE ALVARO, ALCALDÍA TLALPAM, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,248,260.70	\$1,248,260.70	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,248,260.70	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOF-AD-L-000-20	100409	A.O.	MAXTEL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIÓN DE POLICIA (STACCHAS)", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLATANILLO SAN COLONIA, REFORMA UTACCHAS, NORTE, ALCALDÍA STANISLAO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,253,357.77	\$1,253,357.77	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,253,357.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOF-AD-L-000-20	100409	A.O.	MAXTEL, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS OLIVAR DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALLE 20 SAN COLONIA OLIVAR DEL CONDE 16 SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,884,105.82	\$1,884,105.82	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,884,105.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

000 0098



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

CORTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORDEN	NOMBRE	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Ejecutado (Cero)	Comisión	Anticipos		OBRAS (OTROS-ANEXO)			Ejecución		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	Anticipos	Inicio	Termino	Avance	Inicio	Termino	Inicio	Termino	
17	DOCOFAD-L-044-20	100448	A.O.	WOLFRUM INGENIERIA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA NORALIA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONTE LÓPEZ S/N, COLONIA LA NORALIA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,353,698.39	\$1,353,698.39	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$1,353,698.39	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DOCOFAD-L-044-20	100448	A.O.	GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CANCHA DE BARRIA PLARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORREA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	\$513,230.11	\$513,230.11	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$513,230.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DOCOFAD-L-044-20	100448	A.O.	WOLFRUM INGENIERIA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA NORALIA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONTE LÓPEZ S/N, COLONIA LA NORALIA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	17-may-20	\$4,542,810.88	\$4,542,810.88	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$4,542,810.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DOCOFAD-L-044-20	100448	A.O.	WOLFRUM INGENIERIA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA NORALIA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONTE LÓPEZ S/N, COLONIA LA NORALIA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	11-jun-20	\$794,025.00	\$794,025.00	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$794,025.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DOCOFAD-L-044-20	100448	A.O.	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA NORALIA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORREA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$558,979.91	\$558,979.91	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$558,979.91	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DOCOFAD-L-044-20	100448	A.O.	WOLFRUM INGENIERIA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA NORALIA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONTE LÓPEZ S/N, COLONIA LA NORALIA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	19-jun-20	\$1,512,872.97	\$1,512,872.97	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$1,512,872.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DOCOFAD-L-044-20	100448	A.O.	WOLFRUM INGENIERIA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES LA NORALIA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY BERNARDO TERESA DE SAN Y CHALMOPOLCA, COLONIA TRANSITO, ALCALDÍA GUAYATEPEC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-jun-20	4-jul-20	\$1,008,131.10	\$1,008,131.10	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$1,008,131.10	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DOCOFAD-L-044-20	100448	A.O.	WOLFRUM INGENIERIA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA NORALIA", UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONTE LÓPEZ S/N, COLONIA LA NORALIA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-may-20	21-jun-20	\$5,223,034.00	\$5,223,034.00	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$5,223,034.00	\$0.00	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)



1. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35, 10, 1153-1161.
 2. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35, 10, 1162-1170.
 3. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35, 10, 1171-1179.



JOHN W. BAKER, EDITORIAL BOARD

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
ENERGÍA 2020[illegible]

2,000 0180



INTERNATIONAL JOURNAL OF LINGUISTICS
Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.



Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJECUCIÓN 2019

[illegible]

2035 8191



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN

INFORME DE AVANCE FONDO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercido 2020	CANTIDAD	ANTICIPA		CONVENIO (PERCENTAJES)			EXTENSION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBIDO	NO RECIBIDO	RECIBIDO	NO RECIBIDO	RECIBIDO	PAGADO	NO PAGADO	RECIBIDO	NO RECIBIDO	
40	DDCOP-AD-L-1-095-20	100420	A.D.	BAJEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENOT" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENOT "LAHUAQUE", UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO SALEMA No. 122, COL. LA GUADALUPE, C.P. 1906, ALCALDÍA TLAHUAC 2) CENOT "CAMARÁ ENCANTADA", UBICADO EN CALLE CHEMAX ESQ. CHICHAMEN SAN, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, C.P. 19106, ALCALDÍA TLAHUAC EN CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	4-agt-20	\$1,777,911.91	\$1,777,911.91	0.00	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NA	NA	NA	\$1,777,911.91	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
41	DDCOP-AD-L-3-096-20	100420	A.D.	GRUPO FINE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS PARA MUJERES ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLAVAR PONIENTE SAN, POBLADO DE SAN JERÓNIMO MEXICALTÁN, ALCALDÍA MEXICALTÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	25-jun-20	\$1,051,389.88	\$1,051,389.88	0.00	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NA	NA	NA	\$1,051,389.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
42	DDCOP-AD-L-3-097-20	100420	A.D.	GRUPO FINE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS CHICHICAMPAL, TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RAMIRO VIEJO EN ESQUINA CHANCENOTE, COLONA CHICHICAMPAL, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,247,791.86	\$1,247,791.86	0.00	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NA	NA	NA	\$1,247,791.86	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
43	DDCOP-AD-L-3-098-20	100420	A.D.	GRUPO FINE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS CHICHICAMPAL, CIBERESCUOLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RAMIRO VIEJO EN ESQUINA CHANCENOTE, COLONA CHICHICAMPAL, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,145,876.57	\$1,145,876.57	0.00	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NA	NA	NA	\$1,145,876.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
44	DDCOP-AD-L-3-099-20	100420	A.D.	GRUPO FINE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIÓN DE POLICIA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RAMIRO VIEJO EN ESQUINA CHANCENOTE, COLONA CHICHICAMPAL, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,145,876.57	\$1,145,876.57	0.00	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NA	NA	NA	\$1,145,876.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
45	DDCOP-AD-L-3-100-20	100420	A.D.	GRUPO FINE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS CENOT TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RAMIRO VIEJO EN ESQUINA CHANCENOTE, COLONA CHICHICAMPAL, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,145,876.57	\$1,145,876.57	0.00	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NA	NA	NA	\$1,145,876.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
46	DDCOP-AD-L-3-101-20	100420	A.D.	GRUPO FINE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS CENOT TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RAMIRO VIEJO EN ESQUINA CHANCENOTE, COLONA CHICHICAMPAL, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,145,876.57	\$1,145,876.57	0.00	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NA	NA	NA	\$1,145,876.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
47	DDCOP-LPH-4-102-20	100420	L.P.H.	CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS LUIS DONALDO COLOMBIO", UBICADO EN CALLE CASO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CASO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-jun-20	16-nov-20	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	0.00	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NA	NA	NA	\$5,000,000.00	\$0.00	100.00%	96.40%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
48	DDCOP-LPH-4-103-20	100420	L.P.H.	CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS MALACATEPEC", UBICADO EN FRONTERA DEL TERRENO EN CALLE AGUILES VERDAN EN ESQUINA CALLE HERÓES HÉROES, COLONA MALACATEPEC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-jun-20	16-nov-20	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	0.00	RECIBIDO	NO RECIBIDO	NA	NA	NA	\$5,000,000.00	\$0.00	100.00%	96.40%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



DIOME AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMANDO (PERÍODO MENSUAL)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	NA	SENI	TERMINO	NA	FINANCIACIÓN	ENTRADA	FINANCIACIÓN	TERMINO	
18	DOCCOP-AD-L-2-105-20	100419	A.O.	GRUPO FIBRA DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS: CASA ALBERTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUILOS, COLONIA HEREDIA DE CORDERO, PRESTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. BAZZERO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jul-20	27-jul-20	\$1,571,886.28	\$1,571,886.28	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,571,886.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
48	DOCCOP-AD-L-5-108-20	100419	A.O.	COMPAÑÍA MONTES MEXICANA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS PEDRO VELAZQUEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PRECIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERDE Y PEDRO VELAZQUEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA ZITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jul-20	8-ago-20	\$553,790.33	\$553,790.33	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$553,790.33	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
52	DOCCOP-AD-L-3-107-20	100419	A.O.	GRUPO FIBRA DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS PLOTZ", UBICADO EN MANISCO ESQUINA AVENIDA PUERTO DE BAZATLAN, COLONIA PLOTZ ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	20-sep-20	\$395,300.00	\$395,300.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$395,300.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
61	DOCCOP-LPN-L-4-109-20	100419	L.P.N.	SARRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS: CANAL DE SARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AV. TLATUAC ESQUINA AV. CANAL DE SARAY, COLONIAS EL VERDE Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA ZITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-jul-20	30-ene-20	\$8,095,129.54	\$8,095,129.54	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	OBRA CANCELADA
62	DOCCOP-LPN-L-4-111-20	100419	L.P.N.	COMPAÑÍA MONTES MEXICANA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAN ANDRÉS AHUAYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CARRETERA ACOCHIMILCO-SAN PABLO ESQUINA AVENIDA JUÁREZ, PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, ALCALDÍA ACOCHIMILCO, ESTADO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-20	1-oct-20	\$7,954,898.70	\$7,954,898.70	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$7,954,898.70	\$0.00	100.00%	98.94%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
68	DOCCOP-AD-L-5-112-20	100419	A.O.	PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES INFRAESTRUCTURALES "CONDO" (CENTROS DE DESARROLLO) (PLANOS) (CASA) P. BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CONDO "TATUAC", UBICADO EN AV. JARDÍN Y CROQUIS, COL. "TATUAC", C.P. 06600, ALCALDÍA ACOCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CONDO "LODANAV", UBICADO EN CALLE LA LAGUNA NO. 305, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 06600, ALCALDÍA MÉXICO NUEVO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CONDO "NOCOLLA ORIENTAL", UBICADO EN OBRERA 207, COL. RUA H. SAN, C.P. 06600, COL. ACOCHIMILCO, ALCALDÍA ACOCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	8-jul-20	2-mar-20	\$1,748,496.30	\$1,748,496.30	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,748,496.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
84	DOCCOP-BUL-L-118-20	100419	U.N.	OBROS, MANOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A UN CRUCEROS TERRITORIALES EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA POLSUNA DE GÉNERO TURISMO, GRUPO "A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LOMA "TATUAC", UBICADO EN AV. OBSERVATORIO 302, GENERAL JOSÉ MARÍA MORENO, COL. OBSERVATORIO, C.P. 06600, ALCALDÍA MÉXICO NUEVO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) LOMA "TATUAC", UBICADO EN AV. OBSERVATORIO 302, GENERAL JOSÉ MARÍA MORENO, COL. OBSERVATORIO, C.P. 06600, ALCALDÍA MÉXICO NUEVO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	25-jul-20	9-ene-21	\$4,385,412.00	\$4,385,412.00	0.00	ANTICIPO	NA	28-jul-20	9-ene-21	\$524,580.34	\$4,907,535.48	\$0.00	100.00%	87.66%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
88	DOCCOP-LPN-L-4-121-20	100419	L.P.N.	GRUPO FIBRA DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATUAC DEL COLONIA RUILOS, SANTA CATARINA, ALCALDÍA ZITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-20	7-mar-20	\$7,215,767.64	\$7,215,767.64	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$7,215,767.64	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
98	DOCCOP-LPN-L-4-122-20	100419	L.P.N.	OBRA CONSTRUCCIÓN EN INTEGRACIÓN DEL SECTOR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL, SAN ESPIRITO, C.P. 06600, ALCALDÍA MÉXICO NUEVO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CONDO "NOCOLLA ORIENTAL", UBICADO EN OBRERA 207, COL. RUA H. SAN, C.P. 06600, COL. ACOCHIMILCO, ALCALDÍA ACOCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	21-jul-20	7-mar-20	\$8,290,541.98	\$8,290,541.98	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$8,182,975.48	\$0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO

4-00000103



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE PERIODO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

ORDEN	NOMBRE	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contratado TOTAL	Monto contratado EJERCICIO 2020	COTIZACIÓN	ANTICIPO		CÓMODO PERIODO-MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	NA	RECIBO	TERMINO	MONTO	PASADO	EN TRÁMITE	PASADO	EN TRÁMITE	
57	DOCCOP-LPH-4-123-20	10/04/20	LPH	SAFSA-EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PIELAS) PLAZAS SAN FRANCISCO, UNIDAD DE FRACCIÓN DE TERRENO UNICA EN PERIODO DE CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIAN ANTECEDER PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, COLOMBIA SAN FRANCISCO, ALCALDIA LA MARQUESA-CONTRATAS, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	10-ene-20	\$3,586,054.80	\$3,586,054.80	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$3,586,054.80	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
58	DOCCOP-LPH-4-124-20	10/04/20	LPH	GRUPO SURUBA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PIELAS) PLAZAS SAN FRANCISCO, UNIDAD DE FRACCIÓN DE TERRENO UNICA EN C.E. Y ORIENTE ANTONIO ANTONIO MOLINA UNIDAD SAN ANTONIO SAN ANTONIO TETEPULCO, ALCALDIA TETEPULCO, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	4-ago-20	1-ene-20	\$8,806,007.08	\$8,806,007.08	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$8,806,007.08	\$0.00	100.00%	98.87%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
59	DOCCOP-LPH-4-125-20	10/04/20	LPH	GRUPO SURUBA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PIELAS) PLAZAS TETEPULCO, UNIDAD DE FRACCIÓN DE TERRENO UNICA EN CALLE SAN SEBASTIAN EN ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y TETEPULCO, SANTA CRISTINA, COLOMBIA FEDERAL DE SANTA CRISTINA, ALCALDIA COCHICAL, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	4-ago-20	1-ene-20	\$5,251,577.26	\$5,251,577.26	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$4,201,261.82	\$0.00	100.00%	80.95%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
60	DOCCOP-LPH-4-126-20	10/04/20	LPH	GRUPO SURUBA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PIELAS) PLAZAS TETEPULCO, UNIDAD DE FRACCIÓN DE TERRENO UNICA EN CALLE SAN SEBASTIAN EN ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y TETEPULCO, SANTA CRISTINA, COLOMBIA FEDERAL DE SANTA CRISTINA, ALCALDIA COCHICAL, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	10-ene-20	\$5,255,443.31	\$5,255,443.31	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$189,077.38	100.00%	3.23%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
61	DOCCOP-AD-3-127-20	10/04/20	AD	GRUPO S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS PLAZA DE ANAUC, ALCALDIA TETEPULCO, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-ago-20	9-ago-20	\$294,938.10	\$294,938.10	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$294,938.10	100.00%	98.95%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
62	DOCCOP-AD-3-128-20	10/04/20	AD	PERIODE CANALES ARQUITECTURA S. DE RL. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS TETEPULCO, UNIDAD EN FRACCIÓN DE TERRENO UNICA EN AVENIDA PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, COLOMBIA SAN FRANCISCO, ALCALDIA TETEPULCO, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	11-ago-20	\$987,000.00	\$987,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$987,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
63	DOCCOP-AD-3-129-20	10/04/20	AD	GRUPO SURUBA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (LUGAR) TETEPULCO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE SAN SEBASTIAN EN ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y TETEPULCO, SANTA CRISTINA, COLOMBIA FEDERAL DE SANTA CRISTINA, ALCALDIA COCHICAL, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	20-ago-20	19-ago-20	\$1,883,891.87	\$1,883,891.87	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,883,891.87	\$0.00	100.00%	99.30%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
64	DOCCOP-AD-3-131-20	10/04/20	AD	TRILLO DE ARQUITECTURA JAVIER SANCHEZ S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS TETEPULCO, UNIDAD EN FRACCIÓN DE TERRENO UNICA EN AVENIDA PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, COLOMBIA SAN FRANCISCO, ALCALDIA TETEPULCO, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	11-ago-20	\$375,840.00	\$375,840.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$375,840.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
65	DOCCOP-AD-3-132-20	10/04/20	AD	JOSE MIGUEL HERRERA CHAVEZ	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, REPARACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR NO MENOS DE 100 UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (LUGAR) TETEPULCO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE SAN SEBASTIAN EN ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y TETEPULCO, SANTA CRISTINA, COLOMBIA FEDERAL DE SANTA CRISTINA, ALCALDIA COCHICAL, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-ago-20	19-ago-20	\$1,886,815.48	\$1,886,815.48	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,886,815.48	\$0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
66	DOCCOP-AD-3-133-20	10/04/20	AD	E. DE OBRAS Y SERVICIOS ARQUITECTOS S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS PLAZA DE ANAUC, ALCALDIA TETEPULCO, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	28-ago-20	\$954,100.29	\$954,100.29	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$954,100.29	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO

0000 0104



© 2005 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 258: 105–112



TABLE 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

[illegible]



Journal of Management Education 24(1) 10-11
Copyright © 2000 Sage Publications
10.1177/1053426900240010



STUDY AS YOUR SUPERPOWER FOR 2025

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2009

NÚMERO	FOLIO	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MAYOR CONTRATADO TOTAL	MENOR CONTRATADO EJECUCIÓN 2003	EJECUCIÓN	ANTICIPA		ORDEN DE PAGO MONTO			ORDEN DE PAGO		AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO	TERMINO				ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	PAGAR	EN TRÁMITE	PAGAR			EN TRÁMITE
77	DOCCOP-06-L-4-103-20	CHIHUAHUA	OROS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INFORMACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS "PLAZAS VARIAS"), UBICADO EN CALLE CORDOBA VALERIANO EN COLONIA BARRIOS Y BARRIOS, ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-ago-20	26-ago-20	\$3,294,060.10	\$3,294,060.10	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$3,294,060.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINQUITO
78	DOCCOP-LPN-L-4-104-20	CHIHUAHUA	PROYECTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INFORMACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS "PLAZAS VARIAS"), UBICADO EN FRONTERA DE TIERRAS LIBERTAD EN CALLE HERRERA EN COLONIA CALLE A BARRIOS, COLONIA SAN BARRIOS, COATEPEC, ALCALDIA LA MADONNA, COATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-20	13-nov-20	\$5,720,618.03	\$5,720,618.03	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$5,826,618.57	\$0.00	100.00%	98.36%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINQUITO
79	DOCCOP-LPN-L-4-107-20	CHIHUAHUA	PROYECTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA, HERRAJERÍA, PLUMBADERÍA Y OBRERÍA DE RED PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CARRANZA" DE MATERIAL DE GUERRA, AL INTERIOR DEL ANILLO DESEMOCINADO "CARRANZA" EN CALLE AVENIDA SANCTO DE GUERRA NO. 100, DEL PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	9-dic-20	\$15,150,005.02	\$15,150,005.02	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$13,019,119.83	\$0.00	100.00%	85.97%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINQUITO
80	DOCCOP-AD-L-4-108-20	CHIHUAHUA	PROYECTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASISTENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INFORMACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS "PLAZAS VARIAS"), UBICADO EN FRONTERA DE TIERRAS LIBERTAD EN CALLE HERRERA EN COLONIA CALLE A BARRIOS, COATEPEC, ALCALDIA LA MADONNA, COATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	7-ago-21	\$1,388,540.48	\$1,388,540.48	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$1,377,327.58	\$0.00	100.00%	98.45%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2003-2021)	
81	DOCCOP-LPN-L-4-109-20	CHIHUAHUA	PROYECTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA, HERRAJERÍA, PLUMBADERÍA Y OBRERÍA DE RED PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CARRANZA" DE MATERIAL DE GUERRA, AL INTERIOR DEL ANILLO DESEMOCINADO "CARRANZA" EN CALLE AVENIDA SANCTO DE GUERRA NO. 100, DEL PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-ago-20	31-dic-20	\$15,312,777.46	\$15,312,777.46	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$15,280,038.39	\$0.00	100.00%	98.46%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINQUITO
82	DOCCOP-06-L-4-103-20	CHIHUAHUA	OROS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INFORMACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS "PLAZAS VARIAS"), UBICADO EN CALLE CORDOBA VALERIANO EN COLONIA BARRIOS Y BARRIOS, ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-ago-20	26-ago-20	\$3,742,898.27	\$3,742,898.27	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$3,742,898.27	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINQUITO
83	DOCCOP-06-L-4-103-20	CHIHUAHUA	OROS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INFORMACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS "PLAZAS VARIAS"), UBICADO EN CALLE CORDOBA VALERIANO EN COLONIA BARRIOS Y BARRIOS, ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-ago-20	23-ago-20	\$5,431,886.77	\$5,431,886.77	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$5,431,886.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINQUITO
84	DOCCOP-AD-L-4-103-20	CHIHUAHUA	PROYECTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASISTENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INFORMACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS "PLAZAS VARIAS"), UBICADO EN FRONTERA DE TIERRAS LIBERTAD EN CALLE HERRERA EN COLONIA CALLE A BARRIOS, COATEPEC, ALCALDIA LA MADONNA, COATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	16-ago-20	\$625,333.28	\$625,333.28	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$625,333.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINQUITO
85	DOCCOP-LPN-L-4-105-20	CHIHUAHUA	PROYECTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INFORMACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS "PLAZAS VARIAS"), UBICADO EN CALLE CORDOBA VALERIANO EN COLONIA CALLE A BARRIOS, COLONIA SAN BARRIOS, COATEPEC, ALCALDIA LA MADONNA, COATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-ago-20	15-dic-20	\$5,244,274.81	\$5,244,274.81	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$5,180,055.04	\$0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINQUITO
86	DOCCOP-06-L-4-103-20	CHIHUAHUA	OROS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INFORMACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS "PLAZAS VARIAS"), UBICADO EN CALLE CORDOBA VALERIANO EN COLONIA BARRIOS Y BARRIOS, ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-ago-20	16-dic-20	\$5,980,447.81	\$5,980,447.81	0.00	ANTICIPA	NO	ORDEN	TERMINO	ORDEN	ORDEN	\$6,940,758.94	\$0.00	100.00%	99.54%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINQUITO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



CHILE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.O.	MANEJO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CANCELADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CANTIDAD (PROMEDIO MENSUAL)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Anticipos	Anticipos	MEDIO	TERCERO	MENSUAL	ESTIMADA	EN VALOR	PROG.	FINANC.	
67	DOCOF-LPNL-4-159-20	000429	L.P.R.	REMEDIACIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE MANEJO, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANEAS COMAHUACAN", UBICADO EN CALLE COMAHUACAN S/N COLONIA PERDÓN DE LOS BARCOS, ALCALDÍA JESÚS MARÍA CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	10-dic-20	\$5,512,888.84	\$5,512,888.84	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$5,714,258.62	\$0.00	100.00%	88.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
68	DOCOF-LPNL-4-170-20	000429	L.P.R.	VALPER PLANEACIÓN E INGENIERÍA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE MANEJO, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANEAS SAN LORENZO TLAZITZAPÁN", UBICADO EN FRACCION 281, TERMINO EN CALLE CONSTRUCCIÓN SAN COLONIA SAN LORENZO TLAZITZAPÁN, ALCALDÍA SAN JUAN, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	10-dic-20	\$0,590,000.07	\$0,590,000.07	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0,640,890.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
69	DOCOF-BUL-4-171-20	000429	AD	INVERSIÓN AGUAS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE MANEJO, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANEAS (MAYAN) SANTA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 91, COLONIA TABAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	10-dic-20	\$5,107,590.48	\$5,107,590.48	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$5,107,590.48	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
70	DOCOF-AD-4-172-20	000429	AD	CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS DRYN S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS "ALUMBRADO AMBIENTADO", UBICADO EN TOLCATEPEC SAN COL. SANTA TERESA, C.P. 68000, ALCALDÍA GUAYMAS, EN ESTADO DE SONORA. 2) CENTRO DE USO DE USO DE USO, UBICADO EN ROSA BLANCA SAN COL. MEXICO DE ROSA, C.P. 68000, ALCALDÍA GUAYMAS, EN ESTADO DE SONORA.	12-ago-20	10-sep-20	\$1,864,000.74	\$1,864,000.74	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,864,000.74	\$0.00	100.00%	89.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
71	DOCOF-LPNL-4-173-20	000429	L.P.R.	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ACABADOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE MANEJO, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANEAS LOMA DE SAN LORENZO", UBICADO EN CALLE LOMA DE SAN LORENZO 10, COLONIA LOMA DE SAN LORENZO, ALCALDÍA TLAZITZAPÁN, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	10-sep-20	\$3,437,342.19	\$3,437,342.19	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$3,344,533.95	\$0.00	100.00%	87.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
72	DOCOF-AD-4-174-20	000429	AD	REHABILITACIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA REHABILITACIÓN DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN PLANEAS (MAYAN) SANTA", UBICADO EN FRACCION DEL TERMINO EN CALLE ANDREA DEL CASTAÑO SAN JUAN, CALLE SAN JUAN, AGUAS Y CONSTRUCCIÓN Y AVANCE RECONSTRUCCIÓN, CIUDAD SANTA MARÍA NOGUAYAL, ALCALDÍA SANTA MARÍA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-ago-20	10-sep-20	\$527,300.82	\$527,300.82	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$527,300.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
73	DOCOF-LPNL-4-175-20	000429	L.P.R.	CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS "ALUMBRADO AMBIENTADO", UBICADO EN CALLE ORIENTE 91, COLONIA TABAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. 2) CENTRO DE USO DE USO DE USO, UBICADO EN ROSA BLANCA SAN COL. MEXICO DE ROSA, C.P. 68000, ALCALDÍA GUAYMAS, EN ESTADO DE SONORA.	17-ago-20	10-sep-20	\$19,898,588.82	\$19,898,588.82	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$17,111,087.71	\$0.00	100.00%	88.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
74	DOCOF-LPNL-4-183-20	000429	L.P.R.	CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE MANEJO, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANEAS (MAYAN) SANTA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 91, COLONIA TABAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA.	10-ago-20	10-dic-20	\$2,883,529.54	\$2,883,529.54	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$4,708,822.80	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
75	DOCOF-AD-4-184-20	000429	AD	CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS "ALUMBRADO AMBIENTADO", UBICADO EN CALLE ORIENTE 91, COLONIA TABAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. 2) CENTRO DE USO DE USO DE USO, UBICADO EN ROSA BLANCA SAN COL. MEXICO DE ROSA, C.P. 68000, ALCALDÍA GUAYMAS, EN ESTADO DE SONORA.	10-ago-20	10-sep-20	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,707,222.08	\$1,834.29	100.00%	88.88%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
76	DOCOF-BUL-4-185-20	000429	AD	GRUPO CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ATENCIÓN ELECTRÓNICA REFORMA EN MEDIO URBANO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE MANEJO, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEAS) "PLANEAS (MAYAN) SANTA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 91, COLONIA TABAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA.	10-ago-20	10-sep-20	\$1,819,236.15	\$1,819,236.15	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,819,236.15	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO



© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–401



SCHEFFÉ JA. 2010. THE HYPOTHESIS OF THE JUNGLE.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2006[illegible]

- 000 0198



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



DIAGRAMA DE GANTT

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NOMBRE	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercido 2020	ECONOMÍA	AVANCE		GRÁFICO (PERCENTAJES)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Anticipos	Anticipos	Inicio	Termino	Fin	Presupuesto	Estimado	Presupuesto	Financiado	
108	DOCCOP-PLN-4-220-20	000000	L.P.R.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "COMPLEJO SAN FRANCISCO TULAMPATLA", UBICADO EN LA SUBSECCIÓN NO. 10, COLONIA SAN FRANCISCO TULAMPATLA, ALCALDÍA ACAPULCO, C.P. 76000, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-20	31-dic-20	\$10,384,051.88	\$10,384,051.88	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$10,384,051.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
107	DOCCOP-AD-4-220-20	000000	A.C.	GUARTEL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLACES PROGRESO NACIONAL", UBICADO EN AVENIDA LOS REYES ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUAYMAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$11,373,000.20	\$11,373,000.20	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$11,373,000.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
106	DOCCOP-PLN-4-220-2020	000000	L.P.R.	GRUPO RECURSOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLACES SANTA MARIA TULAMPATLA", UBICADO EN CALLE CAROLINA, EN CALONIA GUAYMAS (CALLE NACIONAL) COLONIA SANTA MARIA TULAMPATLA, ALCALDÍA TULAMPATLA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-20	31-dic-20	\$8,710,253.76	\$8,710,253.76	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$8,710,253.76	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
105	DOCCOP-AD-4-220-20	000000	A.C.	GRUPO CONSTRUCCIÓN (SANTO) S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLACES SAN LORENZO", UBICADO EN FRONTERA DEL TERRAZO EN CALLE AVENIDA LOS REYES ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA ACAPULCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$2,780,325.58	\$2,780,325.58	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$2,780,325.58	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
104	DOCCOP-PL-4-220-20	000000	10	GRUPO DESARROLLOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLACES TULAMPATLA", UBICADO EN CALLE TULAMPATLA, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA ACAPULCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$8,817,312.60	\$8,817,312.60	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$8,817,312.60	\$0.00	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
103	DOCCOP-PL-4-220-20	000000	10	GRUPO DESARROLLOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLACES AVENIDA SAN A LA VENTA", UBICADO EN AVENIDA SAN A LA VENTA, COLONIA AVENIDA MARTINEZ, ALCALDÍA ACAPULCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$8,817,312.60	\$8,817,312.60	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$8,817,312.60	\$0.00	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
102	DOCCOP-AD-4-220-20	000000	A.C.	GRUPO CONSTRUCCIÓN (SANTO) S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLACES GUAYMAS DE GUAYMAS", UBICADO EN FRONTERA DEL TERRAZO GUAYMAS EN AVENIDA CENTINARA SAN FRANCISCO, CON CALLE PUNTO DE VISTA, COLONIA SAN FRANCISCO DE GUAYMAS, ALCALDÍA ACAPULCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$7,380,802.25	\$7,380,802.25	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$7,380,802.25	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
101	DOCCOP-AD-4-220-20	000000	A.C.	PROYECTOS DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLACES ALFONSO PRIMA", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIMA EN CALONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA ACAPULCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$357,983.70	\$357,983.70	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$357,983.70	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
100	DOCCOP-PL-4-220-20	000000	10	FORUM FORALTA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLACES LA ESTIMACIÓN", UBICADO EN CALLE CAROLINA, EN CALONIA GUAYMAS (CALLE NACIONAL) COLONIA SANTA MARIA TULAMPATLA, ALCALDÍA TULAMPATLA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$2,358,759.48	\$2,358,759.48	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$2,358,759.48	\$0.00	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
99	DOCCOP-AD-4-220-20	000000	A.C.	DELETTAMP PROYECTOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLACES DE GUAYMAS", UBICADO EN CALLE CAROLINA A VIAL AL CALONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA ACAPULCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$337,406.87	\$337,406.87	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$337,406.87	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
98	DOCCOP-AD-4-220-20	000000	A.C.	TALIER S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLACES DE SANTA JUANA", UBICADO EN CALLE CAROLINA EN CALONIA PROGRESO DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA ACAPULCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$386,171.42	\$386,171.42	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$386,171.42	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
97	DOCCOP-PL-4-220-20	000000	10	GRUPO CONSTRUCCIÓN (SANTO) S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLACES SAN JUAN TULAMPATLA", UBICADO EN CALLE CAROLINA EN CALONIA GUAYMAS (CALLE NACIONAL) COLONIA SANTA MARIA TULAMPATLA, ALCALDÍA TULAMPATLA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-dic-20	\$782,240.58	\$782,240.58	0.00	Anticipos	NA	NA	NA	NA	\$782,240.58	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO



INTERNET-RELATED SERVICE PROVIDERS
 PROVIDING ACCESS TO ONLINE CONTENT



© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 459–467

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
E SERVICIO 2009

NÚMERO	FOLIO	ACORDADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJECUCION 2020	EJECUCION	ANTICIPOS		CANTIDAD PERIODOS MENS			ESTIMACIÓN		AVANCE		SITUACIONES
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	NETO	BRUTO	TERMINO	NETO	TERMINO	FINANCIERO		
118	DOCCOP-AD-L-3-236-20	UNAHU	A.C.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y AMBIENTE PLAZAS SANITARIAS, UBICADO EN AVILA NATURAL, PROTECTORA MONTAÑA DE GUAYATEPE, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	9-oct-20	25-oct-20	\$1,748,364.74	\$1,748,364.74	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,748,364.72	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								
119	DOCCOP-AD-L-3-242-20	UNAHU	S. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y AMBIENTE PLAZAS SANITARIAS, UBICADO EN AVILA NATURAL, PROTECTORA MONTAÑA DE GUAYATEPE, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	14-oct-20	25-feb-21	\$0,006,489.16	\$0,006,489.16	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0,006,489.14	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								
120	DOCCOP-AD-L-3-241-20	UNAHU	S. DE C.V.	CONTINUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DISEÑO DE ACCESOS DESTRUCTURALES PARA EL RECONSTRUYENDO DEL MUNICIPIO PARA LA UNIVERSIDAD AGROPECUARIA ALTA, UBICADA EN CALLE VERACRUZ Y SAN JOSE, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	21-oct-20	23-oct-20	\$1,709,279.37	\$1,709,279.37	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,709,279.36	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								
121	DOCCOP-AD-L-1-242-20	UNAHU	S. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y AMBIENTE PLAZAS SANITARIAS, UBICADO EN CALLE AMADOR PRINCIPAL, EN COLUMNA TERRA UNICA, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	16-oct-20	11-feb-21	\$11,390,522.69	\$11,390,522.69	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0,687,151.46	\$0.00	100.00%	91.80%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								
122	DOCCOP-RL-L-3-243-20	UNAHU	S. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAJOR Y MENOR PARA EL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DEL OESTE, UBICADO EN AVILA NATURAL, PROTECTORA MONTAÑA DE GUAYATEPE, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	26-oct-20	30-jun-21	\$1,033,773.72	\$1,033,773.72	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$267,568.36	\$0.00	56.20%	85.95%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								
123	DOCCOP-RL-L-3-244-20	UNAHU	S. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAJOR Y MENOR PARA EL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DEL OESTE, UBICADO EN AVILA NATURAL, PROTECTORA MONTAÑA DE GUAYATEPE, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	30-oct-20	28-mar-21	\$2,741,272.56	\$2,741,272.56	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,044,877.51	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								
124	DOCCOP-RL-L-3-247-20	UNAHU	S. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y AMBIENTE PLAZAS SANITARIAS, UBICADO EN CALLE GUAYATEPE SAN JOSE, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	21-oct-20	18-mar-21	\$5,558,160.41	\$5,558,160.41	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$2,481,882.70	\$0.00	100.00%	88.80%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								
125	DOCCOP-RL-L-3-249-20	UNAHU	S. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y AMBIENTE PLAZAS SANITARIAS, UBICADO EN CALLE GUAYATEPE SAN JOSE, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	21-oct-20	18-mar-21	\$7,009,620.71	\$7,009,620.71	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$6,260,782.34	\$0.00	100.00%	90.60%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								
126	DOCCOP-RL-L-3-246-20	UNAHU	S. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAJOR Y MENOR PARA EL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DEL OESTE, UBICADO EN AVILA NATURAL, PROTECTORA MONTAÑA DE GUAYATEPE, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	21-oct-20	28-dic-20	\$442,516.48	\$442,516.48	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$442,516.48	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								
127	DOCCOP-RL-L-3-250-20	UNAHU	S. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAJOR Y MENOR PARA EL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DEL OESTE, UBICADO EN AVILA NATURAL, PROTECTORA MONTAÑA DE GUAYATEPE, COLUMNA ADMINISTRATIVA ALCALDIA GUAYATEPE Y MUNICIPIO, ESTADO DE MEXICO	21-oct-20	18-mar-21	\$3,297,106.78	\$3,297,106.78	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$2,907,695.37	\$0.00	100.00%	86.10%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
										ANTICIPOS	NA								
										ANTICIPOS	NA								

2-000-0110



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO	NÚMERO	C.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTA CONTRATO TOTAL	MONTA CONTRATO EJECUTADO	PORCENTAJE	ANTICIPA		EJECUCIÓN (PERÍODO ANTES)			EJECUCIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	ANTICIPA	INICIO	TERMINO	AVANCE	INICIO	TERMINO	AVANCE	FINANCIADO	
128	DOCCOP-AD-L-3-291-20	100000	40	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-sep-20	30-sep-21	\$1,884,048.38	\$1,884,048.38	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,884,048.38	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
128	DOCCOP-PL-L-8-252-20	100000	18	GRUPO PLUMBAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-20	30-sep-21	\$2,480,111.32	\$2,480,111.32	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$2,480,111.32	\$0.00	100.00%	98.18%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
128	DOCCOP-AD-L-4-295-20	100000	40	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-sep-20	30-sep-21	\$1,481,713.32	\$1,481,713.32	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,481,713.32	\$0.00	100.00%	98.38%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
128	DOCCOP-PL-L-5-293-20	100000	18	GRUPO PLUMBAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-20	30-sep-21	\$3,471,635.01	\$3,471,635.01	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$3,471,635.01	\$0.00	100.00%	87.18%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
128	DOCCOP-PL-L-4-291-20	100000	18	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-20	30-sep-21	\$5,904,568.74	\$5,904,568.74	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$5,904,568.74	\$0.00	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
128	DOCCOP-AD-L-4-295-20	100000	40	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-sep-20	30-sep-21	\$6,534,568.00	\$6,534,568.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$6,534,568.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
128	DOCCOP-AD-L-3-298-20	100000	40	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-20	30-sep-21	\$1,778,285.51	\$1,778,285.51	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,778,285.51	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
128	DOCCOP-PL-L-4-293-20	100000	18	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-20	30-sep-21	\$5,796,888.71	\$5,796,888.71	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$5,796,888.71	\$0.00	100.00%	90.24%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
128	DOCCOP-PL-L-4-275-20	100000	18	GRUPO PLUMBAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-sep-20	30-sep-21	\$1,188,832.71	\$1,188,832.71	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,188,832.71	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
128	DOCCOP-PL-L-4-311-20	100000	18	GRUPO PLUMBAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, INGENIERÍA Y DE MONITORIO DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLUMBAS (PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y MADERA) EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-20	30-sep-21	\$3,478,055.38	\$3,478,055.38	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$3,478,055.38	\$0.00	100.00%	78.28%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)

0000 0111



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Departamento Científico de Oceanografía y Recursos Acuáticos
Caracas, Venezuela



STUDIES IN THE HISTORY OF THE

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJECUCIÓN 2008[illegible]

000 0112



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Calle de la Universidad 1000, Toluca, México



BOLETA N. 3028 SEPTIEMBRE DE 2021

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

ORDEN	CONCEPTO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	ECUACIÓN	ANTICIPOS		CONTRIBUCIÓN FINANCIERA			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	PARCIAL	EN VALOR	FINANCIAL	EN VALORES	
188	DOCCOPAD-L-9-284-20	10/04/20	4.2	FRANCISCO ARDO ARRIAGA S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE DOCTOR AMORIN NO. 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-03-20	29-04-20	\$1,287,177.86	\$1,287,177.86	0.00	INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	\$1,287,177.86	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
189	DOCCOPAD-L-9-285-20	10/04/20	4.2	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE DOCTOR AMORIN NO. 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-03-20	27-04-20	\$677,442.81	\$677,442.81	0.00	INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	\$677,442.81	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
191	DOCCOPAD-L-9-286-20	10/04/20	4.2	MADE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE DOCTOR AMORIN NO. 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-03-20	25-04-20	\$1,803,883.40	\$1,803,883.40	0.00	INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	\$1,803,883.40	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
192	DOCCOPAD-L-9-289-20	10/04/20	1.8	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN GUAYMAS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE DOCTOR AMORIN NO. 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-03-20	13-04-20	\$6,557,340.21	\$6,557,340.21	-0.00	INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	\$0.00	\$0.00	100.00%	85.84%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
193	DOCCOPAD-L-9-292-20	10/04/20	1.8	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANUTENIMIENTO MAYOR EN MENOS PARA EL EDIFICIO 1 DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO, UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y AVENIDA FERNÁNDEZ DE ALVAREZ, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-03-20	14-04-20	\$2,588,344.89	\$2,588,344.89	0.00	INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	\$2,588,344.89	\$0.00	100.00%	85.87%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
194	DOCCOPAD-L-9-293-20	10/04/20	1.8	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE DOCTOR AMORIN NO. 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-03-20	17-04-20	\$1,960,879.54	\$1,960,879.54	0.00	INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	\$1,960,879.54	\$0.00	100.00%	78.48%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
195	DOCCOPAD-L-9-294-20	10/04/20	1.8	GRUPO CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE DOCTOR AMORIN NO. 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-03-20	21-04-20	\$3,804,798.32	\$3,804,798.32	0.00	INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	\$3,804,798.32	\$0.00	100.00%	85.87%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
196	DOCCOPAD-L-9-295-20	10/04/20	1.8	DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANUTENIMIENTO MAYOR EN MENOS PARA EL EDIFICIO 1 DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO, UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y AVENIDA FERNÁNDEZ DE ALVAREZ, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-03-20	21-04-20	\$6,284,722.97	\$6,284,722.97	0.00	INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	\$0.00	\$2,340,174.45	100.00%	87.38%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
197	DOCCOPAD-L-9-297-20	10/04/20	1.8	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE DOCTOR AMORIN NO. 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-01-20	25-04-21	\$11,400,059.88	\$11,400,059.88	0.00	INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	\$11,400,059.88	\$0.00	100.00%	80.71%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)



INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS
 LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO



1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

INFORME DE RYANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2002

CANT	NOMBRE CONTRATO	E.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATO TOTAL	MONTO CONTRATO EJECUCION 2020	EJECUCION	AVANCE		CONCRETO (PERIODO/MONTO)			ESTIMACION		NOMBRE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PROGRESO	EN MONTO	PROG.	TRANSACCIONES			
108	DOCCOP-RL-4-208-20	LOCALIZ	1A	ALUMBA SOLAR ESPINOSA ASESORIO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS INNOVACION COAPA), UBICADO EN AVILA PEREZOSI BRUNYEROS ADRIAN LOPEZ MARTIN SA, CIUDAD DE MEXICO, CDMX, ALCALDIA SOCORRICO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-oct-20	14-nov-21	\$9,620,436.97	\$9,620,436.97	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	80.20%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
109	DOCCOP-RL-4-209-20	LOCALIZ	1A	GRUPO QUINIA S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS INNOVACION COAPA), UBICADO EN AVILA PEREZOSI BRUNYEROS ADRIAN LOPEZ MARTIN SA, CIUDAD DE MEXICO, CDMX, ALCALDIA SOCORRICO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-oct-20	17-dic-20	\$994,472.57	\$994,472.57	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUIT ADMINISTRATIVO	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
110	DOCCOP-RL-4-210-20	LOCALIZ	1A	INICIO INNOVACION Y CONSTRUCCION ES.S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS INNOVACION COAPA), UBICADO EN AVILA PEREZOSI BRUNYEROS ADRIAN LOPEZ MARTIN SA, CIUDAD DE MEXICO, CDMX, ALCALDIA SOCORRICO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-oct-20	17-dic-20	\$890,633.46	\$890,633.46	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUIT ADMINISTRATIVO	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
111	DOCCOP-RL-4-1-203-20	LOCALIZ	1A	AM COMF. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS INNOVACION COAPA), UBICADO EN AVILA PEREZOSI BRUNYEROS ADRIAN LOPEZ MARTIN SA, CIUDAD DE MEXICO, CDMX, ALCALDIA SOCORRICO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-oct-20	3-nov-21	\$1,746,735.08	\$1,746,735.08	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	20.20%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
112	DOCCOP-RL-4-4-204-20	LOCALIZ	1A	UNION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS INNOVACION COAPA), UBICADO EN AVILA PEREZOSI BRUNYEROS ADRIAN LOPEZ MARTIN SA, CIUDAD DE MEXICO, CDMX, ALCALDIA SOCORRICO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-oct-20	13-nov-21	\$22,379,533.00	\$22,379,533.00	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	27.20%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
113	DOCCOP-AD-4-3-205-20	LOCALIZ	A.C.	OBRA INFERIOR S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL SECTOR II DE LA SANITARIAS DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, EN EL SECTOR DEL BARRIO DE GUERRA MILITAR, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-sep-20	21-nov-20	\$1,862,433.91	\$1,862,433.91	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUIT ADMINISTRATIVO	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
114	DOCCOP-AD-4-3-212-20	LOCALIZ	A.C.	UBEN, CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	REVISION RELACIONADA CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLAZAS CARIT, UBICADO EN CALLE PUEBLO SAN JERONIMO, SECTOR ALCALDIA SOCORRICO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	10-nov-20	\$494,295.18	\$494,295.18	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUIT ADMINISTRATIVO	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
115	DOCCOP-RL-4-3-214-20	LOCALIZ	1A	APCA CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS INNOVACION COAPA), UBICADO EN AVILA PEREZOSI BRUNYEROS ADRIAN LOPEZ MARTIN SA, CIUDAD DE MEXICO, CDMX, ALCALDIA SOCORRICO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-sep-20	16-nov-20	\$1,194,848.96	\$1,194,848.96	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUIT ADMINISTRATIVO	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
116	DOCCOP-RL-4-1-315-20	LOCALIZ	1A	MEPES DE CONSTRUCCION (S) S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS INNOVACION COAPA), UBICADO EN CALLE FLORES MAGON SA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-sep-20	20-nov-21	\$13,085,338.85	\$13,085,338.85	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	70.19%	EN PROCESO DE FINQUIT ADMINISTRATIVO	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
117	DOCCOP-AD-4-1-317-20	LOCALIZ	A.C.	INACEL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS, PLAZAS INNOVACION COAPA), UBICADO EN CALLE FLORES MAGON SA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-sep-20	16-nov-21	\$10,028,476.44	\$10,028,476.44	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	88.82%	EN PROCESO DE FINQUIT ADMINISTRATIVO	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								
118	DOCCOP-AD-4-3-320-20	LOCALIZ	A.C.	TALLER DE ARQUITECTURA JIMMY SANCHEZ S.A. DE C.V.	REVISION RELACIONADA CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLAZAS CARIT, UBICADO EN CALLE PUEBLO SAN JERONIMO, SECTOR ALCALDIA SOCORRICO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	20-nov-20	\$686,000.00	\$686,000.00	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUIT ADMINISTRATIVO	
											ACORTADO	NA								
											PARA AMORTIZAR	NA								

- 000 0114



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Ejecutado Ejercicio 2020	Ejercicio	Avance		CÓMPO: PERCENTAJE			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
					Inicio	Termino						Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
100	DOCCOP-RL-1-323-20	UDAHUE	UDAHUE	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EL DAVY" UBICADO EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$12,822,200.40	\$12,822,200.40	0.00	ANTICIPA	NA	30-09-20	27-09-21	NA	\$12,807,521.17	\$0.00	100.00%	92.88%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
101	DOCCOP-RL-1-323-20	UDAHUE	UDAHUE	TRABAJO DE IMPLANTACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EL DAVY" UBICADO EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$7,180,700.38	\$7,180,700.38	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$7,133,750.74	\$0.00	100.00%	95.94%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
102	DOCCOP-RL-1-323-20	UDAHUE	UDAHUE	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANO DE ALICATA (PLANOS DE ALICATA) UBICADO EN FRACCION DE TERRENO EN AVENIDA REFORMA, AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE DE ALICATA, COLONIA SAN LORENZO, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$557,304.30	\$557,304.30	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$557,304.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
103	DOCCOP-RL-1-323-20	UDAHUE	UDAHUE	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EL DAVY" UBICADO EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$11,285,348.28	\$11,285,348.28	0.00	ANTICIPA	NA	27-09-20	26-09-21	\$2,754,510.52	\$11,853,884.27	\$0.00	100.00%	84.37%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
104	DOCCOP-RL-1-323-20	UDAHUE	UDAHUE	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EL DAVY" UBICADO EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$12,413,063.38	\$12,413,063.38	0.00	ANTICIPA	NA	30-09-20	27-09-21	NA	\$12,437,101.02	\$0.00	100.00%	80.47%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
105	DOCCOP-RL-1-323-20	UDAHUE	UDAHUE	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EL DAVY" UBICADO EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$1,034,361.53	\$1,034,361.53	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,034,361.53	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
106	DOCCOP-RL-1-341-20	UDAHUE	UDAHUE	TRABAJO DE AFITAMIENTOS, DEMARCACIONES Y BARRERAS DEL EDIFICIO N° 1 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-09-20	26-09-21	\$448,983.45	\$448,983.45	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$448,983.45	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
107	DOCCOP-RL-1-341-20	UDAHUE	UDAHUE	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EL DAVY" UBICADO EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$12,791,842.12	\$12,791,842.12	0.00	ANTICIPA	NA	30-09-20	27-09-21	\$2,134,952.52	\$13,880,038.47	\$0.00	100.00%	87.98%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
108	DOCCOP-RL-1-341-20	UDAHUE	UDAHUE	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EL DAVY" UBICADO EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$12,791,842.12	\$12,791,842.12	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$12,791,842.12	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
109	DOCCOP-RL-1-341-20	UDAHUE	UDAHUE	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EL DAVY" UBICADO EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$12,791,842.12	\$12,791,842.12	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$12,791,842.12	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO
110	DOCCOP-RL-1-341-20	UDAHUE	UDAHUE	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EL DAVY" UBICADO EN CALLE EL DAVY N° 10, COLONIA EL DAVY, ALCALDIA TLAHUACALCATEPEC, ESTADO DE OAXACA, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-09-20	29-09-21	\$12,791,842.12	\$12,791,842.12	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$12,791,842.12	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGADO ADMINISTRATIVO

0000 0115



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CONTI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJECUTADO-HA	ECONOMÍA	ANTICIPO		CANTIDAD (PERÍODO-MONTO)			ESTRATIFICACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	HA	MONTO	TERMINO	MONTO	FINANCIADA	ESTIMADA	FINANCIADA	ESTIMADA	
176	DOCCOP-AD-L-3-813-20	LOCALIZ	A.O.	INVERSA INTERNACIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL SISTEMA ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO TURNO COPACOT, UNIDAD EN CALLE GUAYOLLO BLANCO SIN VIGILANCIA MONITOREO PARA CDS, CERRILLO EL ALTO, ALICORNIO OCHOA/AMÉN (CERCA DE MÉXICO), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-mar-20	24-mar-20	\$112,987.92	\$112,987.92	0.00	ANTICIPO	HA	NA	NA	NA	\$112,987.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
186	DOCCOP-AD-L-3-849-20	LOCALIZ	A.O.	INVERSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MONITOREO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO TURNO COPACOT, UNIDAD EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR SIN VIGILANCIA MONITOREO PARA CDS, CERRILLO EL ALTO, ALICORNIO OCHOA/AMÉN (CERCA DE MÉXICO), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-20	29-mar-20	\$1,863,991.89	\$1,863,991.89	0.00	ANTICIPO	HA	NA	NA	NA	\$1,863,991.89	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
187	DOCCOP-AD-L-3-890-20	LOCALIZ	A.O.	INVERSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ANEXOS DE LA FANAL DE INSERCIÓN ESTADÍSTICA CENTRAL, UNIDAD EN AV. JARDINES CO. DEL GAS ALICORNIO ACCIDENTAL, C.F. OCHO EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-20	19-mar-20	\$9,994,852.00	\$9,994,852.00	0.00	ANTICIPO	HA	NA	NA	NA	\$9,994,852.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
188	DOCCOP-AD-L-1-957-20	LOCALIZ	A.O.	INVERSA Y CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL PARA LA GUARDIA NACIONAL, UNIDAD EN AV. JARDINES PARAINTERIOR PRECISO ALICORNIO KM 14.5 DEL 2000 INGENIERA ALICORNIO TURNO, CERRILLO EL ALTO, ALICORNIO OCHOA/AMÉN (CERCA DE MÉXICO), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-mar-20	21-mar-20	\$1,748,637.41	\$1,748,637.41	0.00	ANTICIPO	HA	NA	NA	NA	\$1,748,637.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPO
\$18,297,711.11	0.00	0.00
		NAUTICIA 0.00
		FOR MENTON 0.00

TOTAL DE EJECUCIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
FINANCIADA	EN TRÁMITE	FINANCIADA	FINANCIADA
\$17,696,343.32	\$1,284,852.92	86.22%	86.22%

AND CARLOS AGUIRRE GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

AND CARLOS AGUIRRE GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

0000 0116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	35	3	0	11	27	11	27	0
TOTAL	35	3	0	11	27	11	27	0

NOTA: Ninguno de los contratos vigentes en el ejercicio, se encuentra en procedimiento Jurídico


HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

000 0117

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NÚMERO	P. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERÍODO - MONTO			DETALLACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
									PERÍODO	PERÍODO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PERÍODO	FINANCIERO		SI	NO	
1	SECOPIAD-1-004-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE REVER SOBRE PASOS DE LA REFORMA PARA UNO DE LOS AUTOMÓVILES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBUS	1,366,714.60	1,366,714.60	018-002-28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.		X	Trabajo concluido, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.
2	SECOPIAD-1-005-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicada en Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tepic, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	1,854,241.75	1,854,241.75	018-002-28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			401,960.44	\$ 2,256,147.98	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.		X	Trabajo concluido, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.
3	SECOPIAD-1-006-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ASOCIACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN (A-57A, DE) CORREDORES INSURGENTES LÍNEA 1.	13,861,898.75	13,861,898.75	011-004-24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 12,950,208.11	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.		X	Trabajo concluido, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.
4	SECOPIAD-1-007-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADA EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAQUEPA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	30,914,749.42	30,914,749.42	018-002-28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			12,036,400.00	\$ 52,232,834.71	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.		X	Trabajo concluido, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.
5	SECOPIAD-1-008-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS BÁSICAS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, UTEACALCO, UTEAPALAPA, MILPA ALTA, TLAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, TLAXIAC, XOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71	018-002-28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 22,117,142.75	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.		X	Trabajo concluido, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.
6	SECOPIAD-1-009-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS BÁSICAS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, UTEACALCO, UTEAPALAPA, MILPA ALTA, TLAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, TLAXIAC, XOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71	018-002-28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 22,117,142.75	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.		X	Trabajo concluido, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.
7	SECOPIAD-1-010-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS BÁSICAS EN LAS ALCALDÍAS ACCIPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, UTEACALCO, UTEAPALAPA, MILPA ALTA, TLAPALAPA, TLAXIAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	1,849,071.38	1,849,071.38	753.854.93	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,849,348.18	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.		X	Trabajo concluido, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.
8	SECOPIAD-1-011-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS BÁSICAS EN LAS ALCALDÍAS ACCIPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, UTEACALCO, UTEAPALAPA, MILPA ALTA, TLAPALAPA, TLAXIAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	1,849,071.38	1,849,071.38	753.854.93	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,849,348.18	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.		X	Trabajo concluido, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.
9	SECOPIAD-1-012-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vencedor en Vía de obra.	753,854.93	753,854.93	0.01	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 753,854.92	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.		X	Trabajo concluido, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recuperación.
10	SECOPIAD-1-013-20	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA EL VENCEDOR	83,966,472.61	83,966,472.61	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 83,966,472.61	0.00	81.30%	100.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NÚMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPO	GUBERNO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
									INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO		SI	NO	
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	3,976,754.78	3,258,100.46						3,258,100.46	3.88						
9	DOCCOP-AL-2-010-21	RENTAS	RENTAS	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alcaldía Alvaro Obregón	3,976,754.78	2,258,100.46	0.00	ANTICIPO			0.00	\$ 3,258,100.46	\$ -	60.00%	100.00%	Sept-21	X		SERVICIO PROYECTO CONTRATO MULTIANUAL
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Alemán (Paquete 1)	5,448,193.57	5,448,193.57		AMORTUADO			0.00								
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Alemán (Paquete 2)	5,448,193.57	5,448,193.57		POR AMORTIZAR			0.00								
10	DOCCOP-AL-2-020-21	PAGARÉ	RENTAS	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Alemán (Paquete 1)	5,448,193.57	5,448,193.57	0.00	ANTICIPO			0.00	\$ 5,448,193.57	\$ -	100.00%	100.00%	Sept-21	X		Trabajo concluido en proceso de entrega-recepción para Entrega-Recepción
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64		AMORTUADO			0.00								
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64		POR AMORTIZAR			0.00								
11	DOCCOP-AL-5-040-20	PAGARÉ	RENTAS	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, refortalecimiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64	16.46	ANTICIPO			0.00	\$ 1,849,377.18	\$ -	100.00%	100.00%	Sept-21	X		Servicio concluido, en proceso de entrega-recepción para Entrega-Recepción
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64		AMORTUADO			0.00								
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64		POR AMORTIZAR			0.00								
12	DOCCOP-AL-5-050-20	PAGARÉ	RENTAS	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, refortalecimiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,849,395.64	1,849,395.64	10.162.26	ANTICIPO			0.00	\$ 1,835,845.51	\$ -	100.00%	100.00%	Sept-21	X		Servicio concluido, en proceso de entrega-recepción para Entrega-Recepción
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,849,395.64	1,849,395.64		AMORTUADO			0.00								
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,849,395.64	1,849,395.64		POR AMORTIZAR			0.00								
13	DOCCOP-AL-5-060-20	PAGARÉ	RENTAS	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, refortalecimiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,849,395.64	1,849,395.64	10.871.78	ANTICIPO			0.00	\$ 1,832,583.82	\$ -	100.00%	100.00%	Sept-21	X		Trabajo concluido, en proceso de entrega-recepción para Entrega-Recepción
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,849,395.64	1,849,395.64		AMORTUADO			0.00								
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,849,395.64	1,849,395.64		POR AMORTIZAR			0.00								
14	DOCCOP-AL-5-070-20	PAGARÉ	RENTAS	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Reconstrucción y refortalecimiento de dos escuelas en las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,849,734.13	1,849,734.13	0.00	ANTICIPO			0.00	\$ 1,849,734.03	\$ -	100.00%	100.00%	Sept-21	X		Trabajo concluido, en proceso de entrega-recepción para Entrega-Recepción
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,849,734.13	1,849,734.13		AMORTUADO			0.00								
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,849,734.13	1,849,734.13		POR AMORTIZAR			0.00								
15	DOCCOP-AL-5-080-20	PAGARÉ	RENTAS	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, refortalecimiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1 y 2)	1,849,773.53	1,849,773.53	16.46	ANTICIPO			0.00	\$ 1,849,755.08	\$ -	100.00%	100.00%	Sept-21	X		Trabajo concluido, en proceso de entrega-recepción para Entrega-Recepción
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1 y 2)	1,849,773.53	1,849,773.53		AMORTUADO			0.00								
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1 y 2)	1,849,773.53	1,849,773.53		POR AMORTIZAR			0.00								
16	DOCCOP-AL-5-090-20	PAGARÉ	RENTAS	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Reconstrucción y refortalecimiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 1)	1,837,094.91	1,837,094.91	4.403.82	ANTICIPO			0.00	\$ 1,532,851.28	\$ -	100.00%	100.00%	Sept-21	X		Trabajo concluido, en proceso de entrega-recepción para Entrega-Recepción
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,837,094.91	1,837,094.91		AMORTUADO			0.00								
				Proyecto Ejecutivo para la Reconstrucción, Refortalecimiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Copacelán, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquete 1)	1,837,094.91	1,837,094.91		POR AMORTIZAR			0.00								

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECUADARA	ANTICIPOS	GUBERNIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECIBIDA	COMPACTA DE ENTREGA RECIBIDA		OBSERVACIONES
									BOCO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO		SI	NO	
	CONTRATO																		
17	0000P-AD-1-5-000-20	PROCESO 111100	AGUASCALIENTES DIRECTA	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las escuelas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuernavaca, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tlalmanalco y Tlalmanalco	988,309.88	988,309.88	5.00	ANTICIPA AMORTUADO POR AMORTUADO	0.00	0.00	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Come administrativo para la Entrega Recibida		X	Trabajos concluidos en proceso de come administrativo para la Entrega Recibida
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las escuelas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuernavaca, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tlalmanalco y Tlalmanalco	19,489,922.87	19,489,922.87						23,163,420.42	0.00						
18	0000P-LPN-1-11-10-20	PROCESO 111100	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Trabajo de Construcción de Cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las escuelas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuernavaca, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tlalmanalco y Tlalmanalco	19,489,922.87	19,489,922.87	4.30	ANTICIPA AMORTUADO POR AMORTUADO	0.00	0.00	9,673,000.91	\$ 23,163,420.42	\$ -	100.00%	100.00%	24-ago-21	X		Trabajos concluidos en proceso de come administrativo para la Entrega Recibida
				Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Escuelas Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Alemán y Tlalmanalco (Papeles 10)	16,826,556.16	16,826,556.16						16,026,556.69	0.00						
19	0000P-LPN-1-1384-20	PROCESO 111100	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Escuelas Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Alemán y Tlalmanalco (Papeles 11)	16,026,556.16	16,026,556.16	6.47	ANTICIPA AMORTUADO POR AMORTUADO	0.00	0.00	0.00	\$ 16,026,556.69	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega Recibida		X	Trabajos concluidos en proceso de come administrativo para la Entrega Recibida
				Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Escuelas Álvaro Obregón y Miguel Alemán (Papeles 10)	17,892,902.91	17,892,902.91						17,881,390.99	0.00						
20	0000P-LPN-1-0385-20	PROCESO 111100	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Escuelas Álvaro Obregón y Miguel Alemán (Papeles 10)	17,892,902.91	17,892,902.91	11.11.20	ANTICIPA AMORTUADO POR AMORTUADO	0.00	0.00	0.00	\$ 17,881,390.99	\$ -	100.00%	100.00%	Come administrativo para la Entrega Recibida		X	Trabajos concluidos en proceso de come administrativo para la Entrega Recibida
				Reconstrucción del Deportivo al Vóley 2da. Etapa	8,446,827.65	8,446,827.65						8,446,235.94	0.00						
21	0000P-PL-1-021-20	PROCESO 111100	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Reconstrucción del Deportivo al Vóley 2da. Etapa	8,446,827.65	8,446,827.65	30.81	ANTICIPA AMORTUADO POR AMORTUADO	0.00	0.00	0.00	\$ 8,446,235.94	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega Recibida		X	Trabajos concluidos en proceso de come administrativo para la Entrega Recibida
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Escuelas Álvaro Obregón y Cuajimalpa (Papeles 12)	1,840,968.37	1,840,968.37						1,840,968.68	0.00						
22	0000P-AD-1-5-117-20	PROCESO 111100	AGUASCALIENTES DIRECTA	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Escuelas Álvaro Obregón y Cuajimalpa (Papeles 12)	1,840,968.37	1,840,968.37	3.66	ANTICIPA AMORTUADO POR AMORTUADO	0.00	0.00	0.00	\$ 1,840,968.68	\$ -	100.00%	100.00%	Come administrativo para la Entrega Recibida		X	Trabajos concluidos en proceso de come administrativo para la Entrega Recibida
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las escuelas Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza	12,833,379.48	12,833,379.48						12,816,898.74	0.00						
23	0000P-LPN-1-175-20	PROCESO 111100	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las escuelas Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza	12,833,379.48	12,833,379.48	29.89.74	ANTICIPA AMORTUADO POR AMORTUADO	0.00	0.00	0.00	\$ 12,816,898.74	\$ -	100.00%	100.00%	Come administrativo para la Entrega Recibida		X	Trabajos concluidos en proceso de come administrativo para la Entrega Recibida
				Proyecto integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Escuelas Álvaro Obregón y Cuajimalpa (Papeles 12)	12,932,352.96	12,932,352.96						12,932,348.07	0.00						
24	0000P-PL-1-118-20	PROCESO 111100	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Proyecto integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Escuelas Álvaro Obregón y Cuajimalpa (Papeles 12)	12,932,352.96	12,932,352.96	6.80	ANTICIPA AMORTUADO POR AMORTUADO	0.00	0.00	0.00	\$ 12,932,348.07	\$ -	100.00%	100.00%	25-ago-21	X		Trabajos concluidos en proceso de come administrativo para la Entrega Recibida

NÚMERO	F. F.	MODELO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECOSISTEMA	ANTICIPO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
									INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Alemán y Tlalmanalco. (Paquete 10 y 11).	1,849,206.91	1,849,206.91						1,841,253.62	0.00						
25	DOCOFAD-1.5-113-20	FISCALIZADOR	ALICACIÓN DIRECTA	SVR Ingeniería, S. A. de C. V.	1,849,206.91	1,849,206.91	7.001.20	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	2020-09-30	X	Se cancela el primer pago administrativo para la Entrega Recibida.
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	112,993,799.87	45,194,307.87						45,190,436.38	0.00						
26	DOCOFAD-1.5-143-20	PARTICIPACIONES DIVERSAS	SECCIÓN PÚBLICA NACIONAL	OMSA Construcción	112,993,799.87	45,194,307.87	5.071.02	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 45,190,436.38	\$ -	40.00%	100.00%	2020-09-30	X	EN PROCESO Contrato Multilateral
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	4,419,639.27	1,767,655.71						1,762,725.18	0.00						
27	DOCOFAD-1.5-175-20	PARTICIPACIONES DIVERSAS	SECCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ing. Integración	4,419,639.27	1,767,655.71	5.100.02	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	100.00%	2020-09-30	X	EN PROCESO Contrato Multilateral
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de centros para Plan Piloto de atención escolar en modalidad online a escuelas de educación básica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapototlán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuernavaca, Cuernavaca, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tlalmanalco, Tlalpala y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65						1,263,993.38	0.00						
28	DOCOFAD-1.5-201-20	FISCALIZADOR	ALICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y ORGANIZADORA EMAL S. A. DE C. V.	1,263,993.65	1,263,993.65	6.37	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,263,993.38	\$ -	100.00%	100.00%	2020-09-30	X	Se cancela el primer pago administrativo para la Entrega Recibida.
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OCULTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	6,498,693.62	6,498,693.62						6,498,693.72	0.00						
29	DOCOFAD-1.5-251-20	PARTICIPACIONES DIVERSAS	SECCIÓN PÚBLICA NACIONAL	CREDA S. A. DE C. V.	6,498,693.62	6,498,693.62	4.30	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,498,693.72	\$ -	100.00%	100.00%	2020-09-30	X	Trabajos concluidos en proceso de cancelación para la Entrega Recibida.
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS PRIMARIAS ESTADO DE NAYARIT, PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MUZA CARRERA Y PRIMARIA DÑA MARGARITA GARCÍA Y SALAZAR (PAQUETE 13).	1,854,493.91	1,854,493.91						1,854,493.94	0.00						
30	DOCOFAD-1.5-294-20	FISCALIZADOR	SECCIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAR Obras y Construcción S. A. de C. V.	1,854,493.91	1,854,493.91	6.07	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,854,493.94	\$ -	100.00%	100.00%	27-ago-21	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y Recibido. El contrato ya no se incluye en el siguiente informe.
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS PRIMARIAS ESTADO DE NAYARIT, PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MUZA CARRERA Y PRIMARIA DÑA MARGARITA GARCÍA Y SALAZAR (PAQUETE 13).	1,832,150.28	1,832,150.28						1,832,149.17	0.00						
31	DOCOFAD-1.5-296-20	FISCALIZADOR	SECCIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAR Obras y Construcción S. A. de C. V.	1,832,150.28	1,832,150.28	1.31	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,832,149.17	\$ -	100.00%	100.00%	27-ago-21	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y Recibido. El contrato ya no se incluye en el siguiente informe.
				REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PAQUETE 14).	12,746,041.89	12,746,041.89						12,565,672.57	0.00						
32	DOCOFAD-1.5-334-20	FISCALIZADOR	SECCIÓN PÚBLICA NACIONAL	SVR Ingeniería	12,746,041.89	12,746,041.89	10.100.02	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 12,565,672.57	\$ -	100.00%	100.00%	2020-09-30	X	Trabajos concluidos en proceso de cancelación para la Entrega Recibida.

FICHA DE CONTABIL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TOTAL DE ESTIMACIONES		ANEXO GENERAL AL PRESUPUESTO	
PASADAS	EN TRÁMITE	POSCO	PARACORRER
389.836.885,80	0,00	94,77%	100,00%

MTRO. EFRAÍN LÓPEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de septiembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	21	0	2	26	1	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	18	4	0	3	19	3	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	56	0	0	0	56	0	56	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	23	4	0	0	27	0	27	0
TOTAL	104	29	0	5	128	4	129	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 28 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 21 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020, 15 ESTAN CONCLUIDOS. 13 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 7 SON ADJUDICADOS EN EL 2021.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-IR-L-1-003-21, DGCOP-IR-L-1-004-21 Y DGCOP-IR-L-1-005-21, SE HAN RECEPCIONADO. SE DAN POR CONCLUIDOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	21	0	2	26	1	27	0
TOTAL	7	21	0	2	26	1	27	0

NOTA: DE LOS 28 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 7 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 21 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 15 ESTÁN CONCLUIDOS Y 13 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas

Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas "A"

Ing. Raúl Márquez Martínez

Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2011

Correspondence: maria.fernanda@unb.br

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Fecha al 30 de septiembre de 2021

ORDEN	CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	ECONOMÍA	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO (FÍSICO - MONETARIO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGOS	DE FIANTE	PAGOS	FINANCIADOS	
1	2020/07/04/1/1/002/20	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	80	GRUPO UNICOM S.A. DE C.V.	Proyecto de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para las Unidades Administrativas, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Tláhuac, ubicado en Calle Santa María Magdalena, Tláhuac, C.P. 06100, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/01/2020	31/03/2021	1,484,133.36	0.00	ACTIVO	0.00					0.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
2	2020/07/04/1/1/002/20	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	80	GRUPO UNICOM S.A. DE C.V.	Proyecto de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para las Unidades Administrativas, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle General B. Díaz, Milpa Alta, C.P. 06000, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	01/01/2020	31/03/2021	3,813,324.88	0.00	ACTIVO	0.00					0.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
3	2020/07/04/1/1/002/20	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	80	GRUPO UNICOM S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle General B. Díaz, Milpa Alta, C.P. 06000, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	01/01/2020	30/09/2021	11,417,875.84	0.00	ACTIVO	0.00					0.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
4	2020/07/04/1/1/002/20	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	80	GRUPO UNICOM S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento interno y externo para la certificación del SANE en la Clínica Especializada Mixteca, ubicada en Av. Polanco 1500, Col. Polanco, C.P. 06000, Alcaldía Polanco, Ciudad de México.	01/01/2020	31/03/2021	1,670,931.20	0.00	ACTIVO	0.00					0.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
5	2020/07/04/1/1/002/20	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	80	GRUPO UNICOM S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción Ampliación, Rehabilitación y Construcción de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Atlixco, ubicado en Calle Anacleto, C.P. 06000, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/01/2020	31/03/2021	7,965,824.81	0.00	ACTIVO	0.00					0.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
6	2020/07/04/1/1/002/20	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	80	GRUPO UNICOM S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento, Ampliación y Construcción de Infraestructura del Centro de Salud Lomas de Pedernales, ubicado en Carretera México-Toluca, C.P. 06000, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/01/2020	31/03/2021	1,355,567.89	0.00	ACTIVO	0.00					0.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
Subtotal de Obras Hospitalarias 2020-21								510,328.01	0.00				0.00	0.00	0.00			
7	2020/07/04/1/1/002/20	PARTE PRIVADA (CONDOMINIO)	80	GRUPO UNICOM S.A. DE C.V.	Complemento de Construcción de la Clínica Hospitalaria "A" - Unidad Hospitalaria "B" - Construcción de edificios para atención de pacientes internados en diferentes Unidades de la Ciudad de México.	01/01/2020	31/03/2021	510,328.01	0.00	ACTIVO	0.00					0.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Fecha al 30 de septiembre de 2021

NÚMERO	CÓDIGO	C.E.	MODALIDAD	EXPRESS	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	MONTO CONTRACTUAL EJERCIDO 2021	OTORGENTA	ANTICIPOS			CÓMODO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PERÍODO	MONTO	PERÍODO	PERÍODO	MONTO	PERÍODO	MONTO	
					Proyecto Cultural: Museo de Historia			140,402,457.47	140,402,457.47	0.00						0.00	140,402,457.47	0.00			
12	00000001	1	00000001	00	PROYECTO CULTURAL: MUSEO DE HISTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	01/01/2021	30/09/2021	4,814,027.00	4,814,027.00	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	4,814,027.00	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSM). Fecha del pago del anticipo, 17-Feb-2021.
14	00000001	1	00000001	00	PROYECTO CULTURAL: MUSEO DE HISTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	01/01/2021	30/09/2021	1,108,338.47	1,108,338.47	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	1,108,338.47	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSM). Fecha del pago del anticipo, 8-Feb-2021.
16	00000001	1	00000001	00	PROYECTO CULTURAL: MUSEO DE HISTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	01/01/2021	30/09/2021	1,432,728.28	1,432,728.28	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	1,432,728.28	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSM). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
17	00000001	1	00000001	00	PROYECTO CULTURAL: MUSEO DE HISTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	01/01/2021	30/09/2021	3,253,988.11	3,253,988.11	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	3,253,988.11	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos Concluidos. Reemplazado el 4-May-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSM). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
18	00000001	1	00000001	00	PROYECTO CULTURAL: MUSEO DE HISTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	01/01/2021	30/09/2021	5,752,178.38	5,752,178.38	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	5,752,178.38	0.00	10.00%	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSM). Fecha del pago del anticipo, 8-Feb-2021.
19	00000001	1	00000001	00	PROYECTO CULTURAL: MUSEO DE HISTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	01/01/2021	30/09/2021	24,813,800.00	24,813,800.00	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	24,813,800.00	0.00	98.80%	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSM). Fecha del pago del anticipo, 8-Feb-2021.
20	00000001	1	00000001	00	PROYECTO CULTURAL: MUSEO DE HISTORIA NACIONAL, S.A. DE C.V.	01/01/2021	30/09/2021	17,148,568.27	17,148,568.27	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	01/01/2021	30/09/2021	0.00	17,148,568.27	0.00	86.20%	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSM). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.

Source: U.S. Census Bureau, 1997.

NÚMERO		A.A.	MODALIDAD	IMPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJECUTADO 2021	PORCENTAJE	ACTIVIDADES		CONSUMO / PERIODO MONED.			SITUACIÓN		ASIGNACIÓN		OBSERVACIONES
ORDEN	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONED.	PARADA	EN TRÁMITE	TERMINO	FINANCIADO			
11	2020P-001-A-010-20	CONTRATO ADMINISTRATIVO	40	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEMPLOS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, S.P. DE C.V., LOCALIDAD DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO.	01/01/2021	30/06/2021	2,288,214.86	2,288,214.86	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.		
12	2020P-001-A-010-20	CONTRATO ADMINISTRATIVO	40	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEMPLOS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, S.P. DE C.V., LOCALIDAD DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO.	01/01/2021	31/12/2021	18,811,318.81	18,811,318.81	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85%	98.84%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.		
13	2020P-001-A-010-20	CONTRATO ADMINISTRATIVO	40	SERVICIO DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE CONSULTA PARA LA CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REFORMACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEMPLOS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ORGANISMO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE MEXICO, LOCALIDAD DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO.	01/01/2021	31/12/2021	8,398,191.12	8,398,191.12	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.34%	85.32%	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 18-feb-2021.		
14	2020P-001-A-010-20	CONTRATO ADMINISTRATIVO	40	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUNDO DE ARTE MODERNO CREADO EN EL PARQUE DE LA ESCULTURA S/N BOSQUE DE CHAPULTEPEC, LOCALIDAD DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO.	01/01/2021	31/12/2021	50,805,532.28	50,805,532.28	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.88%	89.84%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos , debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.		
Mantenimiento a Puentes Peatonales en Estaciones Principales de la Ciudad de México (2021)								8,204,403.49	8,204,403.49	0.00			0.00		0.00	2,004,403.33	1,894,336.23			
15	2020P-001-A-010-20	CONTRATO ADMINISTRATIVO	40	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Puentes Peatonales, ubicados en la Avenida Felipe Cárdenas de México, demandados de actividades generadas por el BURE y vinculadas a la Demanda Ciudadana.	01/01/2021	30/06/2021	1,398,180.92	1,398,180.92	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	78.11%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 10-sep-2021 . Se reporta por última vez.		
16	2020P-001-A-010-20	CONTRATO ADMINISTRATIVO	40	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Puentes Peatonales, ubicados en Avenida República de la Ciudad de México, demandados de actividades generadas por el BURE y vinculadas a la Demanda Ciudadana.	01/01/2021	31/08/2021	1,898,448.24	1,898,448.24	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	98.49%	Trabajos Concluidos.		

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Cuota al 30 de septiembre de 2021

CARGO	CONTRATO	A.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHAS DE SITUACIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	MONTO CONTRACTUAL EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PAGAR - PAGAR)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGAR	EN FINANCIER	PAGAR	FINANCIER	
21	000-00-00-1-0-00-01	000-00-00-00-00	00	000-00-00-00-00-00	Reconstrucción de Pavimento y Aceras en la Avenida Toluca, Ciudad de México, dentro de las obras de rehabilitación y modernización programadas.	11/04/2021	30/09/2021	1,377,848.00	1,377,848.00	0.00	000-00-00-00-00-00	0.00	0.00	0.00	0.00	000,000.00	000,000.00	00.00%	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
22	000-00-00-1-0-00-02	000-00-00-00-00	00	000-00-00-00-00-00	Reconstrucción de Pavimento y Aceras en la Avenida Toluca, Ciudad de México, dentro de las obras de rehabilitación y modernización programadas.	11/04/2021	30/09/2021	1,377,848.00	1,377,848.00	0.00	000-00-00-00-00-00	0.00	0.00	0.00	0.00	000,000.00	000,000.00	00.00%	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
TOTAL								2,755,696.00	2,755,696.00	0.00			0.00			000,000.00	000,000.00			


 C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"


 Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

TOTAL CONTRACTUAL	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
2,755,696.00	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL	
PAGAR	EN FINANCIER	PAGAR	FINANCIER
000,000.00	000,000.00	00.00%	00.00%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de septiembre de 2021

ORDEN	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	COMISIÓN	GASTOS		COMPRAS (PERÍODO: 2020-2021)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					2020	2021	2022	PARADO	EN TERMINO	2020	2021	
					Reconstrucción del Edificio de Justicia para Adolescentes			26,894,295.72	0.00					26,894,295.72	26,894,295.72	0.00			
2	0000P-001-1-001-0000	2019-2021	AL	INTEGRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Reconstrucción y desarrollo administrativo y financiero para la construcción del Edificio de Justicia para Adolescentes del Centro Judicial, ubicado en avenida Ochoa y avenida Reforma 14, Colonia, ALCE, Nueva Loma, Delegación, México, Ciudad de México.	2019-2021	2021-2021	26,894,295.72	0.00	26,894,295.72	0.00	26,894,295.72	0.00	26,894,295.72	26,894,295.72	0.00	100.00%	00.00%	Se encuentra en proceso de ejecución.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec			951,888,210.77	0.00					951,888,210.77	951,888,210.77	0.00			
3	0000P-001-1-001-0000	2019-2021	AL	INTEGRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec	2019-2021	2021-2021	951,888,210.77	0.00	951,888,210.77	0.00	951,888,210.77	0.00	951,888,210.77	951,888,210.77	0.00	100.00%	00.00%	Se encuentra en proceso de ejecución.
4	0000P-001-1-001-0000	2019-2021	AL	INTEGRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec	2019-2021	2021-2021	951,888,210.77	0.00	951,888,210.77	0.00	951,888,210.77	0.00	951,888,210.77	951,888,210.77	0.00	100.00%	00.00%	Se encuentra en proceso de ejecución.
					Reconstrucción y Mantenimiento Integral de la Infraestructura de Salud			67,814,613.40	0.00					67,814,613.40	67,814,613.40	0.00			
4	0000P-001-1-001-0000	2019-2021	AL	INTEGRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Mantenimiento Integral de la Infraestructura de Salud	2019-2021	2021-2021	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	67,814,613.40	0.00	100.00%	00.00%	Se encuentra en proceso de ejecución.
5	0000P-001-1-001-0000	2019-2021	AL	INTEGRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Mantenimiento Integral de la Infraestructura de Salud	2019-2021	2021-2021	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	67,814,613.40	0.00	100.00%	00.00%	Se encuentra en proceso de ejecución.
6	0000P-001-1-001-0000	2019-2021	AL	INTEGRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Mantenimiento Integral de la Infraestructura de Salud	2019-2021	2021-2021	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	67,814,613.40	0.00	100.00%	00.00%	Se encuentra en proceso de ejecución.
7	0000P-001-1-001-0000	2019-2021	AL	INTEGRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Mantenimiento Integral de la Infraestructura de Salud	2019-2021	2021-2021	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	67,814,613.40	0.00	100.00%	00.00%	Se encuentra en proceso de ejecución.
8	0000P-001-1-001-0000	2019-2021	AL	INTEGRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Mantenimiento Integral de la Infraestructura de Salud	2019-2021	2021-2021	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	67,814,613.40	0.00	100.00%	00.00%	Se encuentra en proceso de ejecución.
9	0000P-001-1-001-0000	2019-2021	AL	INTEGRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Mantenimiento Integral de la Infraestructura de Salud	2019-2021	2021-2021	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	0.00	67,814,613.40	67,814,613.40	0.00	100.00%	00.00%	Se encuentra en proceso de ejecución.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de septiembre de 2021

NÚMERO		C.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ACTIVIDADES		CONSUMO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
ORDEN	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PERÍODO	en Tránsito	YO-20	PROYECTADO	
4	000000001-0-000-00	CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Obras Administrativas y Operativas para las Fases de Construcción del Centro de Salud Tepic, ubicado en Calle 10 de Mayo, Barrio Tepic, Ciudad de México.	01/08/2020	01/08/2022	1,290,295.94	0.00	ASISTENTE	0.00								
										ASISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,672.10	140,980.00	100.00%	93.80%	Trabajos concluidos
										CONSEJERO	0.00								
5	000000001-0-000-00	CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Servicio integral para las Fases de Construcción, Operación y Mantenimiento del Centro de Salud Intermedia Tepic, ubicado en Calle 10 de Mayo, Barrio Tepic, Ciudad de México.	01/08/2020	01/08/2022	17,827,369.22	0.00	ASISTENTE	0.00								
										ASISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,286,040.22	0.00	91.33%	91.33%	Trabajos en proceso de ejecución
										CONSEJERO	0.00								
6	000000001-0-000-00	CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Obras Administrativas y Operativas para las Fases de Construcción, Operación y Mantenimiento del Centro de Salud Intermedia Tepic, ubicado en Calle 10 de Mayo, Barrio Tepic, Ciudad de México.	01/08/2020	01/08/2022	1,434,180.19	0.00	ASISTENTE	0.00								
										ASISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,718.02	300,462.17	100.00%	72.09%	Trabajos concluidos
										CONSEJERO	0.00								
7	000000001-0-000-00	CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica y de Obras Administrativas y Operativas para las Fases de Construcción del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle 10 de Mayo, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 06000, Ciudad de México.	01/08/2020	01/08/2022	1,312,314.56	0.00	ASISTENTE	0.00								
										ASISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,772.87	104,541.69	100.00%	77.36%	Trabajos concluidos
										CONSEJERO	0.00								
8	000000001-0-000-00	CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Servicio integral para las Fases de Construcción, Operación y Mantenimiento del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle 10 de Mayo, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 06000, Ciudad de México.	01/08/2020	01/08/2022	11,437,375.94	0.00	ASISTENTE	0.00								
										ASISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412,141.18	104,831.48	100.00%	91.12%	Trabajos concluidos
										CONSEJERO	0.00								
9	000000001-0-000-00	CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Trabajo de Asesoramiento técnico y gestión para la construcción del OREO de la Clínica Comunitaria Milpa Alta, ubicado en Calle 10 de Mayo, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 06000, Ciudad de México.	01/08/2020	01/08/2022	1,670,821.35	0.00	ASISTENTE	0.00								
										ASISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,340.26	0.00	100.00%	95.90%	Trabajos concluidos
										CONSEJERO	0.00								
					Complejo Cultural Resque de Chapultepec			140,493,637.87	0.00					0.00	134,497,439.22	0.00			
10	000000001-0-000-00	CONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Trabajo de construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los Talleres Comunitarios de Artes, Artes y Oficios, Salón de Exposiciones de la Escuela de Artes, el teatro y el cine, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Calle 10 de Mayo, Barrio Milpa Alta, Ciudad de México.	01/08/2020	01/08/2022	4,814,037.05	0.00	ASISTENTE	1,289,298.10								
										ASISTENTE	1,289,298.10	18/03/2021	18/03/2021	0.00	4,176,798.87	0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 90 de la LOPFOM).
										CONSEJERO	0.00								Fecha del pago del anticipo, 17 feb 2021



[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

NÚMERO		C.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PLAZOS DE EJECUCIÓN (CONTRATO)		Monto CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ARTÍCULOS		CONVENIO (FIRMAS, MONEDAS)			DETALLADO		PAGOS %		OBSERVACIONES
DATE	CONTRATO					INICIO	TERMINO			MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	
001	CONTRATO 001-2021-01	CONVENIO 001-2021-01	CONVENIO	CONVENIO 001-2021-01	CONVENIO 001-2021-01	01/01/2021	31/12/2021	15,000,000.00	0.00	001-2021-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Concluido con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (10% del total) (CONVENIO).
002	CONTRATO 002-2021-02	CONVENIO 002-2021-02	CONVENIO	CONVENIO 002-2021-02	CONVENIO 002-2021-02	01/01/2021	31/12/2021	10,000,000.00	0.00	002-2021-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Concluido con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (10% del total) (CONVENIO).
003	CONTRATO 003-2021-03	CONVENIO 003-2021-03	CONVENIO	CONVENIO 003-2021-03	CONVENIO 003-2021-03	01/01/2021	31/12/2021	8,000,000.00	0.00	003-2021-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Concluido con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (10% del total) (CONVENIO).
004	CONTRATO 004-2021-04	CONVENIO 004-2021-04	CONVENIO	CONVENIO 004-2021-04	CONVENIO 004-2021-04	01/01/2021	31/12/2021	12,000,000.00	0.00	004-2021-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Concluido con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (10% del total) (CONVENIO).

E. Villar Manuel Rodríguez López
 Subdirección de Construcción de Obras, S. A. de C. V.

Ing. Raúl Alejandro Martínez.
Instituto de Construcción de Obras Públicas "ICOP"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	18	4	0	3	19	3	19	0
TOTAL	18	4	0	3	19	3	19	0

LOS CONTRATOS DGCOP-IR-L-1-003-21, DGCOP-IR-L-1-004-21 Y DGCOP-IR-L-1-005-21, SE HAN RECEPCIONADO - SE DAN POR CONCLUIDO.

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 399–406



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENEOCHTTLAN
ESTE ES EL PAÍS DE NUESTROS PADRES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	56	0	0		0	56	0	56	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



BOITE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

NÚMERO	TÍTULO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado TOTAL	Monto contractado EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		EJECUCIÓN (PERÍODO ANTES)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	ANTICIPOS	ANTES	DESPUES	ANTES	PAGADA	EN TIEMPO	FINANCIADO	FINANCIADO	
1	DOCCOP-AD-L-5-010-21	100%	AD.	INSTRUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEQUEDA STARA, UBICADO EN LA AVENIDA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PARQUE DOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-P", AVENIDA VARGO DE GUERRA N° 1401, COLONIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO.	18-mar-21	11-sep-21	\$1,648,413.00	\$1,648,413.00	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$206,850.00	\$481,550.00	17.00%	58.90%	
2	DOCCOP-UPNL-4-011-21	100%	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIÓN DAMEL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MEDIZ S/N ESQUINA CALLE FEDERICO GONZALEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA ITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-mar-21	20-jun-21	\$4,799,027.38	\$4,799,027.38	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
3	DOCCOP-UPNL-4-012-21	100%	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIÓN DAMEL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CARMEN SERDAN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDAN, COLONIA CARMEN SERDAN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-mar-21	20-jun-21	\$3,100,026.88	\$3,100,026.88	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$172,888.76	0.00%	5.57%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DOCCOP-RL-L-1-015-21	100%	IR	GRUPO CONSTRUCCIÓN DE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADICCIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA", "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TNA MODOTY" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, S/N 3RD. YAGUAS, COLONIA ALJICO HUAYAMPALA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04860, 2) "LUNA YAGUAS TLAUPLAN" UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA S. COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLAUPLAN, C.P. 44890, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-mar-21	7-jun-21	\$4,186,000.00	\$4,186,000.00	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,082,580.00	\$148,123.00	18.20%	29.21%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DOCCOP-RL-L-1-016-21	100%	IR	GRUPO CONSTRUCCIÓN DE S.A. DE C.V.	A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA", "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA AMPARO COHOA" UBICADA EN CALLE JOSÉ NABES CASTORENA 180, COLONIA CUJAMARCA, ALCALDÍA CUJAMARCA DE MORELOS, C.P. 69000, 2) "LUNA CRISTINA PACHECO" UBICADA EN CALLE PASTOR S/N, COLONIA SAN JOSÉ ATACAYO, ALCALDÍA LA MADALENA, CONTRERAS, C.P. 60718, 3) "LUNA ALAI DE POPPA" UBICADA EN CALLE 22 Y AV. NEALDO EDO, CALLE 17, COLONIA PRECONCRETO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 04890, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-mar-21	23-jun-21	\$6,011,846.62	\$6,011,846.62	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$2,850,052.88	\$218,201.70	37.00%	33.41%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
6	DOCCOP-UPNL-4-017-21	100%	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS HUAYAMPALA", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMPALA S/N, COLONIA ALJICO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jun-21	\$4,370,386.28	\$4,370,386.28	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	19.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.
7	DOCCOP-UPNL-4-018-21	100%	L.P.N.	FORJARE FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS BATALLÓN FIDEL CASTRO", UBICADO EN CALLE BATALLÓN FIDEL CASTRO, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA ITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jun-21	\$5,580,798.19	\$5,580,798.19	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$81,312.31	\$0.00	8.90%	1.19%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



HOY: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejecutado (2021)	COMPAÑIA	ANTICIPA		CUBRIMIENTO PERIÓDICO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	ANTICIPA	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN DINERO	TRABAJOS	FINANCIADOS	
9	DOCOF-LPN-4-019-21	LOCAL	L.P.R.	ARBA MEXICO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS CADELAMA TIOOMAN", UBICADO EN CALLES INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. F. 1, L. 5, COLONIA CADELAMA TIOOMAN, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jun-21	\$4,470,447.54	\$4,470,447.54	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$2,018,215.36	\$0.00	100.00%	45.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DOCOF-LPN-4-020-21	LOCAL	L.P.R.	COM. S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS AGUSTIN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLO UBICADO EN CALLE AGUSTIN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCHERO, COLONIA SAN JOSE, ALCALDIA TLUACILCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jun-21	\$0,002,453.89	\$0,002,453.89	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.18%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.
11	DOCOF-LPN-4-021-21	LOCAL	L.P.R.	DE ANGLERO DE INNOVACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS OLIMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADO EN PRIVADA OLIMPICA, SNL, COLONIA SAN JOSE, ALCALDIA MEXICO ALTA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIPO DETERMINADO.	05-mar-21	27-jun-21	\$0,798,076.29	\$0,798,076.29	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,551,490.25	\$0.00	100.00%	35.70%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DOCOF-LPN-4-022-21	LOCAL	L.P.R.	DE ANGLERO DE INNOVACION S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RIO MEXICO ORIENTE SNL, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIPO DETERMINADO.	20-mar-21	25-ago-21	\$20,723,448.51	\$20,723,448.51	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$866,126.26	\$1,296,412.50	40.00%	12.30%	
13	DOCOF-LPN-4-023-21	LOCAL	L.P.R.	ALTA INNOVACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NOROCCIDENTE", UBICADO EN CALLE NOROCCIDENTE, SNL, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jun-21	\$0,531,590.81	\$0,531,590.81	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$2,105,309.00	\$2,295,480.81	100.00%	45.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DOCOF-LPN-4-024-21	LOCAL	L.P.R.	GRUPO DORADO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "PLAZAS RIO MEXICO", UBICADO EN CALLE RIO MEXICO, SNL, COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jun-21	\$0,071,204.00	\$0,071,204.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$000,000.00	\$1,801,000.00	100.00%	35.70%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Comisión Especial de Obras Públicas
Comisión de Contratación y Obras Públicas

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ AL SECTOR OCTUBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE	P.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO COMPROMETIDO TOTAL	MONTO COMPROMETIDO AL PERÍODO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO (PERÍODO 2021)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	POR PAGAR	EN TRÁMITE	TRÁMITE	PROYECTO			
18	DDOOP-LPML-1-028-21	100%	LPML	CONSTRUCION E INNOVACION HERRERA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES PILITO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MARASCO, ESQUINA MAZTLÁN, COL. PILITO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	04-01-21	2-ene-21	\$0,022,532.08	\$0,022,532.08	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.11%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
19	DDOOP-AD-4-028-21	100%	AD	CONSULTORIOS INGENIERIA DEL TALLE S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-ene-21	1-ago-21	\$1,444,085.25	\$1,444,085.25	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,075,972.75	\$289,917.50	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE TRÁMITO ADMINISTRATIVO
20	DDOOP-LPML-4-027-21	100%	LPML	RECIBO DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CUTLAKMAC", UBICADO EN AVENIDA GEMAR ESTRADA SAN COLUMBA SANTA CRUZ MEXICALCO, ALCALDÍA STAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	04-01-21	3-ago-21	\$4,580,000.00	\$4,580,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	17.00%	0.00%	
21	DDOOP-LPML-5-028-21	100%	LPML	GRUPO DE INGENIERIA PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISOR S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ZONA D-41", (PLARES CARMEN SERDÁN, UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, STPLARES CANDELARIA TIOCANAN, UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ T, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TIOCANAN, ALCALDÍA DUSTAVO A. MADRERO, STPLARES ESTACIONAMIENTO RECLUSARIO NORTE, UBICADO EN CALLE MORE LOS SIN, COLONIA CHILMA DE QUADALUPA, ALCALDÍA DUSTAVO A. MADRERO, STPLARES HUAYWILUPAY, UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYWILUPAY SAN COLUMBA ALCALDÍA COYOACÁN, STPLARES RO	04-01-21	04-ene-21	\$280,000.00	\$280,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$286,723.91	\$182,803.80	76.00%	40.00%	
22	DDOOP-LPML-1-029-21	100%	LPML	CONSTRUCION AL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 14", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 161, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-01-21	10-ago-21	\$24,367,034.72	\$24,367,034.72	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$7,532,510.00	\$5,157,740.40	85.00%	40.00%	
23	DDOOP-LPML-1-029-21	100%	LPML	DE INGENIERIA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES FLOR DE AZÚCAR", UBICADO EN FRACCION DEL TERRAZO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA, ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZÚCAR, COLONIA LOMAS DE SAN LUIS, ALCALDÍA STAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-01-21	10-ago-21	\$11,067,386.01	\$11,067,386.01	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$251,970.00	\$1,084,987.31	27.00%	17.10%	
24	DDOOP-LPML-5-030-21	100%	LPML	RECIBO DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ZONA A-41", (PLARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR, UBICADO EN CALLE MARCOS A. MÉNDEZ SAN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARCÍA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA STAPALAPA, 2 "PLARES CUTLAKMAC", UBICADO EN AVENIDA	14-01-21	10-ago-21	\$88,140.70	\$88,140.70	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$575,100.40	\$0.00	87.00%	30.70%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Unidad Central de Obras Públicas
Unidad de Contratos de Obra Pública



CIEN A. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contratado total	Monto ejecutado al 30/09/2021	ECONOMÍA	ANTICIPO		CÓMODO (PERIODO-ABRIL)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	NA	INICIO	TERMINO	ABRIL	FINANCIA	EN TRÁMITE	FINANCIA	FINANCIA	
21	DOCOF-LPN-4-402-21	UON	LPA	ING. JOSE WEL HERNANDEZ CHAVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES EJERCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANGELES EN ANGELES EN LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, ALCALDIA ATAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-abr-21	15-ago-21	\$1,007,079.14	\$1,007,079.14	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$40,343.09	80.00%	4.07%	
22	DOCOF-LPN-4-403-21	UON	LPA	RAMONDA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN CALLE AGRICULTORES SIN ENTRAR CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDIA ACAPOTLALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-abr-21	15-ago-21	\$6,190,986.13	\$6,190,986.13	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$67,776.48	\$0.00	8.10%	1.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.
23	DOCOF-LPN-4-404-21	UON	AR	TRILAK, PORTADA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRERÍA PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA ESTANQUA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SHERIDAN AVENIDA CAJON, COLONIA LOMA DE LA ESTANCA, ALCALDIA ATAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-abr-21	1-jun-21	\$457,893.24	\$457,893.24	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$457,893.24	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINCLET ADMINISTRATIVO
24	DOCOF-LPN-4-405-21	UON	LPA	GRUPO QUINA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDA, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA ALVARO OBREGON, ALCALDIA ATAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-abr-21	24-ago-21	\$4,705,084.96	\$4,705,084.96	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	15.00%	0.00%	
25	DOCOF-LPN-4-406-21	UON	LPA	GRUPO DYNAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CHICLERIA", UBICADO EN CALLE CHICLERIA SIN ENTRAR LAS CALLES TENDRA Y ALVARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-abr-21	24-ago-21	\$6,237,802.09	\$6,237,802.09	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$17,411.36	\$1,246,580.19	40.00%	20.97%	
26	DOCOF-LPN-4-407-21	UON	LPA	UO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CARRETERA EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN CAMI ESCOLAR CALLE 3 ANGEL, PISO, COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, ALCALDIA ATAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-abr-21	21-ago-21	\$3,738,004.79	\$3,738,004.79	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	15.00%	0.00%	
27	DOCOF-LPN-4-408-21	UON	LPA	COMPOSICIÓN CONSTRUCTORA AMERIK, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, MZ. R. L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD TLAPALPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-abr-21	28-ago-21	\$4,273,255.29	\$4,273,255.29	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
28	DOCOF-LPN-4-409-21	UON	AR	RAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-89, C.P. 0206, SANTA CRUZ, ALCALDIA MILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-may-21	2-ago-21	\$3,804,902.98	\$3,804,902.98	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$2,262,998.11	59.00%	54.71%	



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES
 Científicas y Tecnológicas
 Dependencia del Poder Judicial de la Federación



100715 AL 30 14 5477000000 00 0000

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021[illegible]



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección General de Obras Públicas
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN (DEL CONTRATO)	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS COMPROMETIDO EJERCICIO 2021	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO		EJECUCIÓN (PROMEDIO ANUAL)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES		
CÓDIGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				RECIBO	PAGOS	ESTIMADO	RECIBO	TERMINO							
37	DOCOFAD-L-3-009-21	100%	A.O.	GRUPO QUIMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) PLAZAS SAN JUAN DE ARAGÓN N° 1, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA SAN SAN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN EN SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO	1-jun-21	30-jun-21	\$1,342,431.43	\$1,342,431.44	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,342,431.43	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PROYECTO ADMINISTRATIVO		
38	DOCOFAD-L-5-009-21	100%	A.O.	UTAPRA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERNOS Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) "ZONA ANDRÉS" (PLAZAS ORIELA), UBICADO EN CALLE ORIELA N° 1, ENTRE LAS CALLES TENERA Y ALVARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VERGARA, CIUDAD DE MEXICO. UBICADO EN CALLE BATALE DE SANTA ROSA, UBICADO EN CALLE BATALE DE SANTA ROSA, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALE DE SANTA ROSA, COLONIA ALVARO ORRISON, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO. (PLAZAS GUARDERÍA) UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS N° 101, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO. (PLAZAS VIENTE GUERRERO) UBICADO EN PRINCIPAL DE CAMILLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CAROL DE SAN JUAN, CASI VICEREA CALLE 3 ANGEL RICO, COLONIA UNIDAD VIENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-nov-21	28-nov-21	\$1,070,510.87	\$1,070,610.87	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		
39	DOCOFAD-L-2-009-21	100%	A.O.	GRUPO TAC DO, CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) PLAZAS SALVADOR DIAZ MARON, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 129-5, SAN, COLONIA SALVADOR DIAZ MARON, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	16-jun-21	7-jul-21	\$1,306,541.30	\$1,306,541.30	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$940,407.99	\$910,053.34	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PROYECTO ADMINISTRATIVO		
40	DOCOFAD-L-8-009-21	100%	A.O.	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE ASISTENCIA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) RESUMIO PERIODO A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-jul-21	7-nov-21	\$1,443,157.45	\$1,443,157.45	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$300,176.75	\$27,903.05	45.00%	45.00%			
41	DOCOFAD-L-3-009-21	100%	A.O.	GRUPO QUIMA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRETA EN PLAZAS SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TATILLO SAN, COLONIA REPLICACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLAXIAC, CIUDAD DE MEXICO. EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jun-21	19-jul-21	\$1,433,834.41	\$1,433,834.41	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,433,834.41	\$0.00	100.00%	100.00%			
42	DOCOFAD-L-1-013-21	100%	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 3 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MEXICO. Sin ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 117", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUERTO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO ORRISON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-jul-21	28-nov-21	\$16,750,792.11	\$16,750,792.11	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$650,510.21	14.00%	0.00%			
43	DOCOFAD-L-5-013-21	100%	A.O.	C. CARLOS CESAR VELAZCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLAZAS) SAL LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. INCLuye LOS SIGUIENTES PROYECTOS: (PLAZAS PUERTO DE ALZARON, UBICADO EN AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFERIA SAN, ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE PUERTO DE ALZARON, COLONIA URBAN DE SAN JUAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO. (PLAZAS MANERÍA) UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO. (PLAZAS PUERTO ALVARO) UBICADO EN CALLE MANERÍA, COLONIA MANERÍA, COL. PUERTO ALVARO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO. (PLAZAS LUMAS DE PLATERO, UBICADO EN AVENIDA 100 MÉTRICO ORIENTE SAN, COLONIA URBAN DE PLATERO, ALCALDÍA ALVARO ORRISON, CIUDAD DE MEXICO. (PLAZAS DANC, UBICADO EN CALLE SALUD SAN, PUERTO SAN BERNABE, CIUDAD DE MEXICO. ALCALDÍA MANERÍA, CIUDAD DE MEXICO.	2-jul-21	28-nov-21	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	\$257,867.88	\$0.00	36.70%	18.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



CIUDAD DE MEXICO, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

NÚMERO CONTRATO	F.O.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTA CONTRATO TOTAL	MONTA CONTRATO EJERCIDO 2021	COTIZACIÓN	ANTICIPOS		CÓMODO (PERÍODO ANTES)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO						PREO	ESTADO	MONTO	PAGADA	EN TEMPO	PREO	FINANCIERO	
44	DOCCOP-AD-4-205-21	UNAM	A.S.	GRUPO PLANE S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA, Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ZONA AVANZADA", (TOLTECA SANTA ROSA XICHMOC, UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESUS SAN PUEBLO SANTA ROSA XICHMOC, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.		\$1,396,395.00	\$1,396,395.00	0.00	INTERPOS NA AMORTIZADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	NA	\$106,117.09	\$243,179.07	94.20%	91.48%	
45	DOCCOP-AD-4-209-21	UNAM	IS.	GRUPO PLANE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL, Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SANTA ROSA XICHMOC", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESUS SAN PUEBLO SANTA ROSA XICHMOC, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.		\$5,278,307.70	\$5,278,307.70	0.00	INTERPOS NA AMORTIZADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,873,021.84	30.00%	28.82%	
46	DOCCOP-AD-4-280-21	UNAM	IS.	MODELS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SECORRA", UBICADO EN CALLE SECORRA N° 98, FRACCIÓN 2, BARRIO DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.		\$8,513,988.88	\$8,513,988.88	0.00	INTERPOS NA AMORTIZADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	21.33%	0.00%	
47	DOCCOP-AD-4-281-21	UNAM	IS.	UNIHOROS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LOMAS DE TIRANQUITO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO SAN COLOMA LOMAS DE TIRANQUITO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.		\$8,988,816.78	\$8,988,816.78	0.00	INTERPOS NA AMORTIZADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	11.33%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
48	DOCCOP-AD-4-282-21	UNAM	IS.	VALOR RAMADON S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES TOLTECA", UBICADO EN CALLE 1° DE MAYO, AVENIDA ESCUADOR 201, SAN COLOMA TOLTECA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.		\$8,217,172.48	\$8,217,172.48	0.00	INTERPOS NA AMORTIZADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	13.33%	0.00%	
49	DOCCOP-AD-4-283-21	UNAM	A.S.	JANUARIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADO EN CALLE VERACRUZ N° 1840, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.		\$818,791.00	\$818,791.00	0.00	INTERPOS NA AMORTIZADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	80.00%	0.00%	
50	DOCCOP-AD-4-284-21	UNAM	A.S.	MODELS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN DE ARAGON N° 1", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 414 SAN COLOMA SAN JUAN DE ARAGON N° SECCION, ALCALDÍA SUSTANTO A SABERES, CIUDAD DE MEXICO.		\$1,480,475.31	\$1,480,475.31	0.00	INTERPOS NA AMORTIZADO NA POR AMORTIZAR NA	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CIUDAD DE MEXICO, SEPTIEMBRE 28, 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCICIO 2021	PORCENTAJE	ANTICIPOS	RECURSOS (PERÍODO ANTES)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO			
81	DOCCOP-RCL-2-885-21	100%	1A	CONTA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS FISCALISTAS", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2a SECCION, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-jul-21	5-oct-21	\$3,507,812.11	\$3,507,812.11	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,045,520.00	28.00%	28.00%	
82	DOCCOP-AD-L-2-886-21	100%	A2	INGENIERIA Y TRANSURBANA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS RAMÓN CORONAT A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, COLONIA SA, CERRADA MERCADO EJISTIAL, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MEXICO.	20-jul-21	8-ago-21	\$1,445,348.50	\$1,445,348.50	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,445,348.50	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PAGAR ADMINISTRATIVO
83	DOCCOP-AD-L-5-888-21	100%	A2	GRUPO ALI INSTALACIONES, S. DE S. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MEXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE NATIVALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1", AVENIDA VASCO DE QUEVEDO N° 1461, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-jul-21	29-ago-21	\$808,985.14	\$808,985.14	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$808,222.80	100.00%	10.00%	EN PROCESO DE PAGAR ADMINISTRATIVO
84	DOCCOP-AD-L-5-889-21	100%	A2	PROYECTOS DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PASADIZO PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE GUERRA, CAMPO MILITAR N° 1, SANTA FE, CALLE FELPE ANGELES Y MORELOS SANDERA NACIONAL, SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-21	2-ago-21	\$1,446,520.00	\$1,446,520.00	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE PAGAR ADMINISTRATIVO
85	DOCCOP-RCL-1-101-21	100%	1A	CONSTRUCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN A LA OMBENTACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL DASE", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRETILO S/N, 2da, COLONIA SAN BERNARDO OOSTOPEC, ALCALDIA BAZDARERA CONTRERAS (P. 1888), CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-21	22-oct-21	\$2,308,988.99	\$2,308,988.99	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	80.00%	0.00%	
86	DOCCOP-AD-L-5-104-21	100%	A2	114 PROYECTOS DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PLAZAS CAMINO REAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL S/N ENTRE CAMINO REAL Y CALLE CALA, COLONIA DAMASCOS, PUEBLO, ALCALDIA ITAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-21	25-ago-21	\$298,812.70	\$298,812.70	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE PAGAR ADMINISTRATIVO
									\$32,310,847.85	0.00	ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	PROCESO	EN PAGAR	RECIBO	TERMINO		
											0.00	0.00	0.00	0.00	34,841,850.00	27,078,312.11	31.57%	27.48%		

DR. CARLOS GUAYTHERO GOMEZ GOMEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

DR. GUAYTHERO GOMEZ GOMEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	23	4	0	0	27	0	27	0
TOTAL	23	4	0	0	27	0	27	0

OTA: Ninguno de los Contratos vigentes en el ejercicio se encuentra en procedimiento Jurídico.


HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6




MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0147

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTEPOS	COMANDO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					BIENES	BIENES					BIENES	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	PRC	FINANCIADO		SI	NO	
1	DOCCOP-LPH-1-4021-20	PARTICIPACIONES (OBRAS)	LEONARDO PUBLICA NACIONAL	Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alameda Álvaro Obregón.	13060000	20120000	139,944,121.02	66,977,648.41	0.00	ANTICIPO	00.00			48,482,266.91	6,525,279.60						En proceso de verificación de avance financiero en el ejercicio 2021. En proceso de verificación de avance de ejecución de trabajos.
				Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alameda Álvaro Obregón.			139,944,121.02	66,977,648.41	0.00	AMORTIZADO	00.00			48,482,266.91	6,525,279.60	100.00%	62.98%	Clase en Proceso	X		
				Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alameda Álvaro Obregón.					0.00	POR AMORTIZAR	00.00										
2	DOCCOP-LPH-1-5191-20	PARTICIPACIONES (OBRAS)	ANTICION RESTAURACION	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alameda Álvaro Obregón.	31060000	31120000	3,976,754.78	1,717,654.37	0.00	ANTICIPO	00.00			1,717,654.37	389,605.77						En proceso de verificación de avance financiero en el ejercicio 2021. En proceso de cierre administrativo de servicios para la entrega.
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alameda Álvaro Obregón.			3,976,754.78	1,717,654.37	0.00	AMORTIZADO	00.00			1,717,654.37	389,605.77	100.00%	100.00%	Servicios en Proceso	X		
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alameda Álvaro Obregón.					0.00	POR AMORTIZAR	00.00										
3	DOCCOP-LPH-1-4141-20	PARTICIPACIONES (OBRAS)	LEONARDO PUBLICA NACIONAL	Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alameda Tlalhuac.	11060000	11060000	112,985,765.67	67,701,401.80	0.00	ANTICIPO	00.00			37,024,616.31	6,815,489.98						En proceso de verificación de avance financiero en el ejercicio 2021.
				Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alameda Tlalhuac.			112,985,765.67	67,701,401.80	0.00	AMORTIZADO	00.00			37,024,616.31	6,815,489.98	94.69%	54.62%	Clase en Proceso	X		
				Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alameda Tlalhuac.					0.00	POR AMORTIZAR	00.00										
4	DOCCOP-LPH-1-5151-20	PARTICIPACIONES (OBRAS)	ANTICION RESTAURACION	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alameda Tlalhuac.	10060000	10070000	4,419,639.27	2,651,783.96	0.00	ANTICIPO	00.00			626,476.88	0.00						En proceso de verificación de avance financiero en el ejercicio 2021.
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alameda Tlalhuac.			4,419,639.27	2,651,783.96	0.00	AMORTIZADO	00.00			626,476.88	0.00	80.00%	23.62%	Servicios en Proceso	X		
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alameda Tlalhuac.					0.00	POR AMORTIZAR	00.00										
5	DOCCOP-LPH-1-4001-21	PARTICIPACIONES (OBRAS)	LEONARDO PUBLICA NACIONAL	Proyecto integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 3M Guadalupe Victoria, Lugar del Águila Sagrada.	18060001	18070001	30,453,954.68	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO	00.00			10,016,553.87	1,236,361.27						Clase en Proceso
				Proyecto integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 3M Guadalupe Victoria, Lugar del Águila Sagrada.			30,453,954.68	20,453,954.68	0.00	AMORTIZADO	00.00			10,016,553.87	1,236,361.27	75.87%	75.31%	Clase en Proceso	X		Clase en Proceso
				Proyecto integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 3M Guadalupe Victoria, Lugar del Águila Sagrada.					0.00	POR AMORTIZAR	00.00										
6	DOCCOP-LPH-1-3001-21	PARTICIPACIONES (OBRAS)	ANTICION RESTAURACION	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2.	18010001	18020001	6,371,320.99	6,371,320.99	0.00	ANTICIPO	00.00			1,906,965.77	3,989,214.42						Clase en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2.			6,371,320.99	6,371,320.99	0.00	AMORTIZADO	00.00			1,906,965.77	3,989,214.42	97.35%	29.93%	Clase en Proceso	X		Clase en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2.					0.00	POR AMORTIZAR	00.00										
7	DOCCOP-LPH-1-3001-21	PARTICIPACIONES (OBRAS)	ANTICION RESTAURACION	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1.	18010001	18020001	9,190,257.79	9,190,257.79	0.00	ANTICIPO	00.00			13,852,003.39	-						Clase en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1.			9,190,257.79	9,190,257.79	0.00	AMORTIZADO	00.00			13,852,003.39	-	100.00%	98.92%	Clase en Proceso	X		Clase en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1.					0.00	POR AMORTIZAR	00.00										
8	DOCCOP-LPH-1-3001-21	PARTICIPACIONES (OBRAS)	ANTICION RESTAURACION	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1.	18010001	18020001	1,753,613.70	1,753,613.70	0.00	ANTICIPO	00.00			1,753,613.70	0.00						Clase en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1.			1,753,613.70	1,753,613.70	0.00	AMORTIZADO	00.00			1,753,613.70	0.00	100.00%	100.00%	Clase en Proceso	X		En proceso de verificación de avance de ejecución de trabajos.
				Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1.					0.00	POR AMORTIZAR	00.00										
9	DOCCOP-LPH-1-3001-21	PARTICIPACIONES (OBRAS)	ANTICION RESTAURACION	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1.	18010001	18020001	896,421.77	896,421.77	0.00	ANTICIPO	00.00			345,655.00	119,958.38						Clase en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1.			896,421.77	896,421.77	0.00	AMORTIZADO	00.00			345,655.00	119,958.38	43.00%	26.56%	Servicios en Proceso	X		En proceso de verificación de avance de ejecución de trabajos.
				Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Centro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1.					0.00	POR AMORTIZAR	00.00										

NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	AUTOPORTE		CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		RÉGIMEN		FECHA DE ENTREGA RECEPTA	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					PERIODO	TERMINO						PERIODO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	PERIODO	FINANCIARI		SI	NO	
				Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bombas en la Avenida México, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Subtrazo 1 y Pabellón de Mandores.			25,544,207.01	25,544,207.01							6,070,905.00	0.00						
10	202001-UPM-4344-21	PARTICIPACIONES INDIC	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	ACCH S. A. de C. V.	20200201	20/11/2021	25,544,207.01	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 6,070,905.00	\$ -	24.00%	23.77%	Obras en Progreso	X		Obras en Progreso
				Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bombas en la Avenida México, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Subtrazo 1 y Pabellón de Mandores.						AMORTIZADO	\$0.00											
				Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bombas en la Avenida México, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Subtrazo 1 y Pabellón de Mandores.						POR AMORTIZAR	\$0.00											
				Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Barranquero", en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.			7,552,252.53	7,552,252.53							1,799,689.00	199,689.00						
11	202001-UPM-4345-21	PARTICIPACIONES INDIC	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTM Infraestructura Asfaltados S. A. de C. V.	06062021	12/12/2021	7,552,252.53	7,552,252.53	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,799,689.00	\$ 199,689.00	30.35%	22.62%	Obras en Progreso	X		Obras en Progreso
				Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Barranquero", en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.						AMORTIZADO	\$0.00											
				Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Barranquero", en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	\$0.00											
				Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Avenida México, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Subtrazo 1, Pabellón de Mandores, Cuarto de Mangueras y Tanque Elevado.			20,097,407.89	20,097,407.89							1,345,170.70	3,450,376.70						
12	202001-UPM-4350-21	PARTICIPACIONES INDIC	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios S. A. de C. V.	20200201	31/12/2021	20,097,407.89	20,097,407.89	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,345,170.70	\$ 3,450,376.70	22.17%	6.02%	Obras en Progreso	X		Obras en Progreso
				Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Avenida México, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Subtrazo 1, Pabellón de Mandores, Cuarto de Mangueras y Tanque Elevado.						AMORTIZADO	\$0.00											
				Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Avenida México, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Subtrazo 1, Pabellón de Mandores, Cuarto de Mangueras y Tanque Elevado.						POR AMORTIZAR	\$0.00											
				Adquisición de terreno para habilitar talleres auxiliares para la operación de la Línea 7 del Metrobús entre la Av. Cuauhtémoc, Puntos de Santa Cruz Moyat.			533,561.11	533,561.11														
13	202001-AD-1-071-21	PARTICIPACIONES INDIC	MANEJO DIRECTO	ALLEN Consultores S. A. de C. V.	20200201	24/02/2021	533,561.11	533,561.11	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 110,852.14	\$ 191,635.96	100.00%	20.74%	Obras en Progreso	X		Obras en Progreso de construcción de terminación de trabajos
				Adquisición de terreno para habilitar talleres auxiliares para la operación de la Línea 7 del Metrobús entre la Av. Cuauhtémoc, Puntos de Santa Cruz Moyat.						AMORTIZADO	\$0.00											
				Adquisición de terreno para habilitar talleres auxiliares para la operación de la Línea 7 del Metrobús entre la Av. Cuauhtémoc, Puntos de Santa Cruz Moyat.						POR AMORTIZAR	\$0.00											
				Segunda etapa de rehabilitación de la estación existente del Mercado San Cosme, ubicada en calle Calles Barrios No. 16, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.			16,299,496.88	16,299,496.88														
14	202001-UPM-1-074-21	PARTICIPACIONES INDIC	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	NOTESCA S. A. de C. V.	02/07/2021	29/12/2021	16,299,496.88	16,299,496.88	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 4,418,211.87	22.30%	0.00%	Obras en Progreso	X		Obras en Progreso
				Segunda etapa de rehabilitación de la estación existente del Mercado San Cosme, ubicada en calle Calles Barrios No. 16, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.						AMORTIZADO	\$0.00											
				Segunda etapa de rehabilitación de la estación existente del Mercado San Cosme, ubicada en calle Calles Barrios No. 16, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	\$0.00											
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Avenida México, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Subtrazo 1, Pabellón de Mandores, Cuarto de Mangueras y Tanque Elevado.			847,795.78	847,795.78														
15	202001-AD-1-075-21	PARTICIPACIONES INDIC	MANEJO DIRECTO	BYECO S. A. de C. V.	14/06/2021	31/12/2021	847,795.78	847,795.78	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 91,834.94	\$ 152,454.73	30.00%	10.84%	Obras en Progreso	X		Obras en Progreso
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Avenida México, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Subtrazo 1, Pabellón de Mandores, Cuarto de Mangueras y Tanque Elevado.						AMORTIZADO	\$0.00											
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Avenida México, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Subtrazo 1, Pabellón de Mandores, Cuarto de Mangueras y Tanque Elevado.						POR AMORTIZAR	\$0.00											
				Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y equipamiento de audio, iluminación y proyección en la zona de Macis Sur y Sur principal, en el FARD Cosmes.			2,837,434.90	2,837,434.90														
16	202001-AD-1-076-21	PARTICIPACIONES INDIC	MANEJO DIRECTO	TELETEL de México S. A. de C. V.	08/07/2021	29/07/2021	2,837,434.90	2,837,434.90	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 2,737,273.40	100.00%	0.00%	Obras en Progreso	X		Obras en Progreso
				Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y equipamiento de audio, iluminación y proyección en la zona de Macis Sur y Sur principal, en el FARD Cosmes.						AMORTIZADO	\$0.00											
				Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y equipamiento de audio, iluminación y proyección en la zona de Macis Sur y Sur principal, en el FARD Cosmes.						POR AMORTIZAR	\$0.00											
				Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nueva Mayor, en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.			16,506,387.89	16,506,387.89														
17	202001-UPM-1-080-21	PARTICIPACIONES INDIC	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	DRIMASA S. A. de C. V.	08/06/2021	31/12/2021	16,506,387.89	16,506,387.89	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ -	\$ -	4.12%	0.00%	Obras en Progreso	X		Obras en Progreso
				Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nueva Mayor, en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.						AMORTIZADO	\$0.00											
				Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nueva Mayor, en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	\$0.00											

NÚMERO	E. S.	SOCIEDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECINOMIA	AVANCE FÍSICO	CÓMPUTO (PENDIDO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA ACEPTACIÓN	CON ACIA DE ENTREGA ACEPTACIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
				Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Linda Vista), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			3,955,934.14	3,955,934.14														
18	DOCCOPUB-L-1-080-21	PAF	SESTACIÓN RESTAURACIÓN	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Linda Vista), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/10/2021	3,955,934.14	3,955,934.14	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	7.10%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso
				Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Estrella, Alamo y Tepeyac), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,627,714.18	1,627,714.18														
19	DOCCOPUB-L-1-084-21	PAF	SESTACIÓN RESTAURACIÓN	Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Estrella, Alamo y Tepeyac), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	13/08/2021	20/10/2021	1,627,714.18	1,627,714.18	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	17.28%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso
				Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Jalisco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			3,365,239.99	3,365,239.99														
20	DOCCOPUB-L-1-085-21	PAF	SESTACIÓN RESTAURACIÓN	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Jalisco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	13/08/2021	20/10/2021	3,365,239.99	3,365,239.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	14.52%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso
				Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Santa Cruz), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,831,707.89	1,831,707.89														
21	DOCCOPUB-L-1-086-21	PAF	SESTACIÓN RESTAURACIÓN	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Santa Cruz), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/10/2021	1,831,707.89	1,831,707.89	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	30.62%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso
				Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Tlalmanalco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			4,814,101.30	4,814,101.30														
22	DOCCOPUB-L-1-090-21	PAF	SESTACIÓN RESTAURACIÓN	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Tlalmanalco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	09/08/2021	23/10/2021	4,814,101.30	4,814,101.30	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	14.94%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso
				Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Tlalmanalco y Tlalmanalco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,612,429.49	1,612,429.49														
23	DOCCOPUB-L-1-094-21	PAF	SESTACIÓN RESTAURACIÓN	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Tlalmanalco y Tlalmanalco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	10/08/2021	23/10/2021	1,612,429.49	1,612,429.49	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	15.68%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso
				Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Guzmania y Churubusco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,599,360.37	1,599,360.37														
24	DOCCOPUB-L-1-095-21	PAF	SESTACIÓN RESTAURACIÓN	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Guzmania y Churubusco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/10/2021	1,599,360.37	1,599,360.37	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	24.72%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso
				Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Guzmania y Tlalmanalco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			2,630,109.76	2,630,109.76														
25	DOCCOPUB-L-1-097-21	PAF	SESTACIÓN RESTAURACIÓN	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Guzmania y Tlalmanalco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/10/2021	2,630,109.76	2,630,109.76	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	14.58%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso
				Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Guzmania), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			7,153,166.32	7,153,166.32														
26	DOCCOPUB-L-1-105-21	PAF	SESTACIÓN PÚBLICA MODERNIZACIÓN	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Guzmania), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	22/08/2021	26/10/2021	7,153,166.32	7,153,166.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	15.53%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso
				Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Guzmania), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			7,192,848.30	7,192,848.30														
27	DOCCOPUB-L-1-106-21	PAF	SESTACIÓN PÚBLICA MODERNIZACIÓN	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Guzmania), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	22/08/2021	26/10/2021	7,192,848.30	7,192,848.30	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$	-	1	-	13.54%	0.00%	Cero en Proceso	X	Cero en Proceso

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO	E. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FORMA DE ENTREGA, RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
							427,894,969.38	294,807,232.58	0.00		0.00			0.00	136,023,907.75	36,050,305.63						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
427,894,969.38	294,807,232.58	0.00	0.00
			AMORTIZACIÓN 0.00
			POR AMORTIZACIÓN 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		BIENES VENCIDOS AL PERIODO	
PAGADOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
136,023,907.75	36,050,305.63	90.00%	25.65%


 HUGO SÁNCHEZ LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción DE


 MTRO. EFRAIM AGUILAR MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Departamento de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
 Tel. 5246-1440 Ext. 201



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

6. Listado de Casos que presentan las Direcciones de Construcción de Obras Públicas "A" Y "B"

6.1 Listado de Casos número DCOP"A"/01/2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Hoja: (1 DE 1)

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CASOS AL SUBCOMITÉ DE OBRAS

Sesión : 10	ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	PROGRAMA: MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL 2021-ORIGINAL DE LA URG. CONCEPTO DE GASTO: 6191 PRESUPUESTO DEL CONCEPTO DE GASTO: \$2,396,000.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$3,000,000.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN: COMX/ROBSE/DGA/AF/4426/2021 OFICIO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL: COMX/ROBSE/DGA/AF/4426/2021
Ordenes: (R) Subordinaria	PROCEDIMIENTO SOLICITADO: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
Fecha: 26 de octubre de 2021	CONTRATACIÓN DE OBRA (X) CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR () CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ()	

CASE No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO PERIODO DE INICIO Y TÉRMINO	MONTOS ESTIMADOS	JUSTIFICACIÓN	FUNDAMENTO LEGAL	DIAGNÓSTICO DEL SUBCOMITÉ
DCOP/A/MT/2021	1	OBRA	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ALETAS COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE UNA EMERGENCIA (ABRIL- SEPTIEMBRE)	MONTOS SIN I.V.A. \$ 1,311,584.99 I.V.A. \$209,853.59 MONTOS TOTAL \$ 1,521,438.59	EL INCREMENTO CONSIDERABLE DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN CALZADO QUE SE OBSERVAN EN VALIDADES DE REGULACIÓN CONTINUA QUE IMPIDEN EL CRUCE SEGURO DE LOS PEATONES, POR LO QUE SE MANTIENE EN OBRAS CONSERVACIÓN LA INFRAESTRUCTURA URBANA QUE PERMITE LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS, SE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS, CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTA AL MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES DE CALZADOS PRIMARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LOS ARTÍCULOS: 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3º INCISO "A", FRACCIÓN I, 2º INCISO "A", 3º INCISO "C", 44 FRACCIÓN I, INCISO "A", 81 Y 83 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; 8-H FRACCIÓN VI Y 75-B DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	

ELABORADO POR: Ing. Francisco Macías Izquierdo Ortiz	PROYECTO: Ing. Juan Carlos Fuentes Ortales División General de Construcción de Obras Públicas	CONTROL DE CALIDAD: Ing. Carlos Acuña Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"	CONTROL DE CALIDAD: Ing. Efraín Álvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"	VOCA: Ing. Roberto Beltrán Salazar Comisión de Ingeniería de Control y Construcción de Obras Públicas	VOCA: C.P. Efraín Salazar Martínez Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas
VOCA: MMP. Gerardo Calzada Sotelo	VOCA: Ing. Roberto Beltrán Salazar Comisión de Ingeniería de Control y Construcción de Obras Públicas	VOCA: Ing. Roberto Beltrán Salazar Comisión de Ingeniería de Control y Construcción de Obras Públicas	VOCA: Ing. Roberto Beltrán Salazar Comisión de Ingeniería de Control y Construcción de Obras Públicas	VOCA: Ing. Roberto Beltrán Salazar Comisión de Ingeniería de Control y Construcción de Obras Públicas	VOCA: Ing. Roberto Beltrán Salazar Comisión de Ingeniería de Control y Construcción de Obras Públicas
AUTORIZADO: Ing. Juan Carlos Fuentes Ortales					



DICTAMEN QUE JUSTIFICAN LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, COMO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS: 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3° INCISO "A", FRACCIÓN I, 23 INCISO "A", 24 INCISO "C", 44 FRACCIÓN I, INCISO "A", 61 y 63 FRACCIONES II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 8-H FRACCIÓN VI Y 75 B, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

I.- ANTECEDENTES

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene entre sus propósitos fundamentales de elaborar estudios, proyectos, construcción y supervisión de obras, tales como infraestructura vial, edificios públicos, centros culturales, escuelas de educación media y superior, parques deportivos, obras urbanas complementarias, puentes peatonales y en su caso, modificar las existentes, razón por la cual tiene un papel importante en el mejoramiento de los niveles de bienestar de los habitantes de la Ciudad de México.

Como consecuencia del daño severo que presenta el puente peatonal en los elementos de su superestructura (trabes, firme de compresión y columnas) en tres de sus secciones o claros, derivado del impacto de vehículos de grandes dimensiones, propiciado por la falta de galibo en esas secciones del puente peatonal como lo marca el reglamento. En consecuencia de esta condición previamente observada, la Gerencia de Obras y Mantenimiento perteneciente al Sistema de Transporte Colectivo Metro mediante oficio **Clave:70200,Ref:GOM/21-0391**, de fecha 29 de marzo de 2021 (**Anexo 1**), solicita a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, solucionar de la forma más adecuada y segura para las personas usuarias, los daños visibles en el puente peatonal que comunica la acera sur de Viaducto Río de la Piedad con la estación Velódromo Línea 9 del Metro, por lo cual se considera que se efectúe el diagnóstico, diseño de la intervención integral y su respectiva ejecución de manera ágil para anticiparnos a cualquier percance que pudiera sufrir las personas usuarias.

Derivado de la situación descrita anteriormente, y en atención al oficio Clave:70200,Ref:GOM/21-0391, la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", adscrita a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, informa mediante oficio no. **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP"A"/07.04.21/0007**, de fecha 07 abril de 2021 (**Anexo 2**), efectuó una inspección visual con el personal de la Dirección General de Obras Públicas y la asistencia de un DRO en estructuras, el cual realizó una inspección y evaluación para la realización de un dictamen, de las condiciones que guarda el puente peatonal. El personal técnico de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" observa que el puente tiene una reparación previa a base de ángulos de acero a lo largo de la sección de las trabes mayormente dañadas, lo cual no impidió que las trabes siguieran presentando grietas de cortante a 45°, lo que indica un estado límite de falla ya que el concreto que recubre el acero de prefuerzo de las trabes se ha perdido en algunas zonas, por lo que pone en riesgo alto las tres secciones dañadas por un posible colapso.



Dado que la obra en mención se intervino de manera urgente por la gravedad del daño que presentaban las secciones del puente afectadas y así evitar la pérdida de vidas humanas y daños económicos mayores, la Dirección de construcción de Obras Públicas "A" mediante oficio no. **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/09.07.21/0004 (Anexo 3)**, de fecha 09 de julio de 2021, solicita a Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas que realice la gestión de recursos para el otorgamiento de la suficiencia presupuestal a los requerimientos de la obra ante la Secretaría de Administración y Finanzas, Subsecretaría de Egresos. De esta manera que la Dirección General de Administración y Finanzas mediante Oficio no. **CDMX/SOBSE/DGAF/4425/2021 (Anexo 4)**, de fecha 30 de agosto de 2021, envía a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas las requisiciones con suficiencia presupuestal que ha sido autorizada y mediante Oficio no. **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SARFOP/31.08.21/001 (Anexo 5)**, de fecha 31 de agosto de 2021, dirigido a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", donde hace de su conocimiento sobre la recaudación de recursos para la obra **"RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE UNA EMERGENCIA"**.

La Dirección General de Construcción de Obras Públicas mediante oficio. No. **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/01.09.21/008** asigna a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" como Área responsable de la ejecución de los trabajos **(Anexo 6)**, para llevar a cabo las acciones que correspondan, en el ámbito de sus facultades y atribuciones conforme a la normatividad aplicable, para que realice todos los trámites necesarios para llevar a cabo los trabajos, relacionadas con el Proyecto de "Mantenimiento de Puentes Peatonales", la cual a su vez con oficio No. **CDMX/SOBSE/DGCOP/DCOP"A"/02.09.21/0004** encomienda a la Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2" desarrollar los trabajos mencionados **(Anexo 7)**, y esta a su vez mediante oficio No. **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/03.09.21/0001 (Anexo 8)**, designa a la Jefatura de Unidad Departamental de supervisión de Construcción "A5" para llevar a cabo la Residencia de Obra.

II. UBICACIÓN.

El Contratista, llevará a cabo las actividades en la siguiente ubicación, en donde se realizará la ejecución de los trabajos para la obra de **"RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE UNA EMERGENCIA"**.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS,
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Coordenadas: 19°24'28.46"N 99° 6'5.81"W



III. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE PRETENDEN CONTRATAR.

La obra que el Gobierno de la Ciudad de México pretende contratar, es la consistente a el "RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE UNA EMERGENCIA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA.

IV. EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El plazo estimado para la realización de la obra de desmontaje, retiro y demolición es de abril a septiembre de 2021, a partir del inicio de la obra y hasta la conclusión de las misma, siendo el plazo acorde, conforme a la magnitud de las afectaciones. Dicho programa podrá ser modificado en los términos establecidos en la normatividad correspondiente.



V. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE SOPORTA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, para la realización del estudio de mercado correspondiente, consideró la base de datos del registro de su padrón de contratistas, la cual contiene información de cumplimiento de contratos de años anteriores, de las empresas que han realizado trabajos similares, que cuentan con capacidad técnica, solvencia económica y un historial de cumplimiento de contratos celebrados con Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. Lo anterior, con el objeto de asegurar las mejores condiciones disponibles de contratación para el Estado.

VI. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO, FUNDANDO EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE RESULTE PROCEDENTE PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN DIRECTA Y MOTIVANDO LA PROPUESTA MEDIANTE LA DESCRIPCIÓN DE LAS RAZONES EN QUE SE SUSTENTA LA MISMA.

La Dependencia propone que la adjudicación del contrato de Obra Pública sea a través del procedimiento de **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, lo que garantizará que el inicio de los trabajos se lleve a cabo con la prontitud y celeridad requeridas, acatando las indicaciones del Gobierno de la Ciudad de México de atender de manera pronta y expedita, los trabajos necesarios.

Lo anterior, en virtud de que, de celebrarse una licitación pública se provocarían pérdidas económicas, políticas y sociales considerables, que se reflejarían en el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, al no atenderse de manera inmediata y considerando la emergencia de realizar la obra ante un posible accidente en cualquier momento ocasionado por el colapso de las secciones dañadas del puente.

El procedimiento de adjudicación propuesto, se encuentra debidamente fundamentado en lo que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3° inciso "a", fracción I, 23 inciso "a", 24 inciso "c", 44 fracción I, inciso "a", 61 y 63 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 8-H fracción VI y 75 B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

VII. EL MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN Y LA FORMA DE PAGO PROPUESTA.

El monto estimado por la Dependencia para la contratación de la Obra Pública, al que pertenece la obra denominada, **"RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE UNA EMERGENCIA"**, el monto aproximado de estos trabajos se considera de **\$1,521,438.59 (un millón quinientos veintiún mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 59/100 M.N.)**, I.V.A. incluido.



El importe fue establecido en concordancia a la evaluación hecha por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. La forma de pago será a través de estimaciones con periodos máximos mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las instrucciones de la Residencia de Obra.

VIII. NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL PROPUESTA PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, DETALLANDO SUS DATOS GENERALES, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, dispone de una base de datos (padrón de contratistas) de empresas constructoras y prestadoras de servicios confiables, de las cuales se seleccionó a la empresa **"Constructora y Edificadora Nueva Generación, S.A. de C.V."**, toda vez que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, probada experiencia en trabajos similares con esta dependencia, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar y que no se encuentra inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, para suscribir contratos con la Administración Pública de la Ciudad de México.

IX. ACREDITAMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ, EN QUE SE FUNDA Y MOTIVA LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

ACREDITAMIENTO DEL CRITERIO DE ECONOMÍA.

Se opta por llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, fundamentado en el artículo 24 inciso "C" de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, garantizará que los trabajos se lleven a cabo con la prontitud y celeridad requerida, atendiendo las indicaciones del Gobierno de la Ciudad de México, lo cual ahorrará al Estado pérdidas económicas por cada día de atraso en el inicio de los trabajos así como evitar un inminente accidente, el cual conllevaría un gasto a un mayor así como pérdidas irreparables.

Comparado con una Licitación Pública, la Adjudicación Directa conlleva un menor costo para el Gobierno del Distrito Federal en la contratación de los trabajos, basándose en los costos de una Licitación, considerando lo que cuesta la elaboración de bases, reuniones, elaboración y publicación de la convocatoria, visitas, atención de inconformidades y aclaraciones; así como el costo que representa tener funcionando oportunamente y sin retraso. Cabe señalar que los costos se ven de igual manera abatidos durante el proceso de ejecución de la obra ya que la empresa adjudicada cuenta con una amplia experiencia demostrable en obras del mismo tipo a la que alude este dictamen, resultando en una obra más económica dado el criterio de solvencia económica.

ACREDITAMIENTO DEL CRITERIO DE EFICACIA.

Por medio del proceso de Adjudicación Directa, se podrá realizar con oportunidad y conforme a las características requeridas la contratación de los servicios, efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, por cualquier retraso y posibles problemas a la



población atendiendo de inmediato a la necesidad de ejecutar los trabajos, con esto se obtendrán las mejores condiciones de contratación y se cumplirá con los objetivos que se persiguen, la cual no se lograría de manera óptima por el procedimiento de Licitación Pública.

ACREDITAMIENTO DEL CRITERIO DE EFICIENCIA.

En virtud de que es indispensable garantizar el restablecimiento de las condiciones de seguridad a la población afectada, que los trabajos deberán iniciarse de inmediato y, toda vez que derivado de la revisión exhaustiva de las empresas que conforman el padrón de contratistas de la Secretaría de Obras y Servicios, se determinó que la empresa propuesta cuenta con la capacidad de respuesta inmediata, lo cual ha demostrado en base a la experiencia reflejada con relación a trabajos similares y con el equipo propio, con personal técnico idóneo y la capacidad financiera necesaria para iniciar de inmediato los trabajos. Lo anterior, asegura al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos que se pretenden realizar.

ACREDITAMIENTO DEL CRITERIO DE IMPARCIALIDAD.

Para la adjudicación de la Obra Pública que se pretende contratar, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, dispone de los elementos necesarios y suficientes para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguna de las empresas que conforman el padrón de contratistas de la Secretaría de Obras y Servicios, lo cual garantiza la rectitud con que actúan los servidores públicos involucrados en el procedimiento de contratación.

ACREDITAMIENTO DEL CRITERIO DE HONRADEZ.

En la celebración del Contrato de Obra Pública, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tomará en cuenta: la rectitud, responsabilidad e integridad en la actuación, con estricto apego al Marco Jurídico aplicable, tanto de los servidores públicos como de la empresa adjudicada.

ACREDITAMIENTO DEL CRITERIO DE TRANSPARENCIA.

La aplicación, erogación, comprobación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados para la ejecución de la Obra Pública relativa a la **"RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE UNA EMERGENCIA"**, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables. Asimismo, la Secretaría de Obras y Servicios por conducto de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas facilitará que la Auditoría Superior de la Ciudad de México y/o cualquier órgano fiscalizador competente en el ámbito de sus atribuciones puedan realizar en cualquier momento, la inspección, fiscalización y vigilancia de los recursos aplicables en la contratación de dicha obra. Lo anterior, sin menoscabo de las acciones correspondientes a la



Contraloría General de la Ciudad de México y a la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras y Servicios.

La Dirección General de Construcción de Obras Públicas integrará debidamente el expediente único de finiquito de contratos de obra correspondiente, que compruebe todas y cada una de las acciones del ejercicio de los recursos, conforme a las previsiones de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública.

X. MOTIVACIÓN

Derivado del daño estructural que tiene actualmente el puente peatonal en los elementos de su superestructura (trabes, firme de compresión y columnas) en tres de sus secciones o claros, derivado del impacto de vehículos de grandes dimensiones, propiciado por la falta de galibo en esas secciones del puente peatonal como lo marca el reglamento. En consecuencia de esta condición previamente observada, la Gerencia de Obras y Mantenimiento perteneciente al Sistema de Transporte Colectivo Metro mediante oficio **Clave:70200,Ref:GOM/21-0391**, de fecha 29 de marzo de 2021 (**Anexo 1**), solicita a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, solucionar de la forma más adecuada y segura para las personas usuarias. El personal técnico de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" observa que el puente tiene una reparación previa a base de ángulos de acero a lo largo de la sección de las trabes mayormente dañadas, lo cual no impidió que las trabes siguieran presentando grietas de cortante a 45°, lo que indica un estado límite de falla ya que el concreto que recubre el acero de presfuerzo de las trabes se ha perdido en algunas zonas y de igual forma se observan 3 trabes ligeramente giradas lo que conlleva esfuerzos a torsión con los que no fueron diseñados esos elementos, por lo que pone en riesgo alto de colapso a las secciones dañadas del puente, lo que conllevaría en la posible pérdida de vidas humanas y económicas en caso de un colapso de las secciones dañadas.

XI. FUNDAMENTO LEGAL.

El fundamento Legal de presente Dictamen, es con base en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3° inciso "a", fracción I, 23 inciso "a", 24 inciso "c", 44 fracción I, inciso "a", 61 y 63 fracciones II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 8-H fracción VI y 75 B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los Órganos Político-Administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar





que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:

A) La obra, dentro de la cual podrán estar:

I.- La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles;

(...)

Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.

En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Finanzas, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el



que se prevé el inicio de la erogación correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.

Tratándose de obra se requerirá, además de contar con los estudios y con el proyecto ejecutivo de la obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure que la obra se desarrollará ininterrumpidamente al contarse con las oportunas soluciones en el proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes; normas de construcción; especificaciones en su caso, especificaciones particulares de cada proyecto; programa de ejecución, y cuando sea necesario el programa de suministro y un costo estimado de la obra.

Se exceptúan de lo anterior:

a) Los casos en los que, de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente solo sean necesarios los términos de referencia o las especificaciones de trabajo o los planos o croquis que precisen los trabajos a realizar, independientemente de las especificaciones técnicas y normas de construcción que emita la secretaría y resulten aplicables;

(...)

Artículo 24.- La obra pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su Responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

(...)

C) Adjudicación directa.

(...)

Artículo 44.- Los contratos de obra pública para efectos de esta Ley, podrán ser de tres tipos:

I. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración que deba cubrirse al contratista se hará:

a) En el caso de obra, por unidad de concepto de trabajo terminado;



Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la Contraloría para su intervención. La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades ejerzan, deberá fundamentarse según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el dictamen a que se refiere el Artículo 41 deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de la opción, y contendrá, además:

I. El valor del contrato;

II. La nacionalidad del contratista;

III. Una descripción general de la obra pública, y

IV. En forma explícita, las razones sociales, técnicas, legales, económicas, financieras, así como administrativas que den lugar al ejercicio de la preferencia.

De las operaciones que se realicen conforme lo señalado en el Artículo 63, los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría el informe de las operaciones autorizadas en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia de su dictamen correspondiente.

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que:

(...)

II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;

(...)

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 8-H.- Para el cumplimiento de su objeto, los Subcomités de Obras, además de las que expresamente señala la Ley, tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

(...)

- VI. Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el artículo 63 de la ley;

(...)

Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;

Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.

- III. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la





XIII. LUGAR, FECHA Y RESPONSABLES.

El presente dictamen se elaboró el día 14 de octubre de 2021, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia:

Elaboró
J.U.D. de Supervisión de
Construcción "A5"

Arq. Nancy Fabiola Moncada
Barragán

Revisó
Subdirector de Construcción de
Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez

Vo. Bo.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz

Esta hoja de firmas corresponde al DICTAMEN QUE JUSTIFICAN LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, COMO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, PARA LA OBRA "RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE UNA EMERGENCIA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS,
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(ANEXO 1)



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO



Clave: 70200

Ref: GOM/21-0391

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021

Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
PRESENTE

Hago propicia la ocasión para enviarle atentos saludos. Por este medio, el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México solicita el apoyo de la Dirección a su digno cargo para solucionar de la forma más adecuada y segura para las personas usuarias, los daños visibles en el puente peatonal que comunica la acera sur de Viaducto Río Piedad con la estación Velódromo Línea 9 del Metro. Dicha estructura presenta una grieta en la superficie de circulación peatonal, observable en el anexo fotográfico.

Consideramos oportuno que se efectué el diagnóstico, diseño de la intervención integral y su respectiva ejecución de manera ágil para anticiparnos a cualquier percance que pudieran sufrir las personas usuarias.

Agradezco sus atenciones de manera anticipada y me reitero a su disposición para coordinar los esfuerzos que resulten necesarios.

Atentamente




Ing. Alejandra Flores Saldivar
Gerente de Obras y Mantenimiento.



C.c.p.- Dra. Florencia Serranía Soto, Directora General
Mtro. Jesús Antonio Esteve Medina, Secretario de Obras y Servicios.
Lic. Julio Iván Martínez Toledo, Director de Medios del STC.
Minutero de la Dirección General.

PSSJULIT

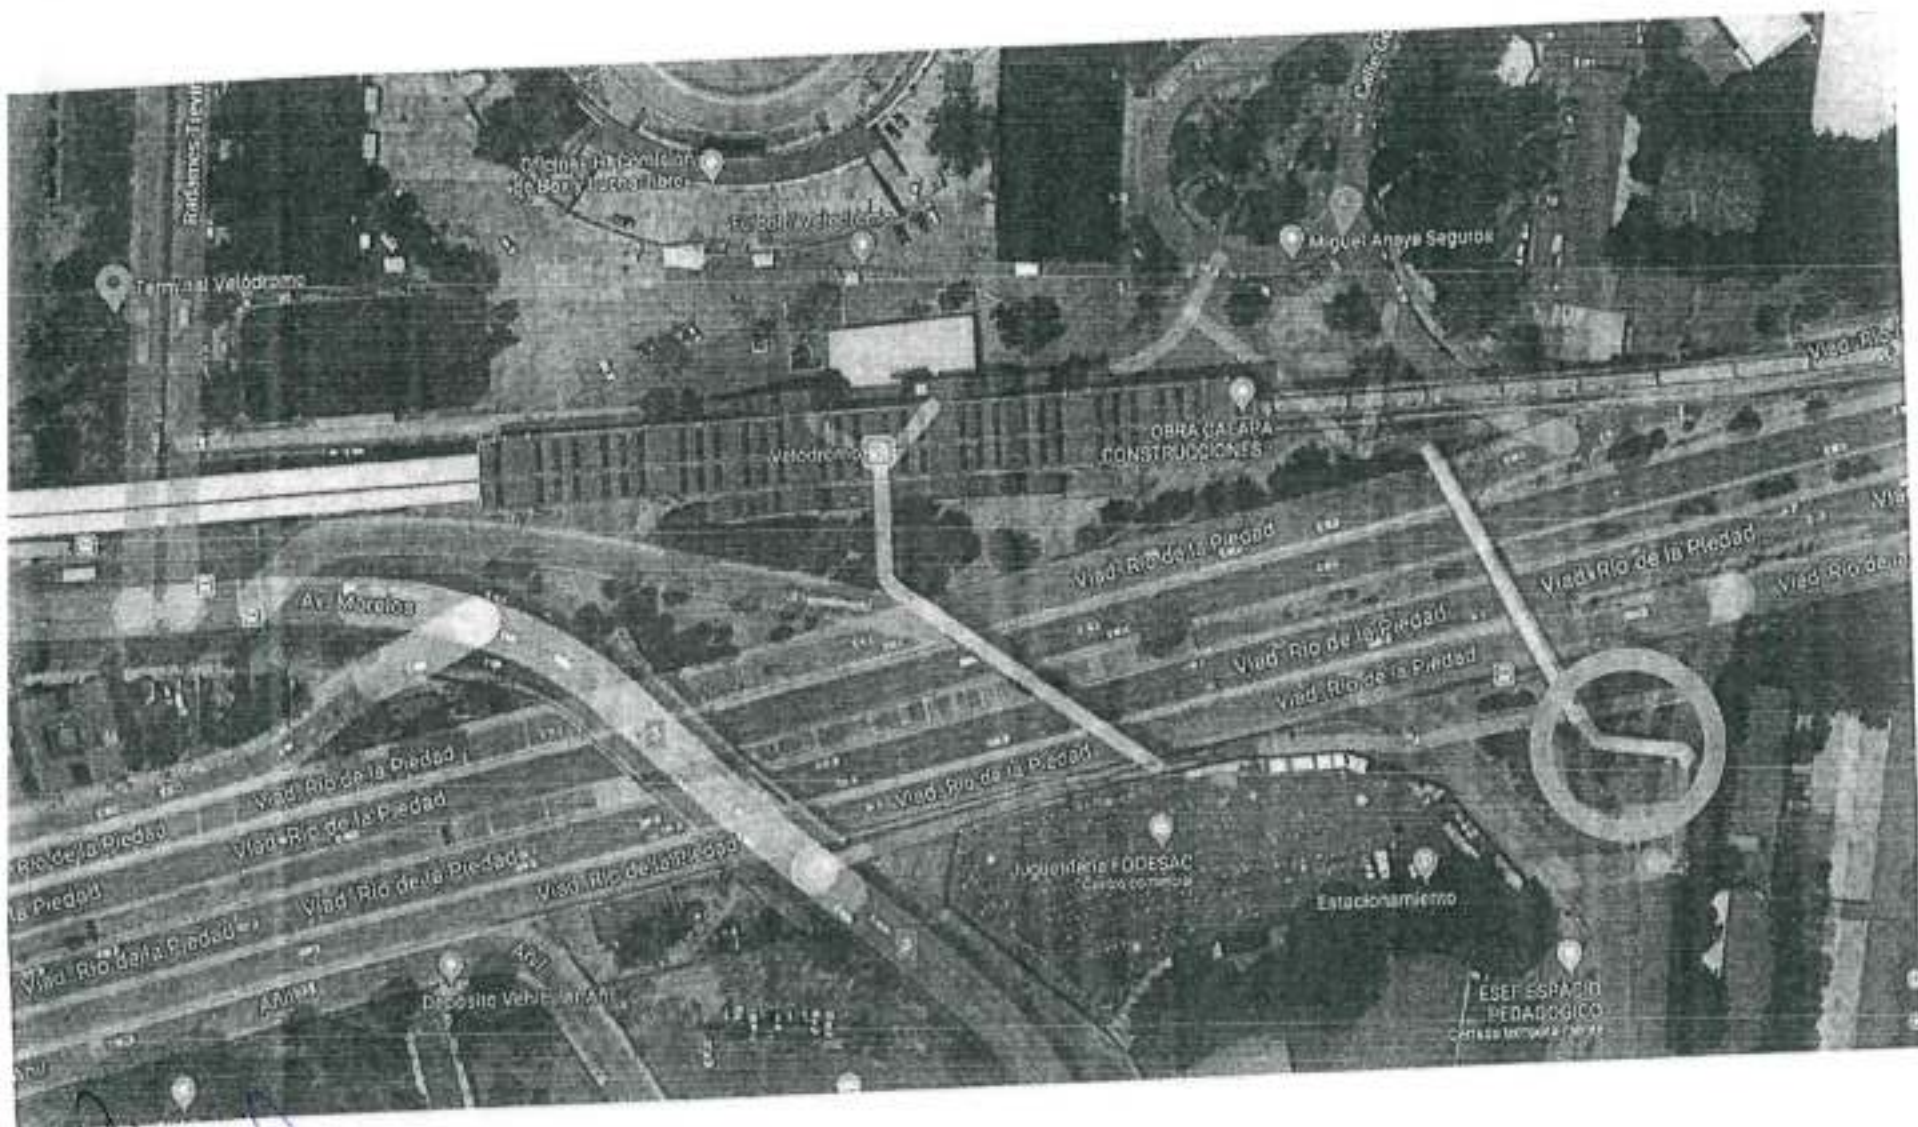

DATE: 10/10/2019

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Daños en puente peatonal

Viaducto acera sur / Estación Velódromo Línea 9

Anexo fotográfico
29 de marzo 2021



29/3/21

DAÑOS OBSERVABLES EN SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN PEATONAL




DAÑOS OBSERVABLES EN SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN PEATONAL




Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

DAÑOS OBSERVABLES EN SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN PEATONAL

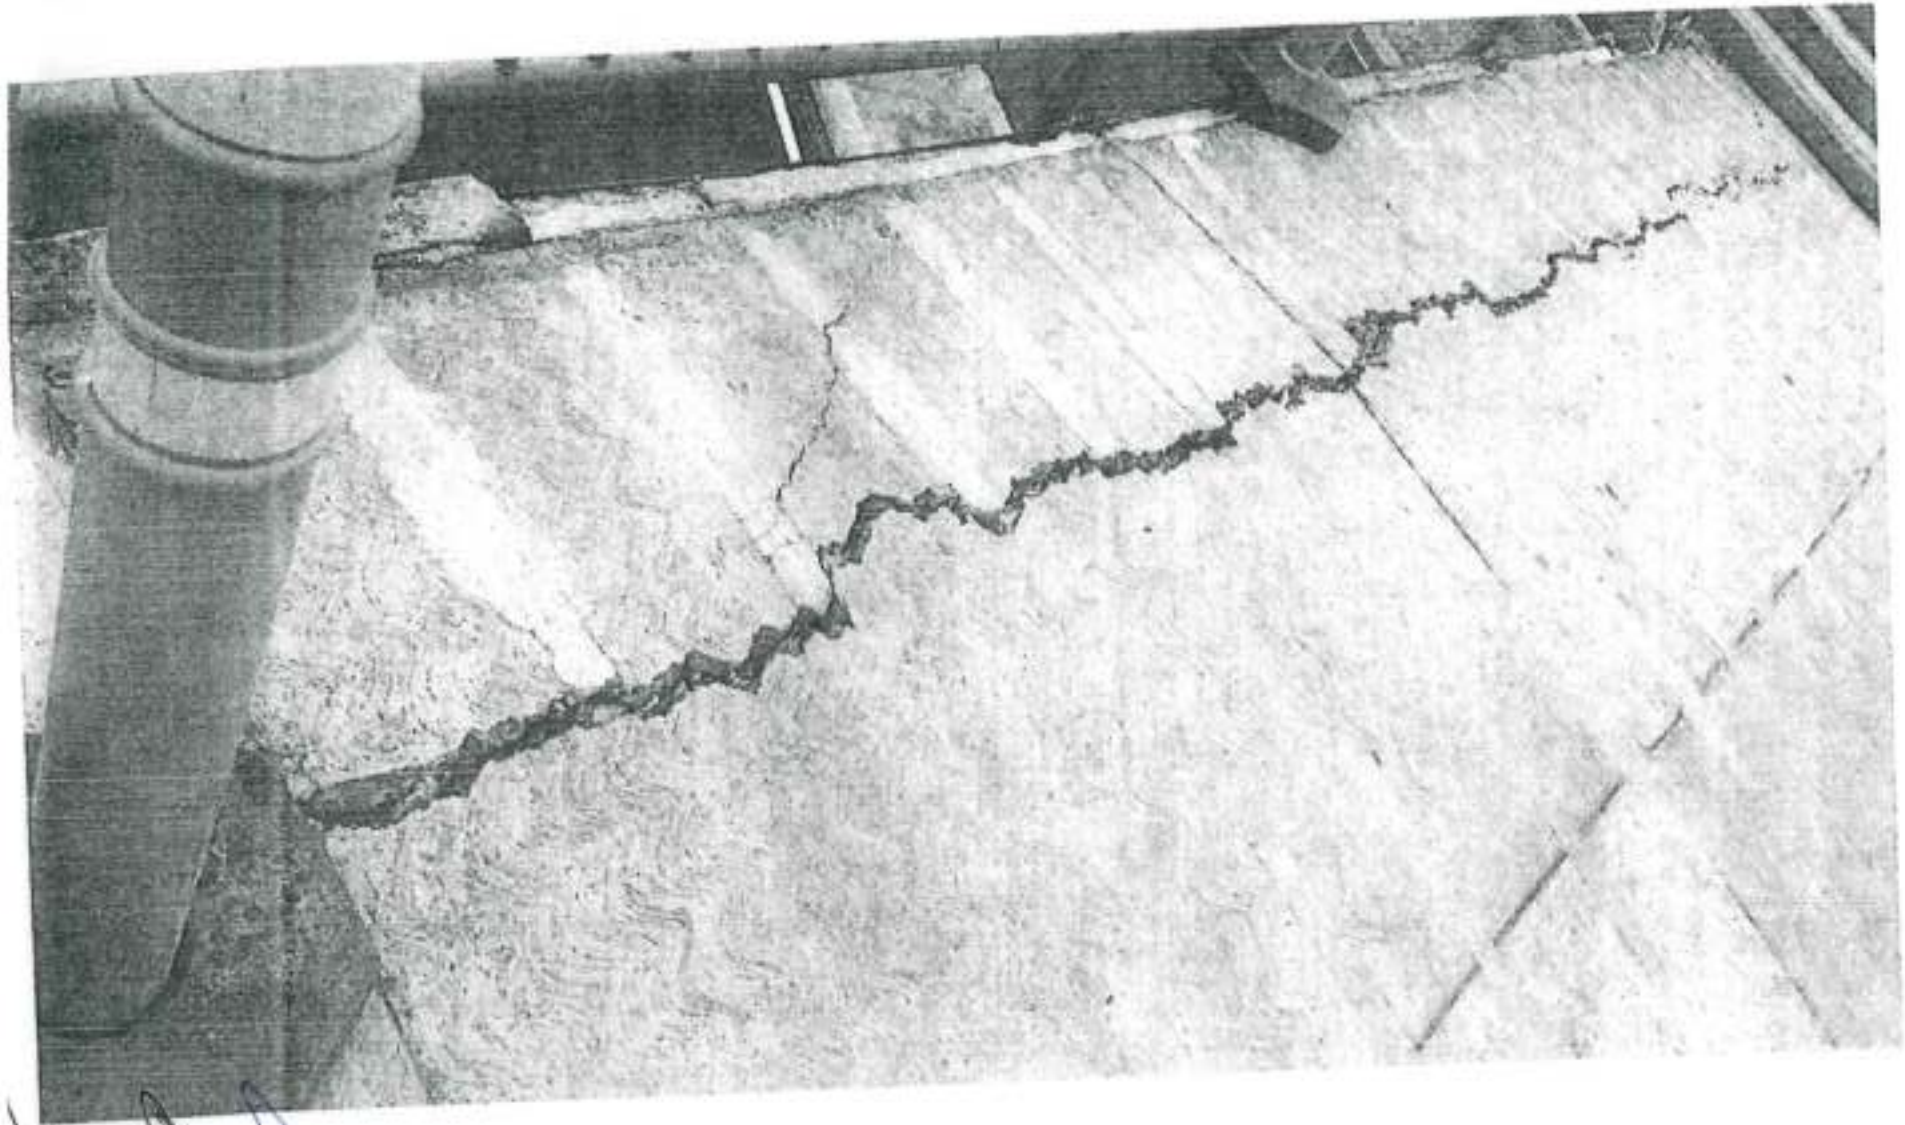


Handwritten blue ink marks, including a checkmark and a signature, are visible in the bottom left corner of the page.

DAÑOS OBSERVABLES EN SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN PEATONAL

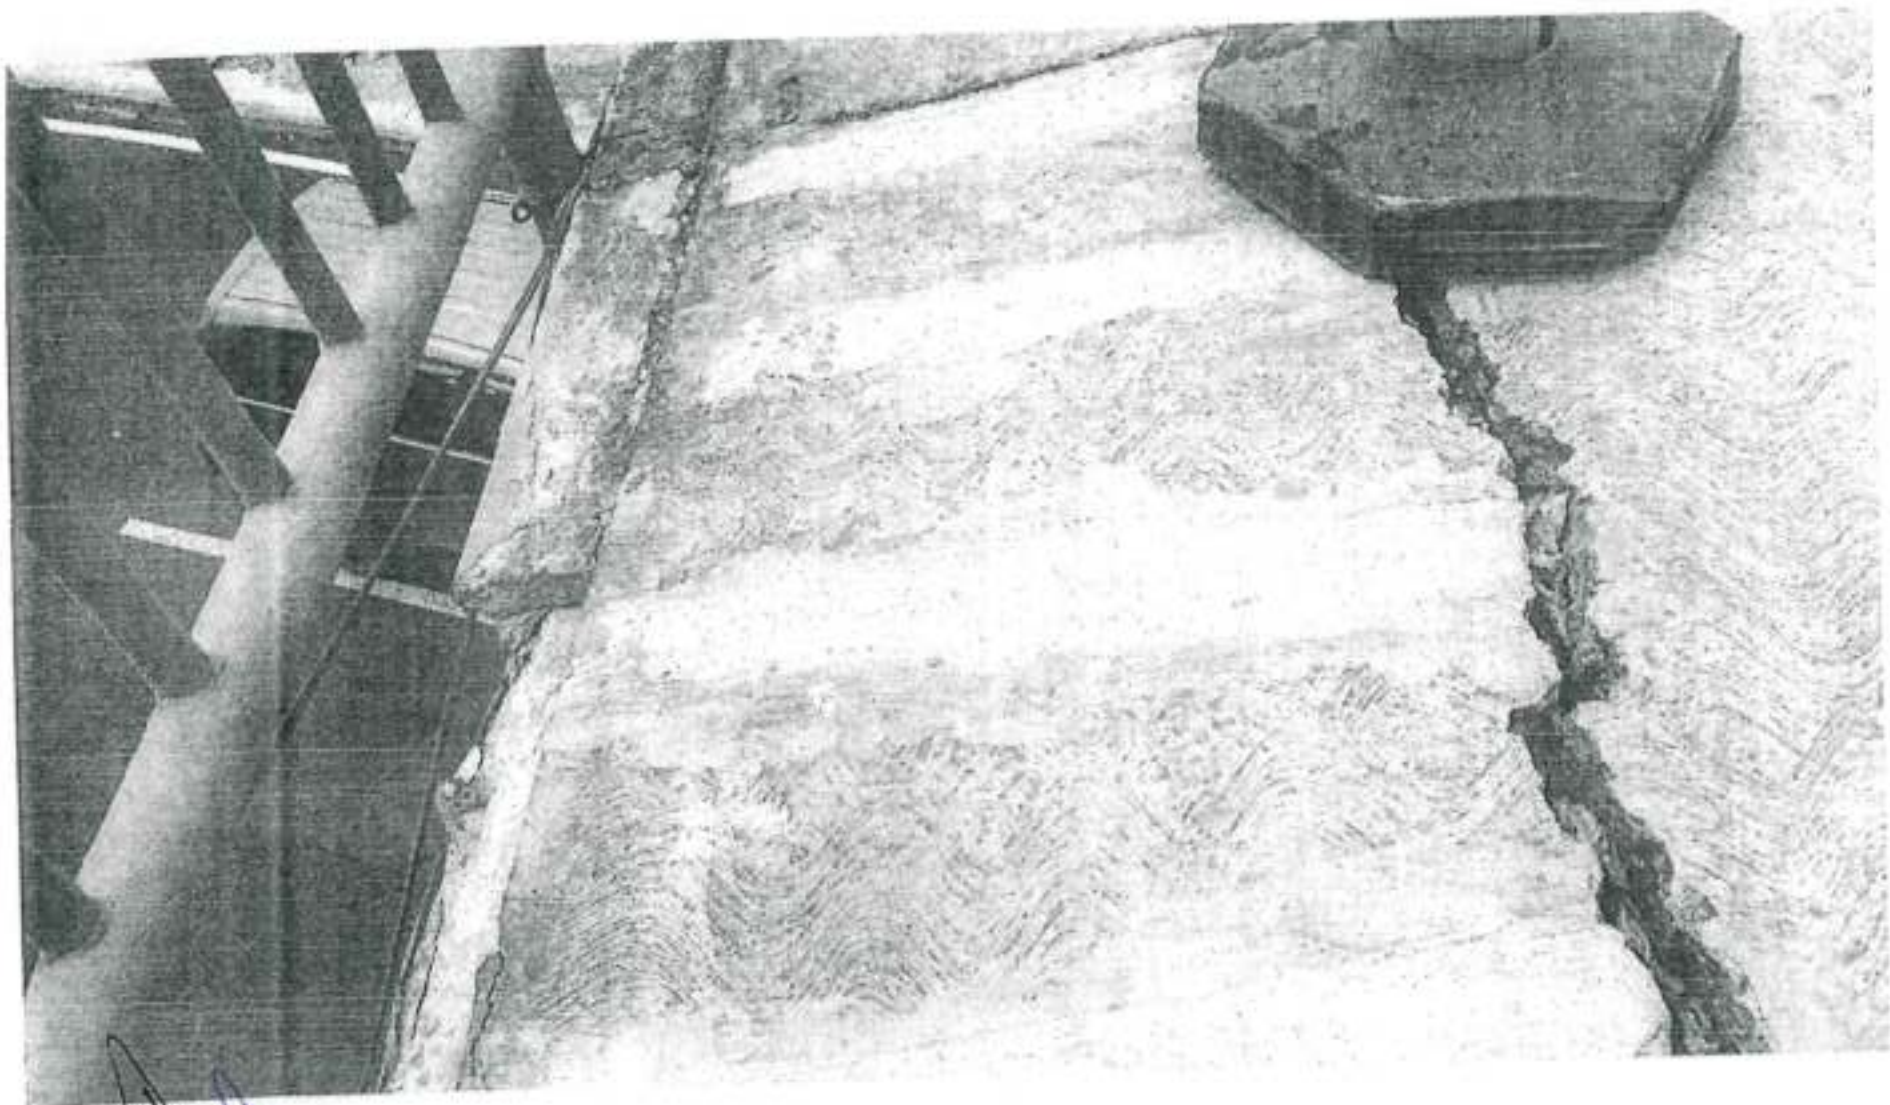


Handwritten signature in blue ink.

DAÑOS OBSERVABLES EN SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN PEATONAL

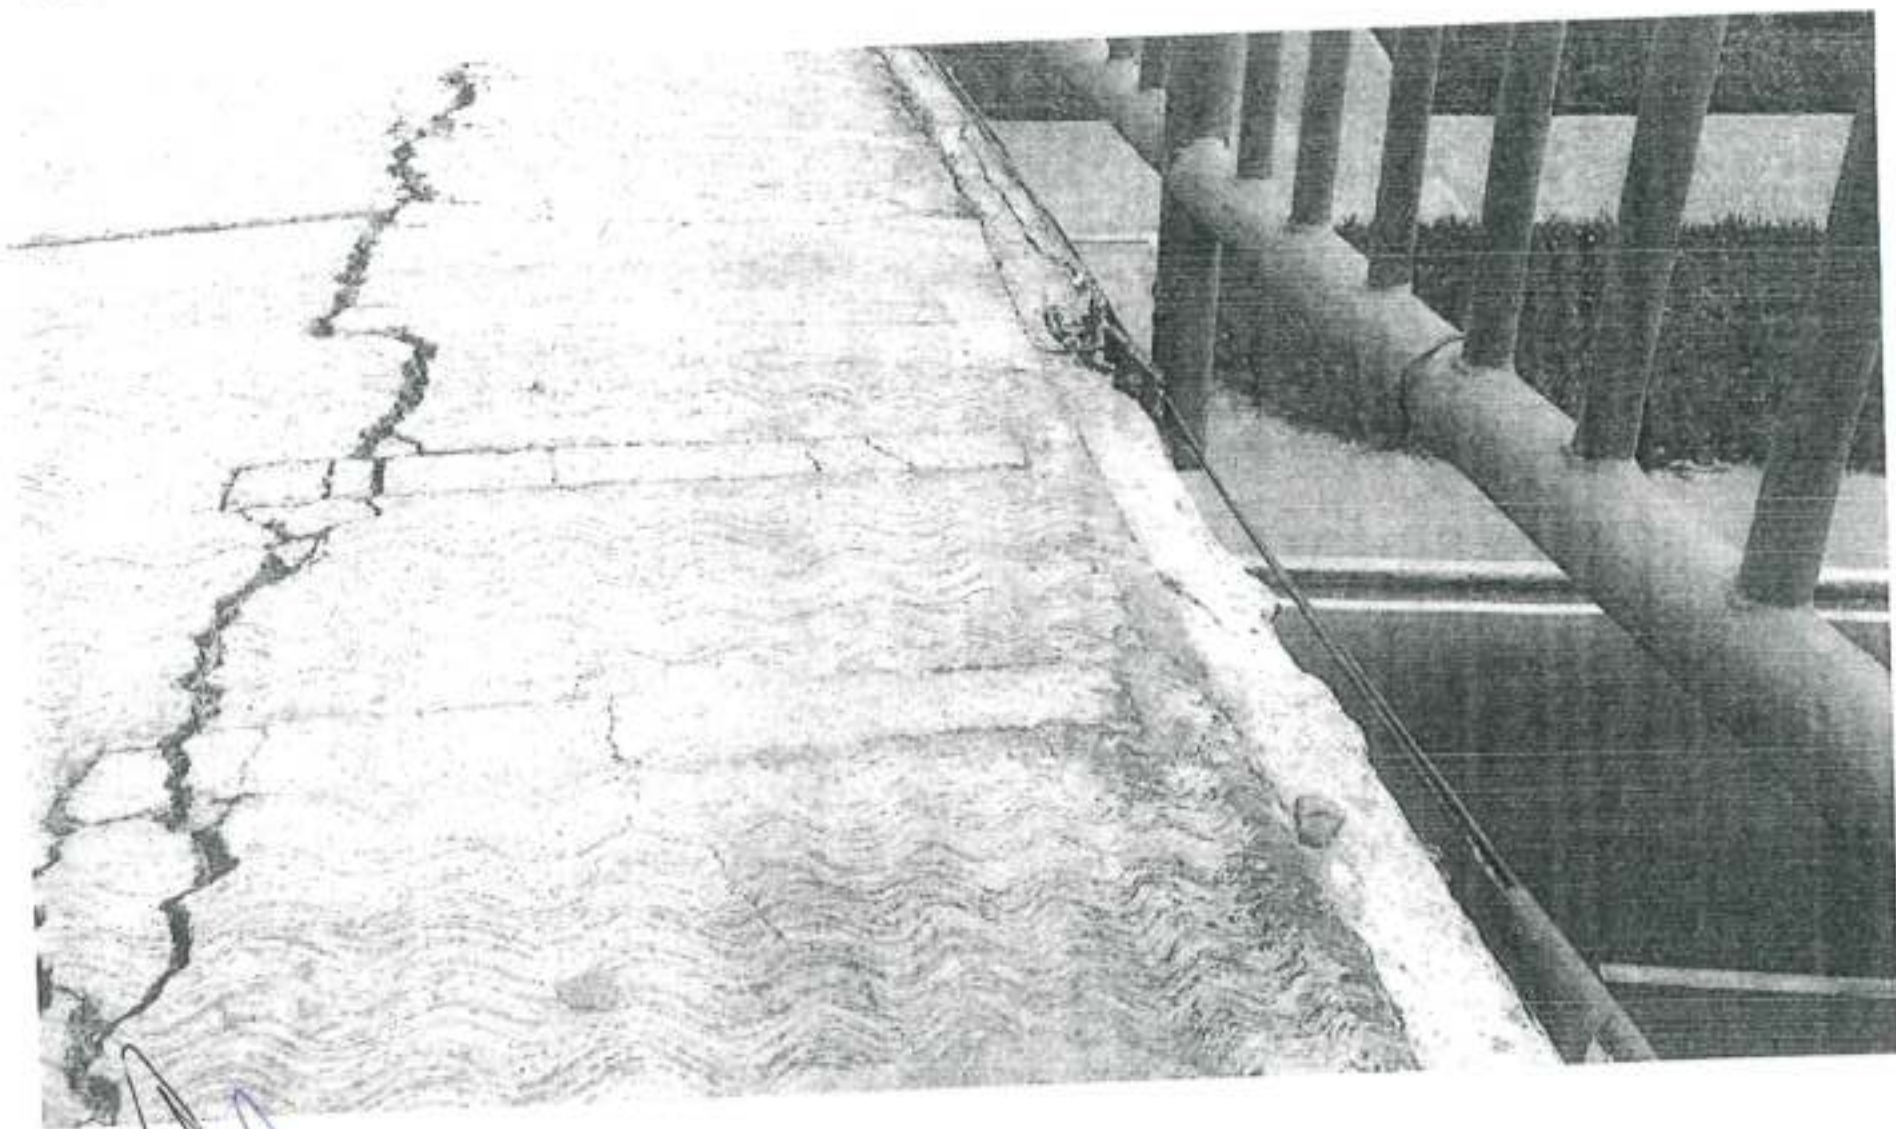

Handwritten notes in blue ink, including a signature and several arrows pointing towards the damaged area.

DAÑOS OBSERVABLES EN SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN PEATONAL

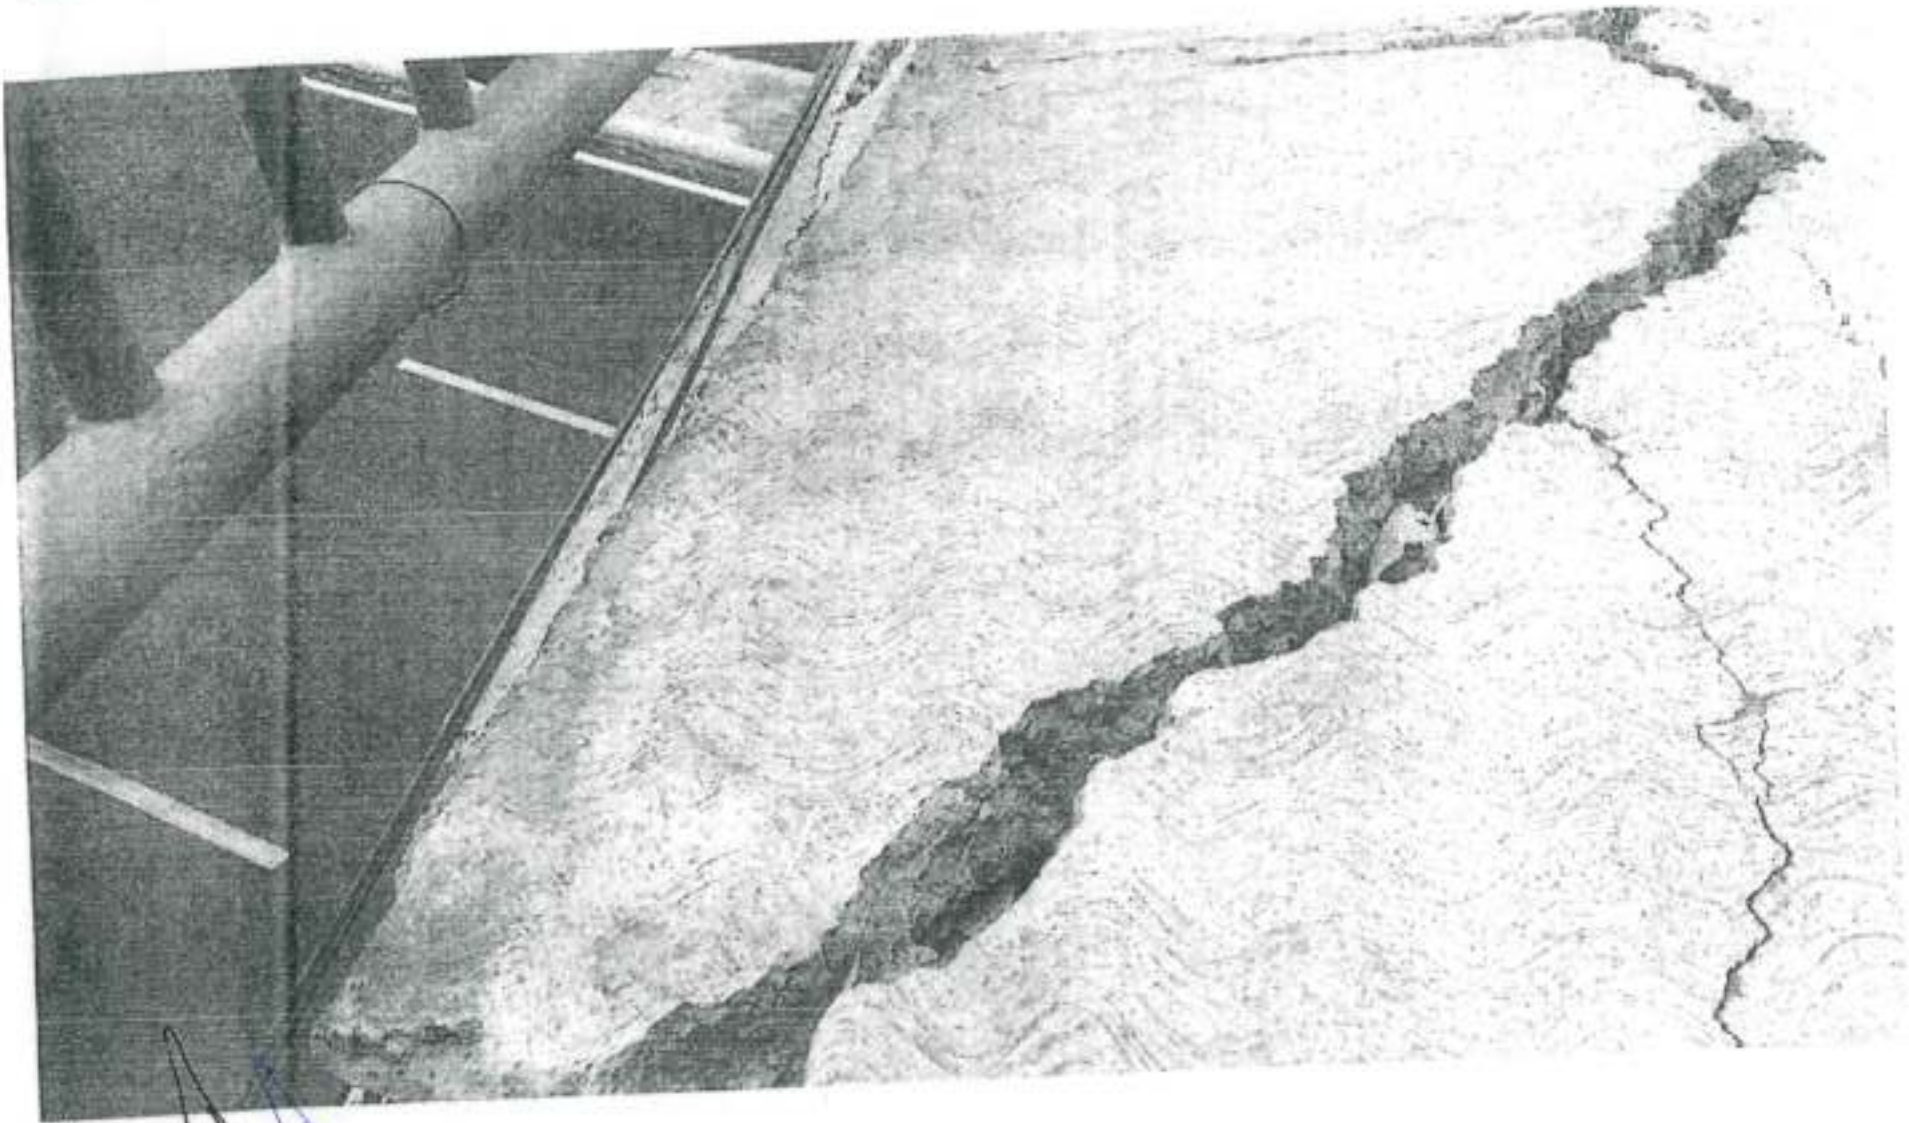


Handwritten signatures and markings in blue ink, including a large 'S' and a signature that appears to be 'J. L. L.'.

DAÑOS OBSERVABLES EN SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN PEATONAL



Handwritten signature and blue ink markings.

DAÑOS OBSERVABLES EN SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN PEATONAL

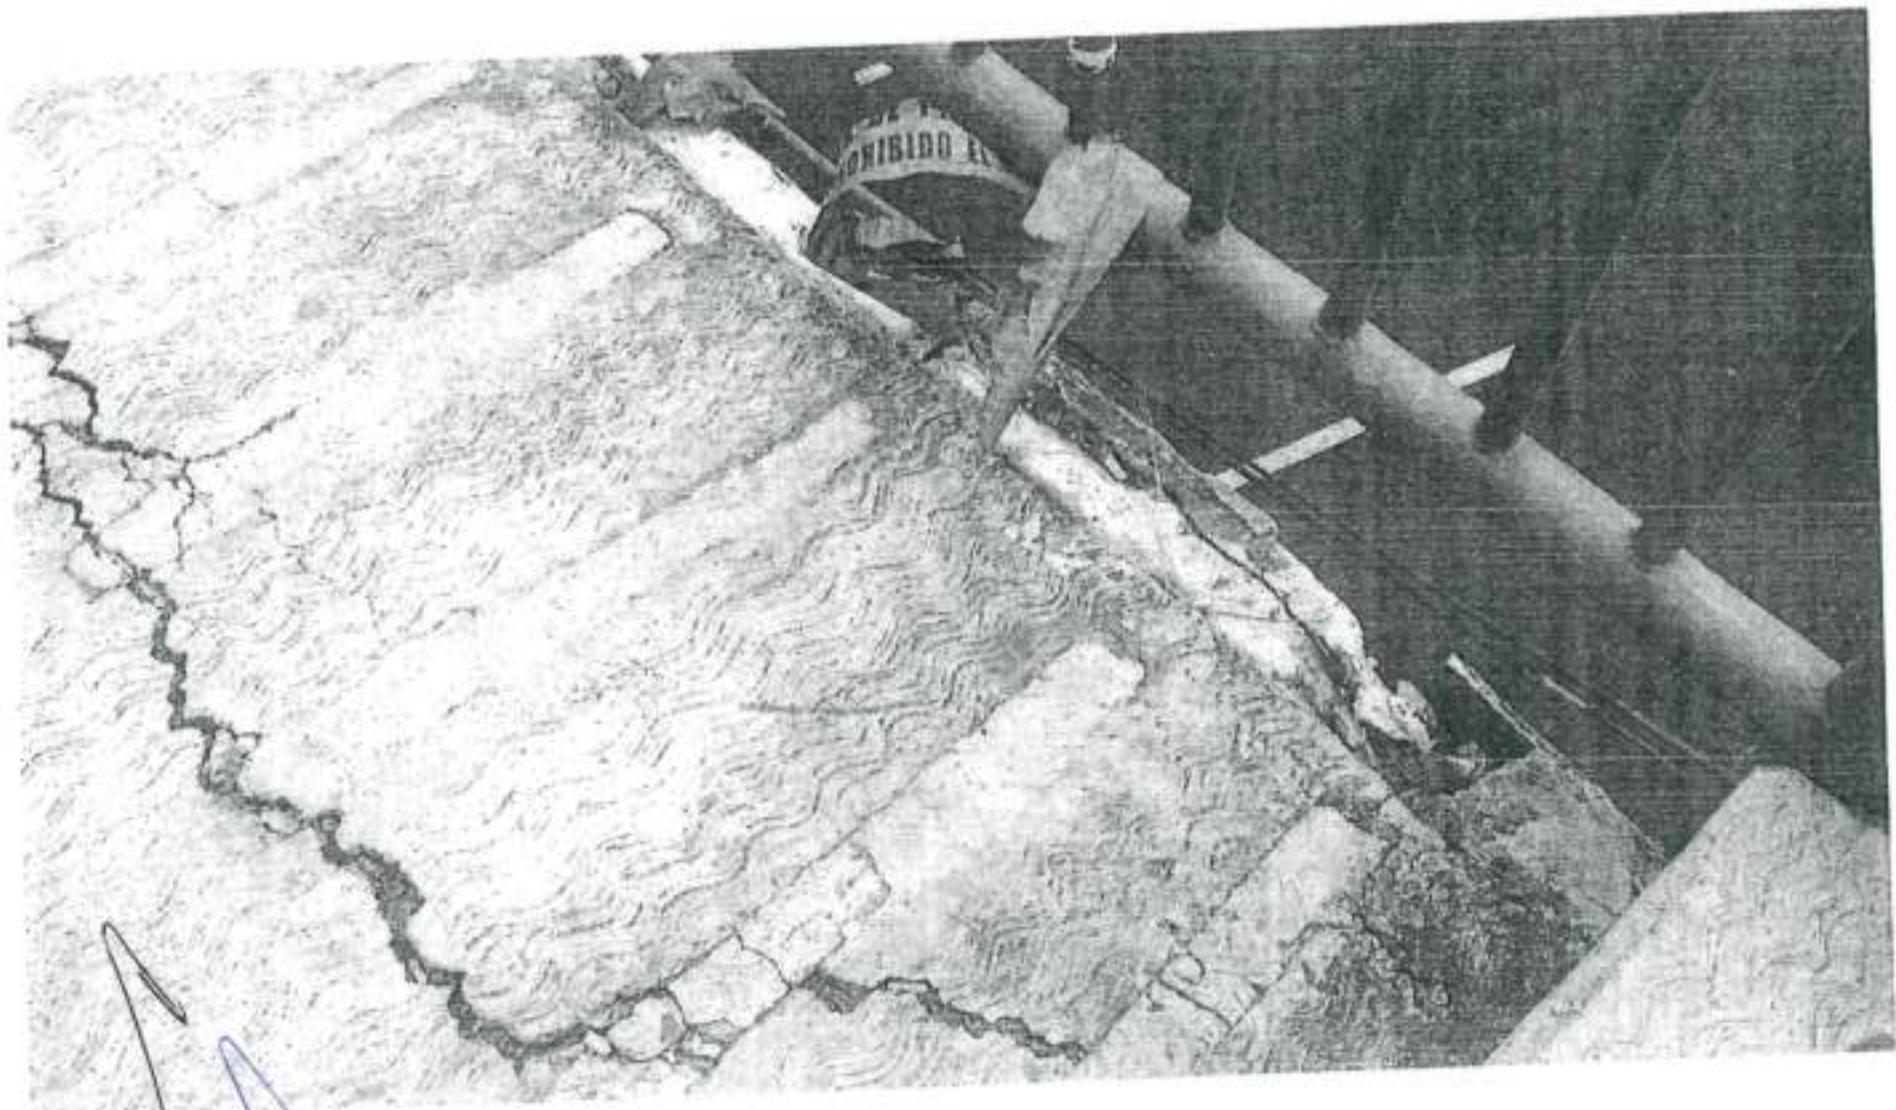

[Firma]
[Firma]

DAÑOS OBSERVABLES EN SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN PEATONAL



DAÑOS OBSERVABLES EN ESTRUCTURA




DAÑOS OBSERVABLES EN ESTRUCTURA



Handwritten notes in blue ink, including a signature and several lines of text.

UBICACIÓN DEL PUENTE PEATONAL

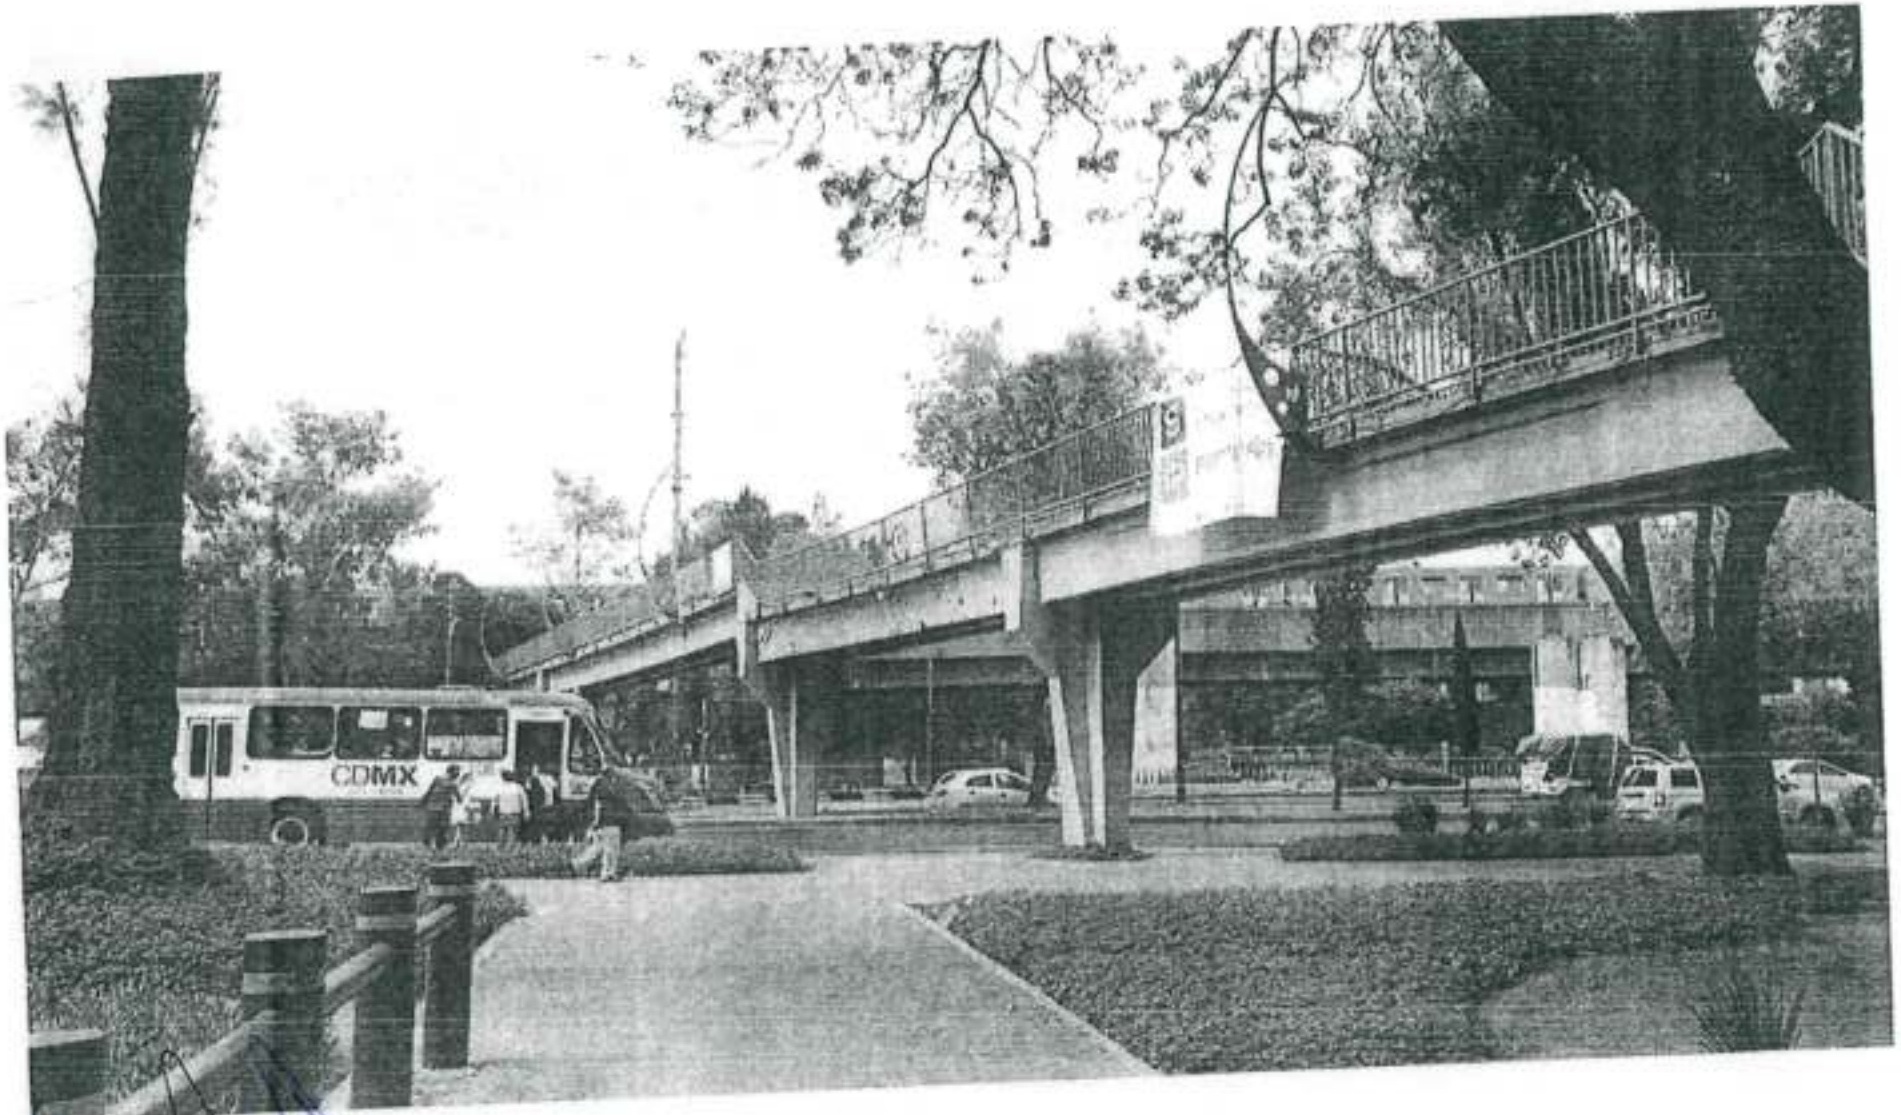

UBICACIÓN DEL PUENTE PEATONAL



Handwritten blue ink marks, including a star and several lines, located in the bottom left corner of the page.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(ANEXO 2)



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas "A"
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

ACT 157

Ciudad de México a 07 de abril de 2021
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP"A"/07.04.21/0007

Ing. Alejandra Flores Saldívar
Gerente de Obras y Mantenimiento
del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Presente

En atención a su oficio de **Clave:70200, Ref:GOM/21-0391**, de fecha 29 de marzo de 2021, en donde nos hace referencia al puente peatonal que comunica la acera sur de Viaducto Río de la Piedad con la estación Velódromo Línea 9 de sus instalaciones, el cual presenta una grieta en la superficie de circulación peatonal, nos solicita lo siguiente:

".. que se efectuó el diagnostico, diseño de la intervención integral y su respectiva ejecución de manera ágil para anticiparnos a cualquier percance que pudiera sufrir las personas usuarias." (sic)

De lo anterior le comento que se realizó una inspección visual con el personal de la Dirección General de Obra Públicas conjuntamente con la empresa que realizará los trabajos, con la asistencia de un DRO. en estructuras, el cual realizó una inspección y evaluación para la realización de un dictamen, de las condiciones que guarda el puente peatonal. (De lo anterior anexo reporte de dicha visita).

Sin otro en particular reciba un cordial saludo

Atentamente


ING. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

C.c.c.a.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Ornela.- Director General de Construcción de Obras Públicas.- jfuentes@cdmx.gob.mx
Ing. Raúl Márquez Martínez.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2".- rmrquez@cdmx.gob.mx

DIRECCION GENERAL CONSTRUCCION DE
OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS Y



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



INSPECCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VIADUCTO

» DESCRIPCIÓN:

Puente peatonal con cabezales y columnas de concreto reforzado y vigas preesforzadas que libran seis claros, con traveses tipo AASHTO-III y pasarela fabricada de concreto, tres escalinatas con alfardeas de concreto y escalones colados monolíticamente, así como barandales de sección tubular.

» REPORTE:

Puente Peatonal que en su claro correspondiente de la lateral lado sur, presenta daños en sus elementos estructurales, provocados por impactos de vehículos con exceso de dimensión en altura, ya que en ese punto de su sección vertical, ha perdido galibo; lo que ha inducido un desplazamiento transversal en su alma y patín, que se pueden visualizar en la parte superior de la pasarela con agrietamientos en toda su longitud de la losa.

En el claro correspondiente a la incorporación de la Calle Atletas a Viaducto Rio de la Piedad; del mismo puente, con un ligero desplazamiento transversal, a lo largo de la trabe tipo AASTHO, que en menor escala presenta la misma problemática referente al galibo.




[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

PUENTE VIADUCTO DE LA PIEDAD Y ATLETAS

» Croquis

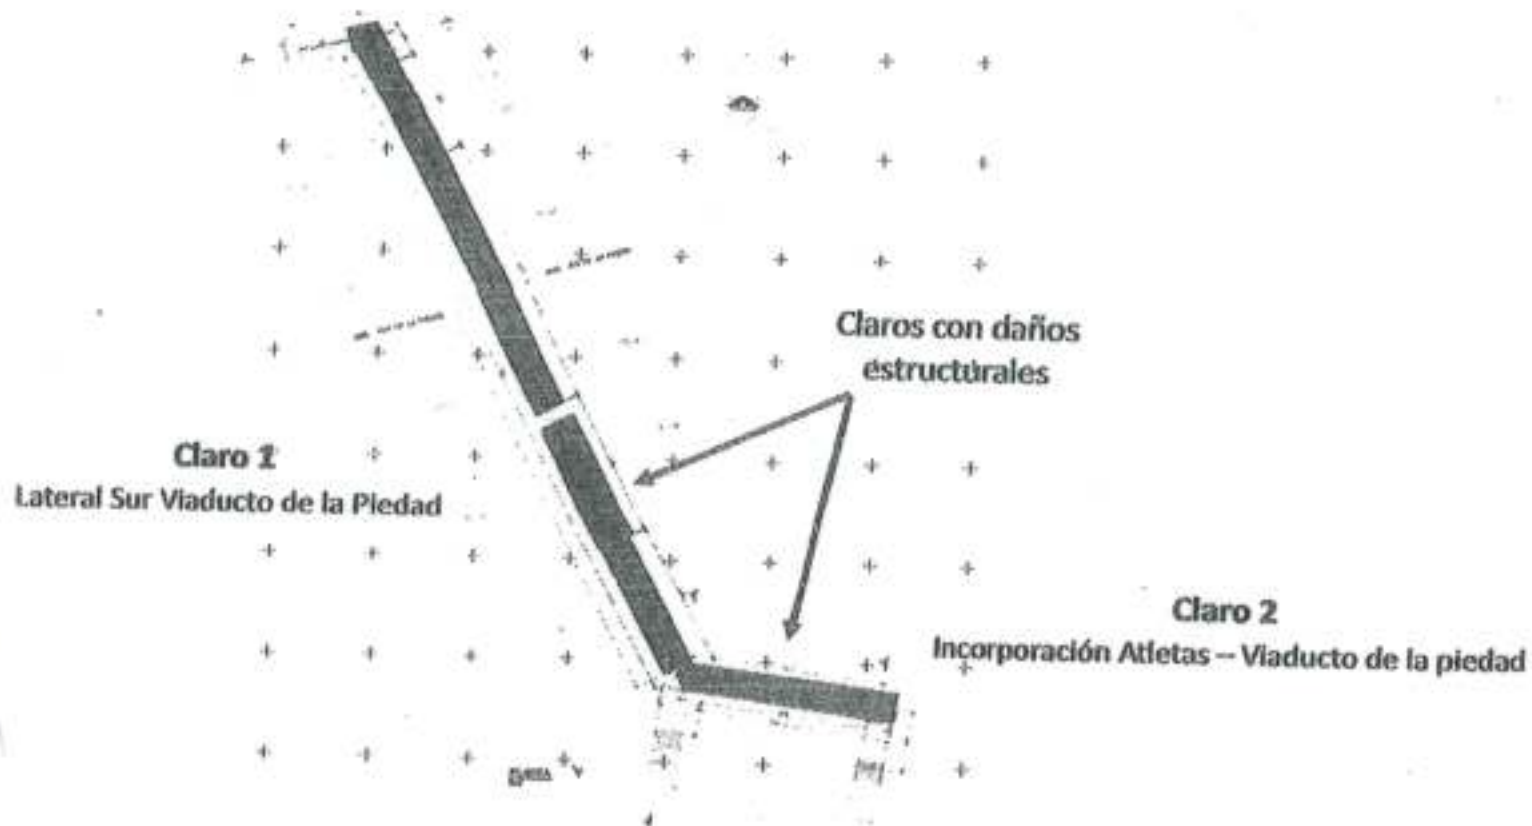



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PUENTE PEATONAL EN VIADUCTO

» ACCIONES:

Se realizó una Inspección visual con el personal de la Dirección General de Obra Públicas conjuntamente con la empresa que realizará los trabajos.

Se hizo la solicitud a la empresa de la asistencia de un DRO. en estructuras, el cual realizó una inspección, evaluación y dictamen, de las condiciones que guarda el puente peatonal.

» OBSERVACIONES:

Cabe mencionar que el puente peatonal, se encuentra en uso continuo derivado el operativo implementado por el Órgano Regulador del Transporte para dar apoyo a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por los mantenimientos que se están realizando en sus instalaciones, del tramo Velódromo a Pantitlán con unidades de transporte.

Por otro lado la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transporte Modal, informan que dichas acciones se llevarán a cabo hasta el 18 de abril del presente año.

CLARO #1

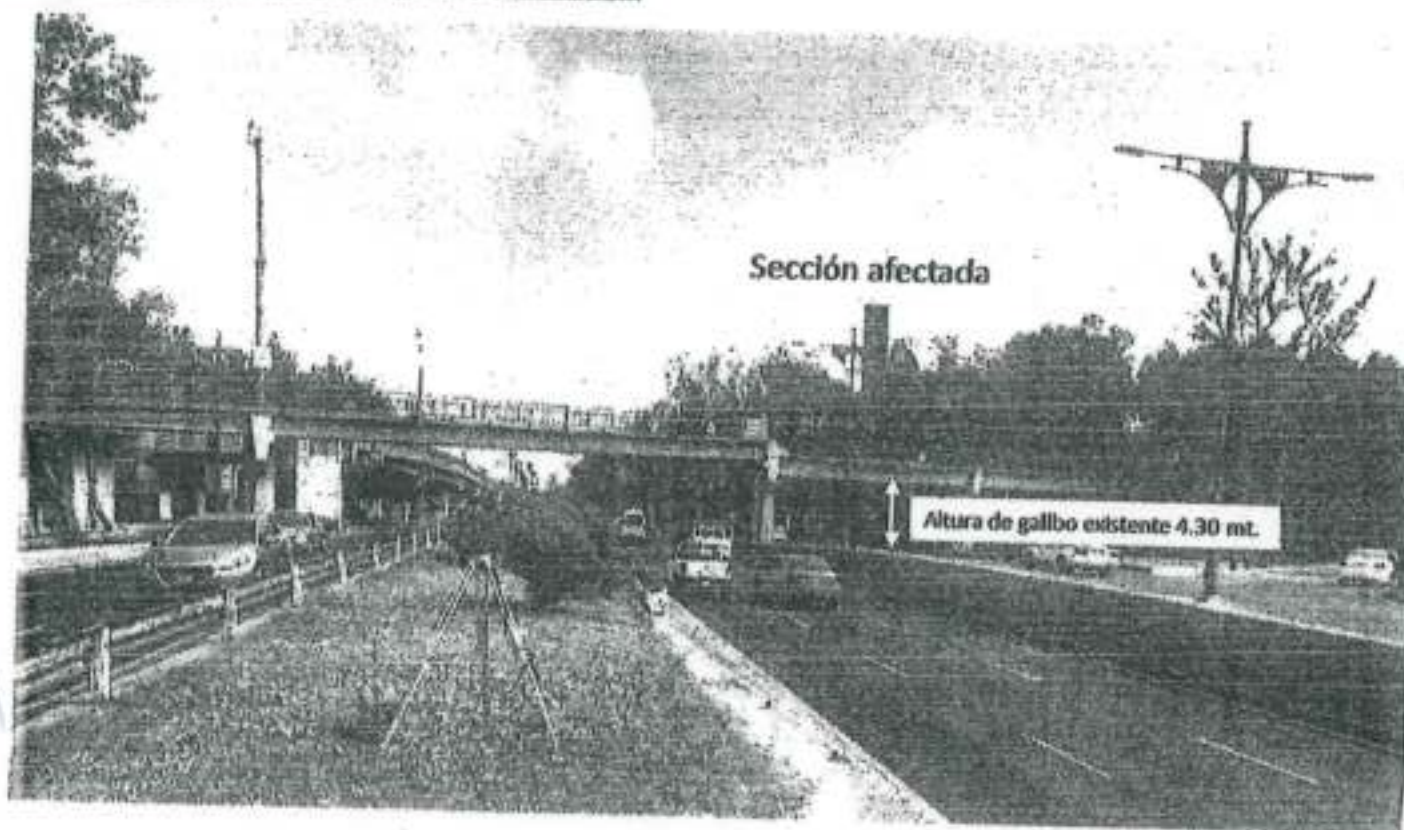


Imagen-1 Puente Peatonal

CLARO #1



Imagen-2 Vista poniente del Claro Dañado.

CLARO #1



Imagen-3 Vista Lateral Del Puente.

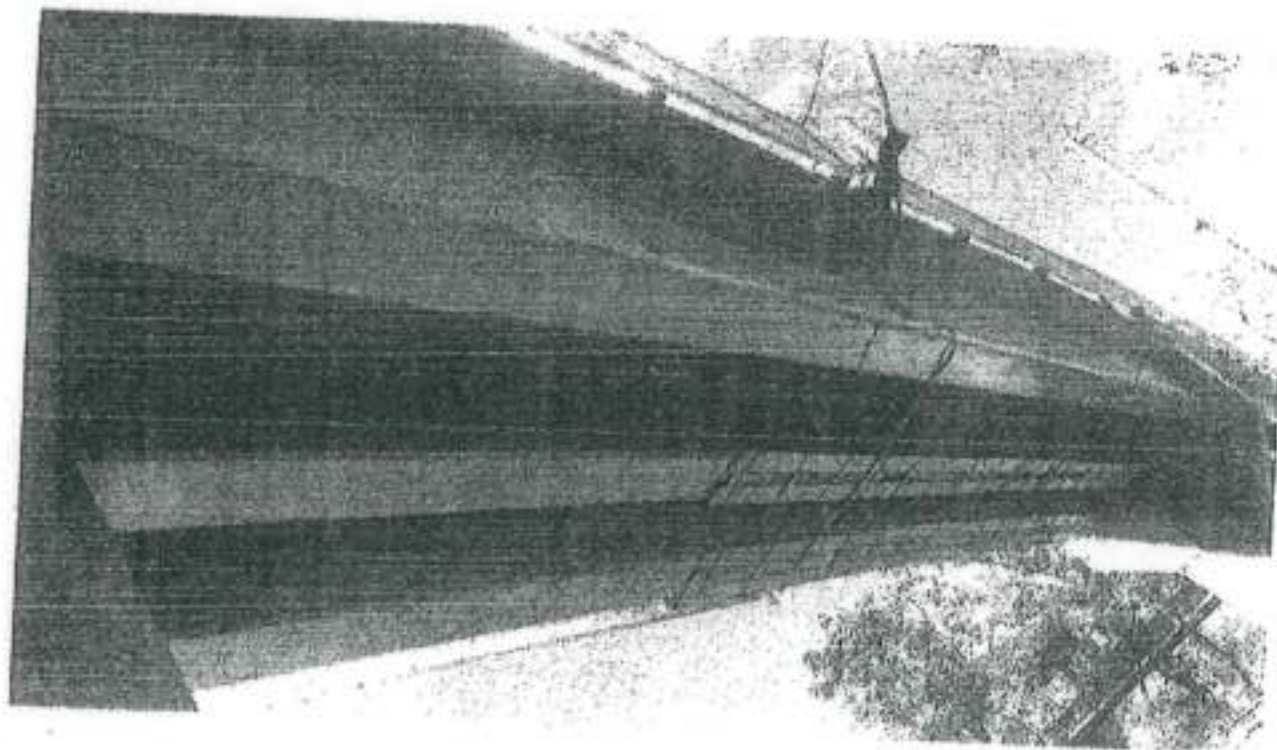


imagen-4 Reforzamiento de trabes.

[Handwritten signature in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

CLARO #1





Imagen-5, Pasarela fracturada en zona de trabe dañada.

Handwritten signatures and marks in blue ink.

CLARO #1

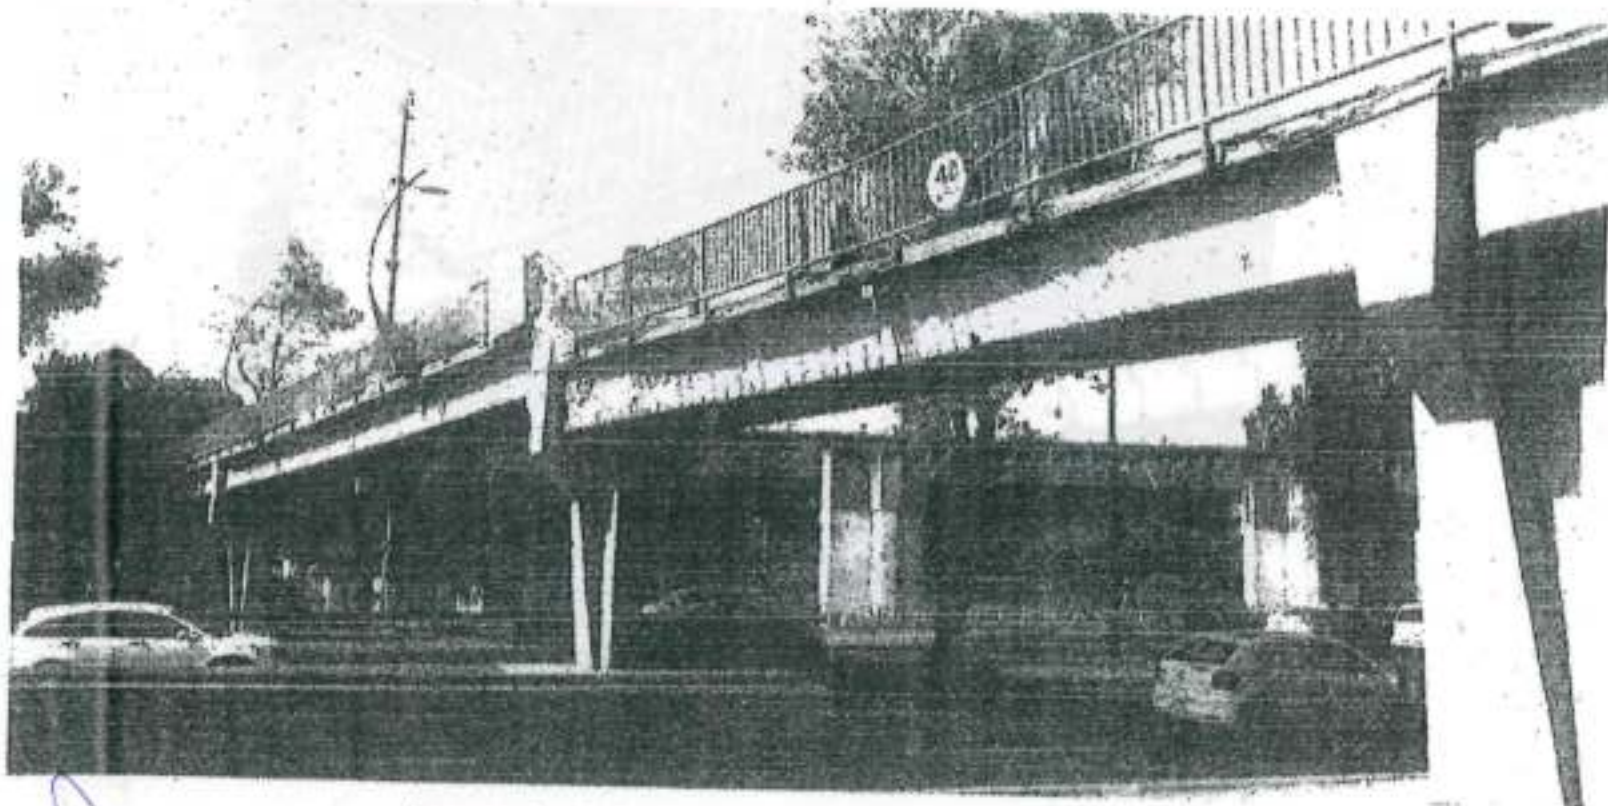


Imagen-6, Reforzamiento con estribos externos.

CLARO #1

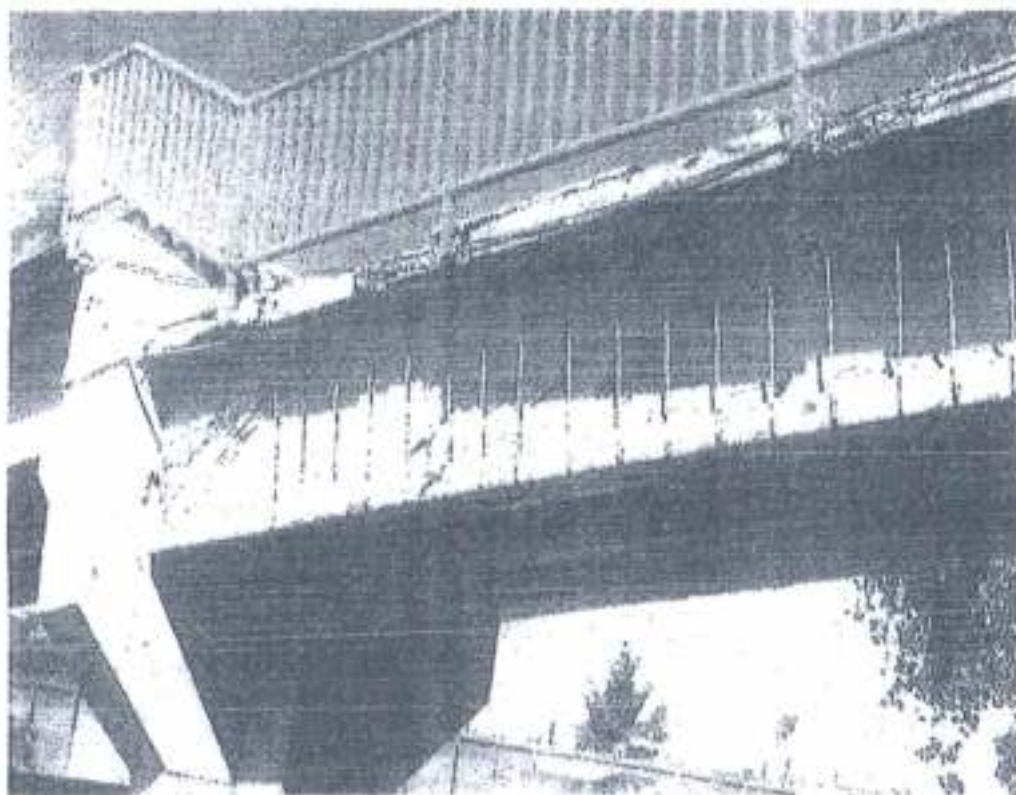


Imagen-7, Daño en alma y patín de la trabe, en lateral sur

CLARO #2



Imagen-8, Trabe #2 reforzamiento externo.

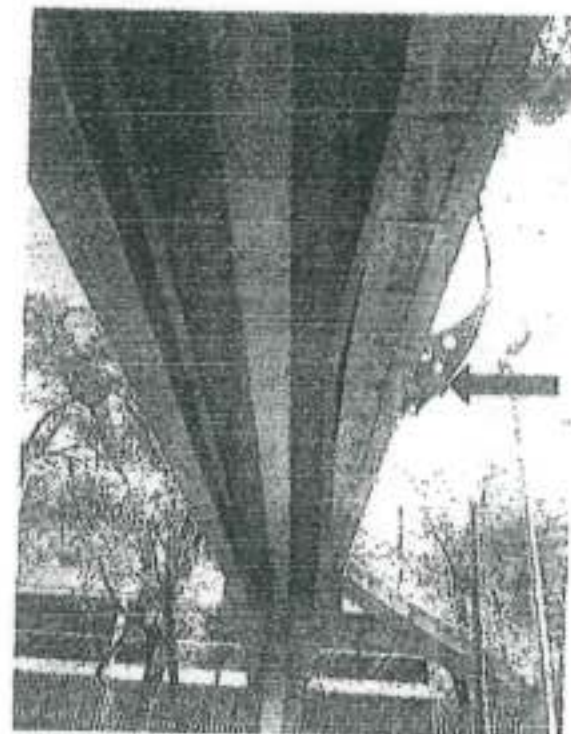


Imagen-9, Detalle trabe con
reforzamiento externo.

CLARO #2



Imagen-10 y 11, Desplazamiento transversal a lo largo del elemento estructural (trabe).

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized signature and a small cross-like mark.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Handwritten signature in blue ink

Handwritten mark in black ink

Handwritten signature in purple ink



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS,
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(ANEXO 3)

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,
C.P. 015800, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 5764-14-15 Ext. 212



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas "A"
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/09.07.21/0004

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS.

Presente

Con relación al Proyecto de Inversión 021NR0038 denominado "MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO", le comento que la Dirección General de Construcción de Obras Públicas instruye a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", para llevar a cabo los trabajos de "RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL, UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE UNA EMERGENCIA", en virtud de que en dicho puente se presentan severos daños en las trabes de concreto presforzado de tres de sus claros, y agrietamientos en las pasarelas de concreto, derivado de que se tiene un galíbo menor al que permite la norma y esto produce que los vehículos de gran dimensión que transitan por la vialidad impacten con el puente, lo cual por los daños que se tiene pone en grave riesgo a la ciudadanía que transita la zona por posible riesgo de un colapso.

Por lo anteriormente expuesto y derivado de que se trata de una EMERGENCIA, le agradeceré que se lleven a cabo las gestiones correspondientes, con el fin de que se solicite el otorgamiento de la suficiencia presupuestal de recursos requeridos ante la Secretaría de Administración y Finanzas, Subsecretaría de Egresos.

Para tal efecto, anexo la Ficha Técnica del Proyecto de Inversión para el Presupuesto de Egresos 2021, para los efectos conducentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"



C. C. E. P. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, -Director General de Construcción de Obras Públicas. - juan@sedcmx.gob.mx
Ing. Raúl Márquez Martínez, -Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2". - rmarquezm@cdmx.gob.mx

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,
Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 15850 TEL. 57642638 Ext. 212

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(ANEXO 4)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 30 de agosto de 2021
CDMX/SOBSE/DGAF/4425 /2021

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/18.08.21/001 mediante el cual envía propuesta de Afectación Presupuestaria Compensada, consistente en la reducción del presupuesto autorizado del proyecto 021NR0291 denominado: "Construcción del Puente Vehicular Chamixto", por un monto de \$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), para ser readecuados al proyecto 021NR0038 denominado "Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México", por un monto de \$2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100M.N.) y al proyecto denominado "Demolición, retiro y construcción de una sección del muro de contención, ubicado en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las calles Lomas y Sauce, colonia Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México" por un monto de \$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100M.N.) así mismo envía las Requisiciones de Obra DCOP "A" 007-2021 y DCOP "A" 008-2021 para otorgar suficiencia presupuestal, así como las fichas técnicas de los proyectos correspondientes.

Al respecto, le informo que se solicitó la Afectación Presupuestaria Compensada No. A 07 C0 01 7898 (anexo), por un importe de \$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), la cual fue registrada por la Dirección General de Gasto Eficiente B y se solicitaron las Fichas Técnicas correspondientes mismas que fueron autorizadas por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación de Gasto.

En el mismo sentido, le envío con suficiencia presupuestal las Requisiciones de Obra DCOP "A" 007 y DCOP "A"-008-2021 (anexas), mismas que han sido registradas dentro de nuestros controles presupuestales conforme al calendario autorizado que se detalla a continuación:

PL	F	SP	AS	PP	FE	FU	FE	AD	GR	PTDA	TG	DI	CG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE (PESOS)
2	2	2	049	0005	15	0	1	1	0	0151	2	1	00	021NR0038	DCOP "A" 007-2021	2,300,000.00
Denominación Del Proyecto																
"Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México"																
2	2	2	049	0005	15	0	1	1	0	0151	2	1	00	021NR0001	DCOP "A" 008-2021	700,000.00
Denominación Del Proyecto																
"Demolición, retiro y construcción de una sección del muro de contención ubicado en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las calles Loma y Sauce, colonia Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México"																

No omito comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dicha requisición, la cual no exige de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Cabe señalar, que el requisitado de la misma es responsabilidad del área requirente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.C.E.R.N. HTRA. Guadalupe Enríque Sánchez. - Dirección Financiera en la SOBSE - gsibilla@cdm.cob.mx
Mtra. Ricardo Cedillo del Río. - Subdirector de Administración de Recursos Financieros de Obras Públicas - ricardo_cedillo@obras.cdm.mx
Lic. Ángel Calderón Cruz. - Subdirector de Planeación y Control Presupuestal en la SOBSE - angelcalderon@obras.cdm.mx

DSAF - 7734 SPDP - 1268
GES/ACC/COFP/alz



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA.

(ANEXO 5)

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca.
C.P. 015650, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 5764-14-15 Ext. 212

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2021

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SARFOP/31.08.21/001

ING. FRANCISCO MAXIMO IZQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
P R E S E N T E

Por medio de la presente anexo copia del oficio número CDMX/SOBSE/DGAF/4425/2021 de fecha 30 de agosto de 2021, se hace de conocimiento la readecuación de recursos de los siguientes dos proyectos:

1. O21NR0038, denominado: "Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias", por un monto de \$2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
2. O21NR0803 denominado: "Demolición, retiro y construcción de una sección del muro de contención, ubicado en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las calles Lomas y Sauca, colonia Rancho Tejomilco, Pueblo Santa María Nativitas en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México", por un monto de \$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

En tal sentido anexo dos Requisiciones de Obra DCOP "A" 007-2021 y DCOP "A" 008-2021 por las cantidades de \$2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) y \$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Cc: Ing. Juan Carlos Pineda Guevara, Director General de Construcción de Obras Públicas, JuanCarlos.Pineda@cdmx.gob.mx
C.P. Rodolfo Becerra Rosales, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas, Rodolfo.Becerra@cdmx.gob.mx
Atando al volante 04425/2021 y al DGCOP/001/21.08.21

		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
31 AGO. 2021 <i>C/ARECOS</i>		
RECIBIDO		
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"		
HORA 12:25 POR ISAAE6		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(ANEXO 6)





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/01.09.21/ 008

ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
PRESENTE

En atención al contenido del oficio número CDMX/SOBSE/DGAF/4425/2021, recibido en la oficina de correspondencia de esta Dirección General el día 31 de agosto de 2021, mediante el cual la Dirección General de Administración y Finanzas en esta Secretaría, informa el techo presupuestal autorizado para el presente ejercicio fiscal, en el cual se considera llevar a cabo por esta Unidad Administrativa el proyecto denominado **"Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México"**, por el importe señalado en el oficio antes citado (se anexa copia).

Al respecto, y de acuerdo al contenido de la Gaceta número **61 BIS** publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 29 de marzo de 2019, en la que se me autoriza a ejercer las facultades conferidas en el **"ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS TITULARES DE LAS SUBSECRETARÍAS, ÓRGANO DESCONCENTRADO, DIRECCIONES GENERALES Y DE ÁREA, EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN."**, la facultad para revisar, autorizar y suscribir dictámenes, justificaciones, contratos, convenios, substanciar, acordar, supervisar, revocar, modificar, incluyendo la rescisión terminación anticipada de estos últimos, hacer efectivas las garantías correspondientes y demás actos jurídicos y documentos relacionados con los mismos, en materia de obras públicas y servicios relacionados con ésta, que se celebren de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su correspondiente Reglamento y en su caso, emitir las copias certificadas de los documentos que obren o que tengan a la vista dentro de sus archivos sobre asuntos de su competencia; y de acuerdo a las atribuciones que tengo asignadas conforme a los artículos 41 fracciones II, XV y XVIII, y 206 fracción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en este acto se **DESIGNA** a esa Dirección a su digno cargo como **Área Responsable del Seguimiento y Ejecución de los Trabajos** antes señalados.

Lo anterior, para que se efectúe una adecuada planeación, programación, coordinación, aseguramiento y verificación, de todo lo relacionado con el proceso de contratación y ejecución hasta su total conclusión tanto técnica como administrativa de los trabajos en comento, lo anterior en estricto cumplimiento de la normatividad en materia de obra pública y demás aplicable, cuidando que se lleve a cabo en las mejores condiciones en cuanto a su calidad, financiamiento, oportunidad y economía.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Mr. L. Jesús Antonio Esteva Medina, -Secretario de Obras y Servicios, -secretariadesobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,
C.P. 016850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 5764-14-15 Ext. 203

		SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
E/ANEXO		
01 SEP. 2021		
RECIBIDO		
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"		
HORA 14:12 POR LA 03.4		

CUIDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS,
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(ANEXO 7)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2021.

CDMX/SOBSE/DGCOP/DCOP"A"/02.09.21/0004

ING. RAÚL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A2"
PRESENTE

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/01.09.21/008 de fecha 01 de septiembre de 2021 (anexo), a través del cual el Director General de Construcción de Obras Públicas instruye al suscrito para que como área responsable efectúe la adecuada planeación, programación, coordinación, aseguramiento y verificación de todo lo relacionado con el proceso hasta su total conclusión administrativa, para que se lleve a cabo la realización del "Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México", así como los trámites y gestiones necesarios, cuidando que se lleve a cabo en las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes.

Sobre este particular y dentro de las facultades que me son conferidas a través de la distribución de funciones y objetivos prevista en el Manual Administrativo, correspondiente a esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", se le **instruye** para que en el ámbito de su competencia y en estricto cumplimiento a la normatividad en materia de obras y demás aplicable, realice las actividades de contratación y ejecución de los trabajos antes referidos.

Lo anterior, debe realizarse observando en todo momento las disposiciones jurídicas, administrativas, y técnicas aplicables, obteniendo previamente a la firma de los documentos que se generen, según sea el caso, las autorizaciones y opiniones de las áreas competentes que corresponda, incluyendo la revisión de aspectos normativos cuando éstos procedan.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

C.C.C.E.P. Ing. Juan Carlos Fuentes Ornela. - Director General de Construcción de Obras Públicas. - jfuentes@cdmx.gob.mx


RECIBIDO 2/SEP/2021
POR RAÚL MÁRQUEZ MARTÍNEZ






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS,
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(ANEXO 8)

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,
C.P. 01560, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 5764-14-15 Ext. 212


CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA 



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2021

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/03.09.21/0001

ARQ. NANCY FABIOLA MONCADA BARRAGÁN
J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A5"
PRESENTE

En referencia al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/01.09.21/008 de fecha 01 de septiembre de 2021 (anexo), a través del cual el Director General de Construcción de Obras Públicas, designa a esta Dirección a mi cargo como área responsable de la ejecución de los trabajos de obra, así como la realización de todos los trámites necesarios para el proyecto denominado "MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el 61 de su Reglamento, le informo a usted que a partir de esta fecha se le encomienda la función de **Residente de Obra** para la ejecución del "RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE UNA EMERGENCIA."

Es importante reiterar a usted, que la residencia de obra representará directamente a la Dependencia ante el o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos.

Asimismo, le recuerdo que, para efectos de lo anterior, tendrá a su cargo cuando menos las siguientes responsabilidades, según lo establece dicho Reglamento en su artículo 61:

Artículo 61.- La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad a través del titular de la Unidad Técnico-Operativo responsable de ejecutar la obra pública de que se trate, designará por escrito y con anticipación al inicio de los trabajos al servidor público que fungirá como residente de obra, cuyas funciones serán las siguientes:

- I. Previo al inicio de los trabajos, en su caso, conocer el sitio de realización de los mismos y verificar su congruencia con el proyecto a ejecutar, así como verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicios que requieran supervisión;
- II. Notificar por escrito al contratista de la obra pública, la designación del residente de supervisión interna o externa, y anotar en la bitácora de obra dicha designación;
- III. Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos a supervisar, la información vigente relativa a los proyectos arquitectónicos y de Ingeniería, especificaciones de calidad



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y

maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos;

IV. Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como informar periódicamente al superior jerárquico al respecto;

V. Instruir a la residencia de supervisión interna o externa o al contratista de obra pública a través de la bitácora, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos;

VI. Resolver oportunamente las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos;

VII. Establecer y dar seguimiento al control presupuestal de la obra;

VIII. Vigilar que la bitácora se lleve conforme las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y demás normativa aplicable;

IX. Constatar que la realización de la obra se lleve en tiempo y forma conforme al programa de avance físico financiero;

X. Autorizar las estimaciones aprobadas por la supervisión interna o externa para trámite de pago, respecto de la obra pública contratada, previa revisión de la documentación que acredite la procedencia del pago;

XI. En caso que en el desarrollo de la obra o de los servicios se generen conceptos de trabajos extraordinarios, vigilar que éstos hayan sido los instruidos y se encuentren ordenados en la bitácora; así como vigilar que se registren en la bitácora, cuando proceda, los rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a las Políticas;

XII. Proponer en tiempo y forma la celebración de convenios, respecto de cualquier modificación a los contratos de obra pública o, en su caso, de supervisión externa;

XIII. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales o de proceso, recabar por escrito las instrucciones correspondientes ante su superior jerárquico y proponer, en su caso, los convenios necesarios;

XIV. Proponer cuando proceda, las suspensiones temporales de los trabajos, las terminaciones anticipadas o las rescisiones de los contratos de obra pública, a los servidores públicos que correspondan;



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

XV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos del contratista de obra pública en coordinación con la supervisión interna o externa, participar en la entrega-recepción de los mismos e integrar el expediente de finiquito;

XVI. Cuando la residencia de supervisión sea externa, el residente de obra debe, además:

- a) Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas;
- b) Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia;
- c) Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago;
- d) En caso que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa;
- e) Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

XVII. Las demás que le correspondan conforme a las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

C.c.c.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Ornela. - Director General de Construcción de Obras Públicas. - jfuentes@cdma.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

(ANEXO 9)



**ACTA DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de mayo del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Dr. Roberto Beristáin Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitado: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Quinta Sesión Ordinaria 2021, dando la más cordial bienvenida a los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; en contra ninguno, abstención ninguna se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2021. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, en contra ninguno, abstención ninguna, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021, y se recabará sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el Acuerdo 04-04/2021 acerca de la



aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2021, aprobándose de manera unánime en la Cuarta Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de abril de 2021. En ese mismo apartado se encuentra el **Acuerdo 04-05/2021** referente a la Instalación, Movimientos y Desinstalación de Andamio Multidireccional Estructural para la Restauración del Fuste de la Columna de la Independencia (Ángel), ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. El Pleno por unanimidad dictaminó opinión favorable para la formalización del contrato, mediante el procedimiento de adjudicación directa, en apego al fundamento legal y términos ya señalados, en la Cuarta Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de abril de 2021. Cabe mencionar que se atendieron todas las observaciones emitidas por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 30 de abril de 2021, se indica que se realizaron 4 contrataciones por Adjudicación Directa; informa que se realizaron 4 contrataciones por Invitación a cuando menos tres personas; así como también la realización de 10 contrataciones por Licitación Públicas, algún comentario al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el informe correspondiente al mes de abril, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. --

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios que no han tenido variación alguna, con corte al 30 de abril de 2021, sin haber objeción somete a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad y continua con la Orden del Día propuesta. -----

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores propone al Pleno del Subcomité, solo mencionar los ejercicios que presentaron algún movimiento con corte al 30 de abril de 2021. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----



5.13 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo.

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** observa respecto a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, no percibo que se refleje el avance físico y financiero de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", respecto a los contratos del 2019, 2020 y 2021, sería conveniente que los reportes se homologaran con las demás Direcciones de Construcción; en relación con la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", presentan un avance financiero mayor al físico, al parecer existe un error, lo anterior para que sea revisado, no puede ser que el avance financiero sea mayor al físico también de los ejercicios 2019 y 2020, para que se corrijan por favor.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta que serán corregidos y en el caso de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", se homologara el formato con las otras Direcciones de Construcción.

El **C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo** da las gracias.

6. Asuntos Generales.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta los oficios referentes a las observaciones emitidas en la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, respecto a la Justificación de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", referente al Caso DCOP"B"/01/2021; atendiendo lo observado por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.

pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** menciona que se intervendrá un puente peatonal, ubicado en la lateral Sur del Viaducto Río de la Piedad, debido a que en la losa de la pasarela existe un agrietamiento longitudinal en toda su sección, producto de las deformaciones excesivas en dicho elemento.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, conmina al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, traer el alcance una vez que se haya realizado la acción.

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; al no existir más participaciones cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, para que concluya la Sesión.



El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, siendo las 13:22 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. —

**DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE**

Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala

SECRETARIO TÉCNICO

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores

VOCALES PROPIETARIOS

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "A"**

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "B"**

Ing. Rolando Alexander Fernández
Betancourt

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "C"**

Ing. Carlos Arceo Castañeda

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "D"**

Mtro. Efraín Álvarez Martínez



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS**

Dr. Roberto Beristain Salmerón

**POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS**

C.P. Eudocio Santamaría Manuel

ASESOR

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS**

C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo

INVITADO

**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS**

Mtro. Ricardo Cedillo del Río



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 30 de agosto de 2021
CDMX/SOBSE/DGAF/4425 /2021

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/18.08.21/001 mediante el cual envía propuesta de Afectación Presupuestaria Compensada, consistente en la reducción del presupuesto autorizado del proyecto O21NR0291 denominado: "Construcción del Puente Vehicular Chamixto", por un monto de \$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), para ser readecuados al proyecto O21NR0038 denominado "Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México", por un monto de \$2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100M.N.) y al proyecto denominado "Demolición, retiro y construcción de una sección del muro de contención, ubicado en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las calles Lomas y Sauce, colonia Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México" por un monto de \$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100M.N.) así mismo envía las Requisiciones de Obra DCOP "A" 007-2021 y DCOP "A" 008-2021 para otorgar suficiencia presupuestal, así como las fichas técnicas de los proyectos correspondientes.

Al respecto, le informo que se solicitó la Afectación Presupuestaria Compensada No. A 07 C0 01 7898 (anexo), por un importe de \$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), la cual fue registrada por la Dirección General de Gasto Eficiente B y se solicitaron las Fichas Técnicas correspondientes mismas que fueron autorizadas por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación de Gasto.

En el mismo sentido, le envío con suficiencia presupuestal las Requisiciones de Obra DCOP "A" 007 y DCOP "A"-008-2021 (anexas), mismas que han sido registradas dentro de nuestros controles presupuestales conforme al calendario autorizado que se detalla a continuación:

RI	R	SF	AL	RP	RF	SG	FE	AD	OR	PTDA	TS	DI	DO	PROYECTO	Nº DE REQ.	IMPORTE (PESOS)
2	2	1	DG	0005	15	0	1	1	0	0151	2	1	00	O21NR0038	DCOP "A" 007-2021	2,300,000.00
Denominación Del Proyecto																
"Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México"																
2	2	1	DG	0005	15	0	1	1	0	0151	1	1	00	O21NR0003	DCOP "A" 008-2021	700,000.00
Denominación Del Proyecto																
"Demolición, retiro y construcción de una sección del muro de contención ubicado en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las calles Loma y Sauce, colonia Rancho Tejomulco, Pueblo Santa María Nativitas, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México"																

No omito comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dicha requisición, la cual no exime de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MÉXICO TENOCHTILAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Cabe señalar, que el requisitado de la misma es responsabilidad del área requirente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.C.E.A.S. MTRA. Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de Finanzas en la SCOE - gerardo.calzada@dm.cdmx.mx
Mtro. Ricardo Cedillo del Río - Subdirector de Administración de Recursos Financieros de Obras Públicas - ricardo.cedillo@dm.cdmx.mx
Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SCOE - angelcalderon@dm.cdmx.mx

DGAF - T794 - SPDF - 1288
GES / ACT - GDFP / alc



AFECTION PRESUPUESTARIA COMPENSADA

C. SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL D.F.
PRESENTE.

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA
LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

No DE AFECTACION PRESUPUESTARIA	FECHA			HOJA	
	DÍA	MES	AÑO	No.	DE
A 07 C0 01 7898	25	08	2021	1	3

NUMERO DE SECUENCIA		CLAVE PRESUPUESTARIA IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN -PESOS-	CALENDARIO		
			PERIODO DE AUTORIZACION		IMPORTE ESPECIFICO POR MES -PESOS-
			DE	A	
			MES	MES	
REDUCCIÓN COMPENSADA					
001	1 07C001 221049K005 150110 61512100 021NR0291	3,000,000.00	10	10	3,000,000.00
	TOTAL: REDUCCIÓN COMPENSADA	3,000,000.00			
ADICIÓN COMPENSADA					
001	1 07C001 221049K005 150110 61512100 021NR0038	2,300,000.00	10	10	2,300,000.00
002	1 07C001 221049K005 150110 61512100 021NR0003	700,000.00	10	10	700,000.00
	TOTAL: ADICIÓN COMPENSADA	3,000,000.00			
SOLICITA			AUTORIZA		
07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal			S.E./DIR GENERAL DE EGRESOS		
GUADALUPE ESTRADA SÁNCHEZ DIRECTORA DE FINANZAS			RAMÓN LEY BECERRA. DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE II		



JUSTIFICACION

NUMERO A 07 CO 01 7898

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal

HOJA 2 DE 3

REDUCCIÓN Y/O CANCELACIÓN

Se solicita la presente Afectación Presupuestaria compensada de reducción de la partida 150110 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Incentivos derivados de la Coordinación Fiscal-2021-original de la URG", en el Área Funcional 221049 "Mantenimiento de Infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos", programa presupuestario E005 "Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana" en la partida 6151 "Construcción de Vías de Comunicación", del proyecto 021H00291 denominado "Construcción del Puente Vehicular Chaslaté" por un importe de \$4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), conforme a lo siguiente:

La presente reducción se solicita con la finalidad de reasignar \$3,400,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los recursos provenientes originados por la mantención autorizada mediante oficio SA/0301/2021, planteados a través de la afectación presupuestaria compensada A 07 CO 01 0801, donde se menciona que durante el presente ejercicio fiscal únicamente se ejercerá un monto de \$50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) y se tendrá un saldo disponible de \$35,000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), el cual será destinado a otros proyectos prioritarios del Gobierno de la Ciudad de México que se alinean a esta Secretaría de Obras y Servicios, por lo que con el presente movimiento queda un monto de \$32,000,000.00 (treinta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) susceptibles de ser reasignados.

Dicha reducción se lleva a cabo de conformidad con el Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, Capítulo IV artículo 107.

La presente reducción compensada en el Área funcional afectada, así como en la posición presupuestal correspondiente, no afectará la meta física de origen.

AMPLIACIÓN Y/O ADICIÓN

Se solicita la presente Afectación Presupuestaria compensada de adición en el fondo 150110 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Incentivos derivados de la Coordinación Fiscal-2021 Original de la URG", en el Área Funcional 221049 "Mantenimiento de Infraestructura vial, zonas verdes y espacios públicos", programa presupuestario E005 "Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana" en la partida 6151 "Construcción de Vías de Comunicación", por un importe de \$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), conforme a lo siguiente:

En el proyecto 021H00038 denominado "Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México" por un monto de \$2,300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), la anterior para estar en condiciones de complementar los recursos para llevar a cabo los trabajos de desmantelamiento y retiro de tres veredas de clara del puente peatonal ubicado en Viaducto Río de la Piedad y Circuito Atletas, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalra, debido a los diversos daños que presenta en sus elementos estructurales, en virtud de que, tiene un galibo menor al que permite la altura y está prohibido que los vehículos de transporte de carga que transitan en la vialidad ingresen con el puente.

En el proyecto 021H00003 denominado "Demolición, Retiro y Construcción de una sección del Hero de Contención, ubicado en la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las calles Loma y Sauce, colonia Rancho Tejomilco, Pueblo Santa María Mativitas, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México", el cual requiere un monto de \$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), la anterior para estar en condiciones de llevar a cabo la "Demolición, Retiro y Construcción de una sección del Hero de Contención, ubicado en la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre las calles Loma y Sauce, colonia Rancho Tejomilco, Pueblo Santa María Mativitas, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México", trabajos que consisten en: Demoliciones, excavaciones y acarreos fuera del sitio de los trabajos, trazo y nivelación, habilitado y armado con acero de refuerzo, cimbrado y descimbrado, colado de elementos de concreto, rellenos, compactaciones y colocaciones de drenes.

JUSTIFICA
GUADALUPE ESTRADA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE FINANZAS



JUSTIFICACION

NUMERO A 07 CO 01 7898

UNIDAD RESPONSABLE Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal

HOJA 3 DE 3

REDUCCIÓN Y/O CANCELACIÓN	AMPLIACIÓN Y/O ADICIÓN
	Dicha adición se lleva a cabo de conformidad con el Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, Capítulo IV artículo 107. La presente adición compensada en el área funcional afectada, así como en la posición presupuestal correspondiente, no afectará la meta física de origen.

JUSTIFICA
GUADALUPE ESTRADA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

Área operadora del proyecto: SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

UN	Descripción
0701	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Programa Presupuestario, Versión y Denominación del Proyecto	
0.21NR0038	003 ACEP Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.

		En caso de multiannualidad			
		2021	2022	2023	2024 y más
IMPORTE	Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obra	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00
	Estudios de	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00

Fecha estimada de inicio del proyecto	Día	Mes	Año	Empleos
	01	01	2021	70
Fecha estimada de fin del proyecto	31	12	2021	Indirectos 50
Ubicación física del proyecto				Directos 20

En diversos puntos de la Ciudad de México.

Costo	0.00
Vida	30 AÑOS
Versión	28.08.2021
ACTIVO	

Distribución financiera por delegación (2021):

ADQ	AZC	BJU	COY	CUJ	CUH	OAM	IZC	IZP
0.00	827,690.00	0.00	0.00	0.00	1,070,920.00	0.00	2,300,000.00	0.00
MCO	MHI	MPA	TUH	TLP	VCA	XOC	OTRA ENTIDAD	TOTAL
0.00	1,076,820.00	0.00	0.00	4,030,470.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00

Meta física por delegación

META 1 (Punto)	ADQ	AZC	BJU	COY	CUJ	CUH	OAM	IZC	IZP
	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
	MCO	MHI	MPA	TUH	TLP	VCA	XOC	OTRA ENTIDAD	TOTAL
	0.00	4.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	27.00
META 2	ADQ	AZC	BJU	COY	CUJ	CUH	OAM	IZC	IZP
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MCO	MHI	MPA	TUH	TLP	VCA	XOC	OTRA ENTIDAD	TOTAL
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
META 3	ADQ	AZC	BJU	COY	CUJ	CUH	OAM	IZC	IZP
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MCO	MHI	MPA	TUH	TLP	VCA	XOC	OTRA ENTIDAD	TOTAL
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetivo

Uso de a cargo el ordenamiento urbano para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles, mejorando con ello las condiciones de vida y garantizando el acceso universal a más y mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos como mujeres, niños, indígenas y discapacitados.

Justificación

El incremento considerable del tránsito vehicular ha causado que se continúen vialidades de circulación continua que impiden el cruce seguro de las personas, por lo que se requiere mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana que permite la movilidad de las personas, según las solicitudes ciudadanas.

Descripción

Se llevará a cabo el mantenimiento en 27 (PUE) en diversos puntos de la ciudad de México, mediante el cual se realizarán los siguientes trabajos: Mantenimiento a la estructura metálica, escaleras, barandales, pasarela y aplicación de pintura, reparación de escalones, prefabricación de dados y colocación de ángulo para bicicletas, según corresponda en aproximadamente 20 puentes peatonales ubicados en vialidades primarias del Distrito Federal, con la finalidad de proporcionar seguridad a los peatones.

Observaciones

Se modifica el importe de \$7,000,000.00 a \$8,300,000.00 (cabe mencionar que la diferencia proviene del proyecto 021NR0201) se modifica la distribución financiera y las metas físicas, las modificaciones no impacta a ningún otro proyecto de la cartera de inversión registrada por esta Unidad, todos los demás campos se mantienen sin cambios.

Elaboró

Revisó

Autorizó

ÁNGEL CALDERÓN CRUZ,
SUBDIR. DE PROGRAMACIÓN Y CTO. PRESUPUEST

GUADALUPE SAUCEDO RUIZ
L.C.P. DE FICHAS TÉCNICAS

GUADALUPE SAUCEDO RUIZ
L.C.P. DE FICHAS TÉCNICAS

ANEXO 1 REQUISICIÓN DE OBRA



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

TÍTULO DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

DCOP"A"-007-2021

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS CUANDO SE REQUIERAN)
1	SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR UN IMPORTE ADICIONAL DE \$2,300,000.00 PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DESMANTELAMIENTOS Y RETIRO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, DEBIDO A LOS DIVERSOS DAÑOS QUE PRESENTA EN SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EN VIRTUD DE QUE, TIENE UN GALIBO MENOR AL QUE PERMITE LA NORMA Y ESTO PRODUCE QUE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA QUE TRANSITAN EN LA VIALIDAD IMPACTEN CON EL PUENTE. TODO LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR SEGURIDAD A LOS PEATONES.

FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA EN QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		DENOMINACIÓN DEL PROYECTO		NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA SOLICITANTE		
18	08	2021	SEGÚN CALENDARIO PRESUPUESTAL		MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"		
DÍA	MES	AÑO			LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS		MONTOS ESTIMADOS		
						DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
HOJA No. 1 DE 1							\$2,300,000.00		

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO

EL INCREMENTO CONSIDERABLE DEL TRÁNSITO VEHICULAR HA CAUSADO QUE SE CONSTRUYAN VIALIDADES DE CIRCULACIÓN CONTINUA QUE IMPIDAN EL CRUCE SEGURO DE LOS PEATONES, POR LO QUE SE REQUIERE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA URBANA QUE PERMITA LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS, SEGÚN LAS SOLICITUDES CIUDADANAS.
CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES AL MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SOLICITA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

ING. RAÚL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
ING. FRANCISCO M. IGUERRA ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA A LA REQUISICIÓN

TIPO DE RECURSOS

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL 2021-ORIGINAL DE LA URG

FONDO

150I10

CALENDARIO PRESUPUESTAL

NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN DE OBRA DIFERENTE CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
VoBo SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

DCOP "A"-007-2021

FECHA: 27 de agosto de 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

CLAVE PRESUPUESTAL:

07C001 221049K005 150110 51512100 021NR0035

CALENDARIO MENSUAL

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	

JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	2,300,000.00
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

FIRMA

LC. ANGEL CALDERON CRUZ

SUBDIRECTOR DE
PROGRAMACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL

MONTO: \$2,300,000.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección Construcción de Obras Públicas "A"

Subdirección Construcción de Obras Públicas "A-2"

Puente Peatonal:

"Retiro y desmantelamiento de tres secciones de claro del puente peatonal ubicado en Viaducto Río de la Piedad y Circuito Atletas, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, derivado de una emergencia"

Septiembre 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Septiembre 2021

LOCALIZACIÓN

- **Ubicación:** Viaducto Río de la Piedad y Circuito Atletas, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, CDMX.
- **Coordenadas:** 19°24'29.46"N 99°6'6.70"W





ACCIONES

» Datos generales

Puente peatonal con cabezales y columnas de concreto reforzado y vigas preesforzadas que libran seis claros, con trabes tipo AASHTO-III y pasarela fabricada de concreto, tres escalinatas con alfardas de concreto y escalones colados monolíticamente, así como barandales de sección tubular.

Derivado de la solicitud del Gerente de Obras y Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde nos pide apoyo para efectuar un diagnóstico y solución a la problemática que presenta la pasarela del puente peatonal que conecta con la estación Velódromo de dicho sistema de transporte, ya que presenta agrietamientos importantes.

La Dirección de Construcción de Obras Públicas, realizó la inspección física en el sitio y efectivamente observo importantes agrietamientos longitudinales en la zona de tránsito peatonal, esto derivado de los múltiples impactos de vehículos con exceso de dimensiones, además de que el puente cuenta con un galibo menor al que permite la norma, provocando desconches en las trabes de concreto presforzado así como fisuras en diagonal a 45° , que acusan un patrón de falla por cortante. En las columnas de concreto que sostienen a los claros afectados se puede observar el mismo patrón de falla por cortante con fisuras a 45° .

Se realizó la inspección y dictamen de un Director Responsable de Obra (DRO), el cual indicó que tres secciones de pasarela, dos escaleras y dos columnas deberían ser retiradas a la brevedad.





ACCIONES

» Datos generales

Por la gravedad de la situación esta Dirección expuso el caso en la 5ª Sección Ordinaria del 2021 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, celebrado del 27 de mayo de 2021.

Los trabajos se comenzaron de manera urgente, por lo que se solicitó la gestión del recurso para el otorgamiento de la suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El 30 de agosto de 2021 es otorgado el recurso para el programa de "Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México", con el cual se formalizara la ejecución de los trabajos denominados **"Retiro y desmantelamiento de tres secciones de claro del puente peatonal, ubicado en Viaducto Río de la Piedad y Circuito Atletas, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, derivado de una emergencia"**.






ACCIONES

» Ejecución de los trabajos

Se procedió con el cierre del puente peatonal, retirando barandales en escalinatas y pasarelas, para así poder demoler la losa de compresión en pasarelas, posteriormente se realizaron las maniobras de desmontaje de las traveses de concreto post tensado, por medio de grúas hidráulicas telescópicas, para ser llevadas al sitio de demolición.

Posteriormente se realizaron las demoliciones de escaleras y columnas.

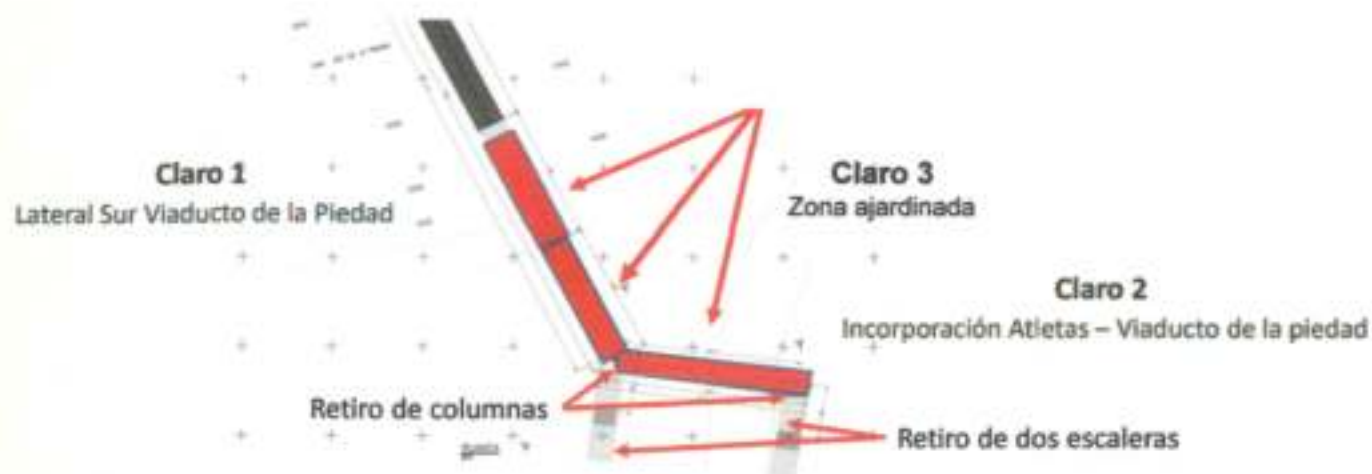

Periodo de ejecución

Abril - Septiembre

Tipo de contratación

Adjudicación Directa

Monto máximo de actuación

\$1'446,520.00

Inversión

\$1'521,438.59

4.93% excede el monto
máximo de una
adjudicación directa





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO

» Antecedentes





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO

» Proceso de ejecución de los trabajos



Retiro de barandal



Señalización



Maniobras de desmontaje de traves





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO

» Proceso de ejecución de los trabajos



Maniobras de desmontaje de traves



Demolición de escaleras y columnas





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Septiembre 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO

» Conclusión de los trabajos



Demolición de trabes



Conclusión de los trabajos





SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

6.2 Listado de Casos número DCOP"B"/03/2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

HUJA: 1

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CASOS AL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Sesión: 10 Ordinario: (X) Extraordinaria: () Fecha: 28 de octubre de 2021	ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" PROCEDIMIENTO SOLICITADO: ADJUDICACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DE OBRA: (X) CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN: () CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: ()	ÁREA FUNCIONAL: 024004 Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública, Infraestructura de Transporte Público FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 150110 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Incentivos CONCEPTO DE GASTO: 8188 PRESUPUESTO DEL CONCEPTO DE GASTO: \$ 2,900,000.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$ 2,890,000.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN: COMA/SORSE/DGAF/97/2021
--	--	---

CASO No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO. PERIODO DE INICIO Y TÉRMINO	MONTOS ESTIMADOS	JUSTIFICACIÓN	FUNDAMENTO LEGAL	DICTAMEN DEL SUBCOMITÉ
OCOP/2021/03/2021	1	OBRA	OBRA EMERGENTES EN PASARELAS DE ACCESO PEATONAL AL METRO EN EL CETRAM PANTITLÁN PERIODO: 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2021	\$ 2,900,000.00 (dos millones novecientos mil pesos) incluye IVA. Para esta obra no se otorgará anticipo.	Los últimos sismos que se han presentado y los hundimientos diferenciales, han generado desplazamientos horizontales y verticales entre las pasarelas y la retén peatonal en el CETRAM Pantitlán, así como en el intersección o paso de vía de la línea 9 del metro, lo que requiere de la colocación de placas de conexión y pernos de refuerzo.	Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 3, inciso A, fracción I; Artículos 23, 24, inciso C, 61, 63, fracciones II, VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Artículo 75 B, fracciones I, II y III de su Reglamento.	

ELABORÓ: Ing. Roberto Alexander Fernández Salazar Vº DE SUPLENENCIA PRESUPUESTAL: M.A.P.P. Gerardo Cabada Saldaña	PRESIDENTE _____ Ing. Juan Carlos Fuentes Ornela Director General de Construcción de Obras Públicas	CONTRALOR DE CALIDAD _____ _____ _____	CONTRALOR DE CUENTAS _____ _____ _____	VOCAL _____ M.A.P.P. Gerardo Cabada Saldaña Dirección General Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios	VOCAL _____ Ing. Francisco Márquez Izquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
	Vº. Ing. Roberto Alexander Fernández Salazar Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"	VOCAL _____ Ing. Carlos Ayala Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"	VOCAL _____ Mtro. Elías Álvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"	VOCAL _____ Dr. Roberto González Salmerón Dirección de Ingeniería de Obras y Construcción de Construcción de Obras Públicas	VOCAL _____ C.P. Enrique Sarmiento Manuel Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LAS "OBRAS EMERGENTES EN PASARELAS DE ACCESO PEATONAL AL METRO, EN EL CETRAM PANTITLÁN".

1.- ANTECEDENTES.

El **CETRAM Pantitlán** es uno de los más concurridos del Metro de la Ciudad de México, es una terminal de correspondencia perteneciente a la Línea 1, Línea 5, Línea 9 y Línea A, siendo a la vez la estación terminal oriente de las tres primeras y la terminal poniente de la última línea. Se ubica al oriente de la Ciudad de México en el límite de las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco.

Esta estación es mundialmente conocida por el nivel de saturación que enfrenta, especialmente en la terminal de la línea A, la cual puede llegar a tener serios congestionamientos de gente. Esto es debido a que la línea A conecta a la Ciudad de México con el Estado de México, y es principalmente utilizada por los trabajadores del Estado de México para ir y volver de la Ciudad de México.

Las pasarelas de las diferentes salidas del metro que comunican a los paraderos de las diferentes rutas que se alojan en el CETRAM, están unidas con placas de conexión a la glorieta peatonal denominada "Queso".

2.- UBICACIÓN.

Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, Miguel Lebrija s/n, Col. Adolfo López Mateos, 15670 Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, CDMX



Georreferencias (19.41586,-99.07457)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

3.- SITUACIÓN ACTUAL.

Por diferentes reportes ciudadanos realizados a través de las redes sociales y con el fin de dar atención a los mismos, se acudió al paradero del Metro Pantitlán para realizar una revisión de las condiciones actuales de las pasarelas peatonales que conectan el CETRAM Pantitlán con las instalaciones del metro.

En la inspección ocular realizada, se observó que la unión entre las pasarelas y la glorieta de distribución presenta una separación mayor a la que fue originalmente concebida lo cual pone en riesgo la estabilidad de la estructura y por consiguiente la vida de las personas que transitan diariamente por estas instalaciones.

Lo anterior se debe a los asentamientos diferenciales que se presentan en el subsuelo de la zona entre las pasarelas y la glorieta, lo que ha generado deslizamientos horizontales, verticales y sobreesfuerzos de los elementos estructurales generando fisuras en los mismos, adicionalmente existen desplazamientos relativos producidos por los pasados sismos en elementos intermedios de las pasarelas 7, 8 y 9 que son vigas presforzadas tipo AASHTO.

Por lo anterior, se llevó a cabo una revisión por parte de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas con la asesoría de la Empresa RIOBOO, S.A. de C.V., de igual forma, el Sistema de Transporte Colectivo llevó a cabo una inspección en la que concluyeron que se tenía que llevar a cabo un reforzamiento de las placas de conexión de las pasarelas y la ampliación geométrica de las ménsulas de apoyo en la Glorieta peatonal, lo cual por motivos de seguridad y la integridad de los usuarios, se requiere realizar los trabajos de forma emergente.

4.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

Los trabajos a realizar en las Pasarelas, la Rotonda y el intertramo o paso de vías de la línea 9 consisten en:

Pasarelas: Colocación de placa de acero A-36 con un $f_y=2530 \text{ kg/cm}^2$, en las juntas de conexión entre las traveses tipo AASHTO pretensadas para disminuir los desplazamientos longitudinales y laterales ocasionados por sismo, por medio de anclas metálicas de acero SAE 1018 con un $f_y=4710 \text{ kg/cm}^2$ de 1" de diámetro.

Rotonda: Colocación de placas de conexión entre traveses presforzadas AASHTO y traveses de concreto de la rotonda unidas por medio de anclas químicas, con la finalidad de lograr la conexión adecuada entre las traveses principales de la estructura existente con las traveses tipo AASHTO pretensadas de la pasarela que converge con la rotonda denominada "Queso".

Intertramo o paso de Vía: Colocación de pernos de conexión de acero SAE 1018 con $f_y=4710 \text{ kg/cm}^2$ de 2" de diámetro para la restricción del desplazamiento en sentido longitudinal de las vigas pretensadas por medio de placas y laminas de acero A-36 de $f_y=2530 \text{ kg/cm}^2$.

5.- FUNDAMENTO LEGAL

Tomando en cuenta la importancia que tiene la movilidad y el gran aforo que tiene el CETRAM Pantitlán, la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar las **"OBRAS EMERGENTES EN PASARELAS DE ACCESO PEATONAL AL METRO EN EL CETRAM PANTITLÁN"**, considerando que la adjudicación directa se encuentra en los supuestos de los: Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3, Inciso A, fracción I, Artículos 23, 24, inciso C; 61 ; 63, fracciones II, VII; de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Artículo 75 B, fracciones I, II y III de su Reglamento.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

6.- CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN.

Se recurre al procedimiento Adjudicación Directa, para lograr obtener el beneficio de economía, eficacia y eficiencia, seleccionando a la empresa contratista idónea que cuenta con la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera, con la disponibilidad de respuesta inmediata, para lograr con esto la disminución de los tiempos requeridos en un proceso de Licitación Pública.

- **Economía:** El optar por el procedimiento de Adjudicación Directa se justifica, ya que se obtiene el mismo nivel de calidad requerido y esperado en comparación a la Licitación Pública o Invitación Restringida. El análisis se hace en comparación con los costos de una Licitación Pública y una Invitación Restringida, considerando lo que cuesta la elaboración de las bases, reuniones, elaboración y publicación de convocatorias, visitas, atención de inconformidades y aclaraciones; así como el costo que representa atender de inmediato y sin retrasos el refuerzo de las pasarelas en el CETRAM Pantitlán, objeto de la Licitación o la Invitación Restringida, contra el menor costo del proceso en caso de una Adjudicación Directa.
- **Eficacia:** Con la opción de llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, se inician los trabajos de inmediato y se atiende con mayor rapidez la emergencia, en comparación con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, evitando con esto problemas de interrupciones y retrasos del inicio de los trabajos, así mismo habrá una disminución considerable de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento; la empresa que se seleccione para la ejecución de los trabajos cuenta con la experiencia, capacidad técnica, económica, administrativa y disponibilidad inmediata para el inicio de los trabajos, logrando alcanzar la meta que tiene programada.
- **Eficiencia:** Llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para el caso en cuestión, redundará en eficiencia debido a que el costo beneficio en la combinación de la economía y la eficacia en la opción, es mejor que si se optara por una Licitación o una Invitación Restringida. La empresa seleccionada representará las mejores condiciones para ejecutar los trabajos emergentes, por lo que la propuesta resulta ser la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de México.
- **Imparcialidad:** La selección del procedimiento de adjudicación directa, se realizará sin que exista inclinación o preferencia alguna, siendo el único objetivo lograr el mayor beneficio al menor costo posible para el Gobierno de la Ciudad de México, ya que la empresa por contratar cuenta con la capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos y financieros y la experiencia en trabajos similares de acuerdo con la urgencia para la ejecución de los trabajos.
- **Transparencia:** La contratación de la obra será conforme a lo establecido en La Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, dado las condiciones de emergencia para realizar el refuerzo, y con esto proporcionar seguridad a los usuarios del CETRAM Pantitlán.
- **Honradez:** Mediante el procedimiento de adjudicación directa, no se favorece a la empresa que se pretende contratar, toda vez que la selección del procedimiento de adjudicación directa se realiza cumpliendo todos los criterios establecidos para este tipo de contratación, y la empresa seleccionada reúne todos los requisitos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Lo anterior se sustenta con toda transparencia al acreditarse los criterios anteriores, obteniendo las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

7.- CONCLUSIÓN.

Por la emergencia que se presenta, y con el objeto de asegurar la integridad de los usuarios del CETRAM Pantitlán, es urgente llevar a cabo las **"OBRAS EMERGENTES EN PASARELAS DE ACCESO PEATONAL AL METRO EN EL CETRAM PANTITLÁN"**, con la empresa **Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.**, que cuenta con los recursos técnicos, económicos, humanos, equipo y disponibilidad inmediata, con un periodo de ejecución del 01 al 30 de noviembre de 2021.

8.- SOLICITUD

El presente caso se somete a consideración del H. Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, para que se dictamine sobre la procedencia de la excepción prevista en el artículo 63 fracciones II y VII de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, para la contratación de las **"OBRAS EMERGENTES EN PASARELAS DE ACCESO PEATONAL AL METRO EN EL CETRAM PANTITLÁN"** en la modalidad de Adjudicación Directa a la empresa **Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.** por un monto aproximado de **\$ 2,900,000.00** (dos millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el IVA.

El presente documento se elabora en la Ciudad de México a los 18 días del mes de octubre de 2021, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Elaboró

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "B2"

Vo. Bo.

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras
Públicas "B"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 27 de septiembre de 2021
CDMX/SOBSE/DGAF/ 5673 /2021

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCCOP/17.09.21/002, mediante el cual envía la propuesta de Afectación Compensada, para readecuar los recursos del proyecto O21NR0291 denominado: **"Construcción de Puente Vehicular Chamixto"**, por un monto de \$2,900,000.00 (Dos millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), al proyecto O21NR0957 denominado **"Obras Emergentes en Pasarelas de Acceso Peatonal al Metro en CETRAM Pantitlán"**, así mismo envía la Requisición de Obra DCOP"B" 023.

Al respecto, le informo que se solicitó la Afectación Presupuestaria Compensada No. A 07 C0 01 9323 (anexo), por un importe de \$2,900,000.00 (Dos millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), la cual fue registrada por la Dirección General de Gasto Eficiente B, así mismo envió la Ficha Técnica del proyecto O21NR0957, misma que fue autorizada por la Dirección General de Gasto Eficiente B.

En el mismo sentido, envió la Requisición de Obra DCOP"B" 023 (anexa), con suficiencia presupuestal, misma que ha sido registrada dentro de nuestros controles presupuestales conforme al calendario autorizado que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTD A	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE (PESOS)
2	2	2	024	K004	15	0	1	1	0	6151	2	1	00	O21NR0957	DCOP"B" 023	2,900,000.00
Denominación Del Proyecto				"Obras Emergentes en Pasarelas de Acceso Peatonal al Metro en CETRAM Pantitlán"												

No omito comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a las partidas presupuestales e importe de dichas requisiciones, las cuales no eximen de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Cabe señalar, que el requisitado de la misma es responsabilidad del área requirente.



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESION ORDINARIA 2021

7. Asuntos Generales
