



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Protocolo
 - 3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 - 3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité
4. Montos Máximos de Adjudicación para Efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con las Mismas
5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2023
6. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2022
7. Seguimiento de Acuerdos
8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 8.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 8.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022
 - 8.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 8.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 8.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 8.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 8.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 8.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 8.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 8.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 8.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 8.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
9. Asuntos Generales



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

3. Protocolo

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el Ejercicio 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
PRESIDENTE SUPLENTE	C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
SECRETARIO TÉCNICO	C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" VOCAL TITULAR	ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
VOCAL SUPLENTE	ARQ. CARLOS ENRIQUE MANCERA COVARRUBIAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" VOCAL TITULAR	ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
VOCAL SUPLENTE	ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" VOCAL TITULAR	ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
VOCAL SUPLENTE	ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" VOCAL TITULAR	MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE	ARQ. LEOPOLDO RAMOS SAN MARTÍN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	ING. BENJAMÍN GÓMEZ
VOCAL SUPLENTE	C. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
VOCAL SUPLENTE	MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS VOCAL TITULAR	MAPP. GERARDO CALZADA SIBILLA
VOCAL SUPLENTE	ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA CONTRALORA CIUDADANA	C.ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASESOR	LIC. IVETTE REYES LEÓN
SUPLENTE	ING. TEODOSO CHUPÍN NIÑO
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIO INVITADO PERMANENTE	LIC. HÉCTOR MANUEL MENCHACA CRUZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA EN LA SOBSE INVITADA	MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
SUPLENTE	LIC. ANA LOURDES PEÑA LLERENA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS INVITADO	MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO

1 JUL 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

4. Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo 54. Para efectos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas vigente en la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías con atribuciones para ejecutar obra pública se sujetarán a los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres concursantes que reúnan los requisitos establecidos por la normativa aplicable, conforme a lo que se indica a continuación:

INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA PARA OBRA PÚBLICA (miles de pesos)		MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE (miles de pesos)	MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES (miles de pesos)
Mayor de	Hasta	Límite	Límite
-	21,210	268	2,071
21,211	42,300	319	2,545
42,301	70,490	371	2,998
70,491	140,980	464	3,442
140,981	211,480	536	4,297
211,481	352,470	598	4,905
352,471	493,460	711	5,698
493,461	634,440	804	6,502
634,441	845,930	896	7,429
845,931	1,057,400	1,020	8,398
1,057,401	1,409,890	1,123	9,490
1,409,891	2,819,730	1,247	10,593
2,819,731	-	1,607	11,747

Los montos establecidos se deberán considerar sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía con atribuciones para ejecutar obra pública. Los montos de actuación deberán sujetarse al presupuesto aprobado por el Congreso o, en su caso, al presupuesto modificado, para el capítulo 6000 del Clasificador.

CAPÍTULO IV ADQUISICIONES

Artículo 55. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, para los efectos del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones vigente en la Ciudad de México, deberán observar los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, para la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, siendo para el ejercicio fiscal 2023 los siguientes:



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 28-11-2022

1.000.000.000

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	270	1,980
15,000	30,000	285	2,200
30,000	30,000	305	2,420
50,000	100,000	325	2,710
100,000	100,000	390	3,450
150,000	250,000	450	4,180
250,000	350,000	485	4,760
350,000	400,000	510	5,250
450,000	600,000	530	5,730
600,000	750,000	565	6,460
750,000	1,000,000	600	7,180
1,000,000	1,250,000	656	8,400
1,250,000	1,500,000	715	9,600
1,500,000	-	770	10,810

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	435	186	3,280	2,500
15,000	30,000	490	245	3,710	2,690
30,000	50,000	500	290	4,120	3,230
50,000	100,000	625	335	4,680	3,760
100,000	150,000	815	380	6,080	4,480
150,000	250,000	960	435	7,320	5,370
250,000	350,000	1,075	530	8,180	5,910
350,000	450,000	1,185	580	9,000	6,430
450,000	600,000	1,290	675	9,840	7,700
600,000	750,000	1,450	775	11,100	8,790
750,000	1,000,000	1,615	875	12,350	9,850
1,000,000	1,250,000	1,885	975	14,500	11,100
1,250,000	1,500,000	2,155	1,100	16,500	12,450
1,500,000	2,700,000	2,425	1,230	18,700	13,950
2,700,000	-	2,720	1,360	20,200	15,630



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SUBCOMITÉ DE OBRAS

CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2023

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1ª	ENERO	26	13:00
2ª	FEBRERO	23	13:00
3ª	MARZO	30	13:00
4ª	ABRIL	27	13:00
5ª	MAYO	25	13:00
6ª	JUNIO	29	13:00
7ª	JULIO	27	13:00
8ª	AGOSTO	31	13:00
9ª	SEPTIEMBRE	28	13:00
10ª	OCTUBRE	26	13:00
11ª	NOVIEMBRE	30	13:00
12ª	DICIEMBRE	14	13:00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1 º. SESIÓN ORDINARIA 2023

6. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2022



ACTA DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 08 de diciembre del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración y Apoyo a Obras Públicas y la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, Subdirector de Concursos, Control y Estadística de Obras Públicas; Asesor: Ing. Teodoso Chupín Niño, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"; Lic. Alberto Salvador Castillo, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -- El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2022; continúa con el Orden del Día propuesto. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** verifica la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3.- Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2022. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el



Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2022, y se recabará sus firmas. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los siguientes: Acuerdo 12-24/2022 referente a la aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 24 de noviembre de 2022. ----
Acuerdo 12-25/2022 acerca del caso DCOP“C”/01/2022; referente a los Trabajos de Reforzamiento y Rehabilitación Estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, aprobándose de manera unánime en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 24 de noviembre de 2022. Pregunta si existen comentarios al respecto, cede la palabra a la C. Angélica García Manzola. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta se cuenta con el Registro de Concursante y Curriculum de las empresas que estaba pendiente. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta nos encontramos en la integración de los expedientes, estamos en la revisión de los precios y recientemente nos llegó la autorización de suficiencia presupuestal para poder elaborar el contrato, en los días posteriores estaremos enviando la información que tuvo a bien solicitarnos, al igual que el representante del Comité Central, en breve estaremos enviando la documentación para conocimiento y fines procedentes. -----

La **C. Angélica García Manzola** agradece. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de noviembre de 2022, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los informes correspondientes al mes de noviembre de 2022, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** propone al Pleno obviar la presentación de los numerales 5.3 al 5.7 correspondientes a los ejercicios del 2008 al 2016 respectivamente; debido a que no han tenido variación alguna, con corte al 30 de noviembre de 2022, somete a votación la propuesta; se aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Día propuesta. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----



5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.11.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.12.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

6.- Propuesta de Calendario para el Ejercicio 2023.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2023, el cual somete a consideración y votación, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, se aprueba por unanimidad de votos y continua con el siguiente punto.

7.- Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B".

7.1.- Listado de Casos DCOP"B"/05/2022.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos número DCOP"B" /05/2022, referente a los "Trabajos Complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del Estacionamiento y Plaza de Acceso a la Cineteca Nacional, Chapultepec", sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado; periodo de ejecución 60 días calendario; Monto Estimado de \$28'000,000.00 (Veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; con fundamento en los artículos: 41, 42 fracción V y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 229 fracciones I, II y III y 230 fracciones I, II y III de su Reglamento. Para tal efecto cedo la palabra Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B", para la exposición del Caso.

El Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt agradece y cede la palabra al Ing. José Luis Pichardo Hernández, para la exposición del mismo.

El Ing. José Luis Pichardo Hernández expone mediante diapositivas el criterio considerado mediante el cual justifica la propuesta de la celebración de un contrato por el procedimiento de Adjudicación Directa, se basa en lo establecido de los Artículos 229 y 230 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, donde refiere que, Artículo



229, "las dependencias y entidades podrán reconocer trabajos no considerados en los alcances de los contratos de obras o servicios celebrados a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios a los originalmente contratados y que resulten necesarios para el seguimiento y conclusión de los trabajos"; Artículo 230 en las fracciones II y III, "que los trabajos se incluyan en un contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado, y que la formalización del contrato se realice por adjudicación directa al contratista que realizó los trabajos originalmente pactados".-----

Como datos generales de la obra tenemos los siguientes: Contrato DGCOP-LPN-F-4-103-21, empresa Multinacionales Martínez Grey, S.A. de C.V., monto total \$72'703,011.11, período original 27 de agosto de 2021-31 de diciembre de 2021, monto del incremento adicional \$28'000,000.00, monto total con adicionales \$ \$100'703,011.11, fecha de término 14 febrero de 2023. -----

La justificación del incremento consiste en un Proyecto Integral que incluye la elaboración de un Proyecto Ejecutivo que se desarrolla en paralelo con el proceso de la obra. Dentro de los principales factores está el cambio y adecuaciones solicitados por la Cineteca Nacional, que son trabajos extraordinarios a los originalmente contratados, incremento al espacio de circulación vehicular, incremento al espacio de circulación vertical (rampas), incremento de áreas de servicio (local para planta de emergencia, áreas de vestíbulo, áreas de guardado, espacio para motos), incremento al área funcional de bodegas (ampliación de la circulación), construcción de un edificio adjunto para alojar las bodegas. Cambios y adecuaciones de trayectorias y ubicación de instalaciones, incluye la reubicación del cárcamo de bombeo de aguas negras y aguas pluviales, y la construcción del Motor Lobby que no estaba considerado originalmente, por que no se tenía definido el camino de acceso para el estacionamiento, y la interconexión entre estacionamiento y el camino para la entrada y la salida del estacionamiento es éste Motor Lobby. -----

En una comparativa entre las partidas y los trabajos contratados con el Anteproyecto y el Proyecto Ejecutivo, podemos encontrar la ampliación de ejes, ingeniería de estabilización de taludes para la estabilización del suelo, en la parte poniente del estacionamiento tenemos una pared que colinda con un Arco Techo que después de un Estudio de Mecánica de Suelos y ver que eran arcillas no muy comprensibles, se determinó efectuar los trabajos correspondientes para la seguridad del estacionamiento y el Arco Techo, mediante anclajes y concreto lanzado, impermeabilización, acabado de muros, etc. Así mismo, podemos observar que en el Anteproyecto la Superficie total de Estacionamiento era de 3,566.00 m², en el Proyecto Ejecutivo llegaremos a una Superficie total de Estacionamiento y Motor Lobby de 4,788.51 m²; modificándose también los Costos Paramétricos del Presupuesto Inicial contra los Volúmenes Adicionales de Proyecto Ejecutivo de Obra, de manera general estos serían los trabajos a realizarse. -----

Con base en lo anterior se solicita al Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas la opinión favorable para llevar a cabo la contratación referente a los "Trabajos Complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del Estacionamiento y Plaza de Acceso a la Cineteca Nacional, Chapultepec", a través del



procedimiento de Adjudicación Directa a Precio Unitario y Tiempo Determinado. Si alguien tiene comentarios al respecto quedo atento, gracias. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al Ing. Teodoso Chupín Niño. -----

El Ing. **Teodoso Chupín Niño** pregunta se cuenta con el Oficio de Autorización de Inversión debido a que en el Formato de Listado de Casos no se menciona. -----

El Ing. **José Luis Pichardo Hernández** responde en este momento no contamos con el Oficio, estamos en la espera de recibir la autorización en los próximos días para poder formalizar el Contrato; sin embargo, quisimos presentar este Caso al Subcomité, debido a que es la última Sesión para este Ejercicio. -----

El Ing. **Teodoso Chupín Niño** menciona este contrato se realizará en 60 días; cual es la fecha que comprende el periodo de los trabajos. -----

El Ing. **José Luis Pichardo Hernández** responde como lo mencione, contaremos con la Autorización de Inversión en los siguientes días, los trabajos se realizarán en del 15 de diciembre de 2022 al 15 de febrero de 2023, periodo contractual. -----

El Ing. **Teodoso Chupín Niño** pregunta en caso de no llegar la Suficiencia Presupuestal para este Ejercicio, el periodo de ejecución sería para el próximo año. -----

El Ing. **José Luis Pichardo Hernández** responde tenemos entendido que se encuentra asegurada la Suficiencia para este año, pero efectivamente estamos sujetos a contar con ella.

El Ing. **Teodoso Chupín Niño** da las gracias. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** da las gracias y pregunta al Pleno si existen más comentarios al respecto. Cede la palabra a la C. Angélica García Manzola. -----

La C. **Angélica García Manzola** comenta en el mismo sentido a lo comentado por el Órgano Interno de Control, porque no esperar la Suficiencia Presupuestal, para no tener problema con las fechas de inicio y de entrega de las obras. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** responde para llevar a cabo todas estas obras que se están efectuando en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, se firmó un Convenio con la Secretaría de Cultura; el Convenio Modificatorio para llevar los Recursos al mes de marzo de 2023, se establece que todos los Recursos deberán quedar comprometidos al 31 de diciembre del Ejercicio 2022. Como lo comento el Ing. José Luis Pichardo Hernández, la Autorización Presupuestal la estábamos esperando previamente a la realización de esta Sesión, debido a que se tiene prácticamente lista; efectivamente estamos sujetos a contar con el recurso; en el peor escenario que no llegara el Oficio de Autorización Presupuestal, que difícilmente sucediera, definitivamente no se podrá formalizar el recurso y se tendría que solicitar nuevamente a la Federación; sin embargo, lo que nos comentaron es que no habrá recurso para esta obra para el siguiente año, por esta razón es la necesidad de contratarlo y llevarlo al Subcomité en esta Sesión Ordinaria, con esto queda atendida su pregunta. -----

La C. **Angélica García Manzola** menciona si me queda claro todo lo referente a lo comentado, así como los convenios celebrados, gracias. -----

Dentro de ese mismo Proyecto estaba la Caracterización del Suelo, pregunto si ya se terminó porque en la Carpeta de Trabajo no encuentro datos que informe al respecto, considero que es importante saber que avance se tiene. -----



El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde nos encontramos en el proceso de contratación para poder llevar a cabo esos trabajos. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** menciona la zona del Estacionamiento y el Motor Lobby no tienen problema en la parte de Caracterización del Suelo, básicamente se ubica en la zona de las Bodegas. -----

La **C. Angélica García Manzola** comenta probablemente los trabajos iniciarían a la par sin problema. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** comenta efectivamente debido a que la parte fuerte de la caracterización se encuentra en la Bodega Nacional de Arte, dado que no hay viabilidad de acceso ni el motor lobby, es por esto que lo que estamos presentando en esta reunión. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta si se cuenta con el cálculo de Estabilización de Taludes donde se realizará el anclaje. -----

El **Ing. José Luis Pichardo Hernández** responde efectivamente contamos con el Estudio de Mecánica de Suelos, el Estudio de Ingeniería para la Estabilización del Talud. -----

La **C. Angélica García Manzola** solicita le sea enviada copia para verificarlo. -----

El **Ing. José Luis Pichardo Hernández** responde que le será enviado a la brevedad posible. ---

La **C. Angélica García Manzola** da las gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si hay comentarios al respecto, al no haberlos, somete a votación del Pleno la aprobación del Caso; se aprueba el Caso No DCOP"B"/05/2022 por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos señalados. -----

8. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona que se encuentra la Atenta Nota, del Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C", dirigida al C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; referente a lo solicitado por el Representante del Comité Central de la Ciudad de México y la Contralora Ciudadana en la 11ª. Sesión Ordinaria de este Subcomité del presente año. Donde envía los documentos correspondientes a: Curriculum de la Empresa, Registro de Concursante ante la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido por el Servicio de Administración Tributaria vigente (SAT), Cumplimiento de Obligaciones emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Cumplimiento de Obligaciones emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); de las empresas Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V., Cemex Concretos, S.A. de C.V. y Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V. -----

La **C. Angélica García Manzola** comenta el interés particular de mi solicitud es para la empresa Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V., debido a que tiene un proyecto en la alcaldía Cuajimalpa, ya que participa en el proyecto del Aeropuerto me interesa conocer su registro y recurso para que en algún momento no exista algún conflicto económico. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Administración y Apoyo a Obras Públicas
Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de
Control de Obras Públicas

1. 000-0020

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona quedaremos atentos a cualquier comentario adicional, gracias. -----

La **C. Angélica García Manzola** da las gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra. Al no existir, siendo las 13:45 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

7. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
12-26/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 08 de diciembre de 2022.
12-27/2022	PROPUESTA DE CALENDARIO PARA EL EJERCICIO 2023	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 08 de diciembre de 2022.
12-28/2022	LISTADO DE CASOS DCOP "B" 05/2022, REFERENTE A LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y PLAZA DE ACCESO A LA CINETECA NACIONAL, CHAPULTEPEC.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 08 de diciembre de 2022. Cabe mencionar quedo condicionado hasta contar con el Oficio de Suficiencia Presupuestal; mismo con el que ya se cuenta.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

8.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre 2022


Recursos Locales

1 (Acumulado)


PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
264,699,922.00	585,614,114.60	1. Licitación Pública		4	\$ 181,297,086.24	30.96	428,453,158.73
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		19	\$ 102,742,455.51	17.54	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		1	\$ 11,767,040.00	2.01	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		2	\$ 10,404,719.63	1.78	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo *Art. 62, 4º párrafo	28	\$ 47,946,270.47	8.19	
264,699,922.00	585,614,114.60			54	354,157,571.85	60.48	428,453,158.73

264,699,922.00	585,614,114.60
----------------	----------------

54	354,157,571.85	60.48	428,453,158.73
----	----------------	-------	----------------


Revisó

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de \$109,765,966.32 (Ciento nueve millones setecientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos 32/100 M.N.) y representan 2 contratos mas adeudados de Ejercicios Anteriores (ADEFAS).

Nota 2: Es importante mencionar que se celebró Convenio Modificatorio en Monto en reducción del Contrato de Obra Pública número DGOP-IR-L-1-012-22, por un importe de \$1,228,580.00

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, a por concepto de adjudicación directa, no podrá exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indeliberable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades a que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

00050024

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre 2022

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
1,815,071,344.00	2,370,700,777.23	1. Licitación Pública		14	\$ 567,666,033.82	23.95	1,578,169,371.49
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		33	\$ 187,545,126.82	7.91	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		1	\$ 58,123,468.43	2.45	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo *Art. 43, 4º párrafo	104	\$ 456,700,761.01	19.25	
1,815,071,344.00	2,370,700,777.23			152	1,270,035,390.08	53.57	1,578,169,371.49

1,815,071,344.00 2,370,700,777.23

152 1,270,035,390.08 53.57 1,578,169,371.49


Revisó

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos plurianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de \$1,184,100,488.03 (Mil ciento ochenta y cuatro millones cien mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 03/100 M.N.), representados en 12 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiendo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE

Nº	C	S	M	Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO					EJERCIO 2022	EJERCIO 2021	EJERCIO 2020
							PROYECTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE % MP	PROGRAMADO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	1	1	040	Urbanización	Immueble	-	17,305,000.00	17,305,000.00	87%	17,305,000.00	17,305,000.00	87%	87%
2	2	1	1	040	Urbanización	Immueble	13,335,000.00	13,335,000.00	13,335,000.00	100%	13,335,000.00	13,335,000.00	100%	100%
3	3	1	1	040	Urbanización	Puerto	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	100%	16,000,000.00	16,000,000.00	100%	100%
4	4	1	1	040	Urbanización	Puerto	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100%	14,000,000.00	14,000,000.00	100%	100%
5	5	1	1	040	Urbanización	Immueble	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	100%	16,000,000.00	16,000,000.00	100%	100%
6	6	1	1	040	Urbanización	Immueble	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%
7	7	1	1	040	Urbanización	Puerto	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100%	8,000,000.00	8,000,000.00	100%	100%
8	8	1	1	040	Urbanización	Immueble	4,145,000.00	4,145,000.00	4,145,000.00	100%	4,145,000.00	4,145,000.00	100%	100%
9	9	1	1	040	Urbanización	Puerto	138,000.00	138,000.00	138,000.00	100%	138,000.00	138,000.00	100%	100%
10	10	2	2	040	Desarrollo Comunitario	Puerto	-	1,408,000.00	1,408,000.00	100%	1,408,000.00	1,408,000.00	100%	100%
11	11	2	2	040	Urbanización	Puerto	-	124,000,000.00	124,000,000.00	100%	124,000,000.00	124,000,000.00	100%	100%
12	12	2	2	040	Urbanización	Puerto	-	28,704,100.00	28,704,100.00	100%	28,704,100.00	28,704,100.00	100%	100%
13	13	2	2	040	Urbanización	Puerto	88,000,000.00	88,000,000.00	88%	88,000,000.00	88,000,000.00	88%	88%	
14	14	2	2	040	Urbanización	Demarcación	-	478,732.88	478,732.88	100%	478,732.88	478,732.88	100%	100%
15	15	2	2	040	Urbanización	Demarcación	-	8,147,200.00	8,147,200.00	100%	8,147,200.00	8,147,200.00	100%	100%
16	16	2	2	040	Urbanización	Puerto	-	13,000,000.00	13,000,000.00	100%	13,000,000.00	13,000,000.00	100%	100%
17	17	2	2	040	Urbanización	Puerto	-	102,000,000.00	102,000,000.00	100%	102,000,000.00	102,000,000.00	100%	100%
18	18	2	2	040	Urbanización	Edificio público	-	1,418,000.00	1,418,000.00	87%	1,418,000.00	1,418,000.00	87%	87%
19	19	2	2	040	Urbanización	Puerto	-	2,400,000.00	2,400,000.00	100%	2,400,000.00	2,400,000.00	100%	100%
20	20	2	2	040	Urbanización	Immueble	82,000,000.00	82,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0%	0%
21	21	2	2	040	Urbanización	Immueble	300,000,000.00	300,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0%	0%
22	22	2	2	040	Urbanización	Puerto	88,000,000.00	88,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0%	0%
23	23	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	808,440,000.00	808,440,000.00	808,440,000.00	100%	808,440,000.00	808,440,000.00	100%	100%
24	24	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
25	25	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
26	26	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
27	27	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
28	28	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
29	29	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
30	30	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
31	31	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
32	32	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
33	33	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
34	34	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
35	35	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
36	36	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
37	37	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
38	38	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
39	39	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
40	40	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
41	41	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
42	42	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
43	43	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
44	44	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
45	45	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
46	46	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
47	47	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
48	48	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
49	49	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
50	50	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
51	51	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
52	52	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
53	53	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
54	54	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
55	55	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
56	56	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
57	57	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
58	58	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
59	59	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
60	60	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
61	61	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
62	62	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
63	63	2	2	040	Urbanización	Alfombrado	-	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	100%	100%
64	6													



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : DICIEMBRE

N. 1	C. 2	ST 3	M. 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PROYECTO 7	PRESUPUESTO						
							MONIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 30 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO % MUESTRA 13	EJERCIDO % PROGRAMA 14
1	1	1	024	Construcción	Intervente	-	80,000,000.00	29,028,186.87	36%	80,000,000.00	3,000	0%	0%
1	1	1	11T	Construcción	Intervente	-	1,700,000.00	1,898,886.47	100%	1,700,000.00	1,488,762.31	88%	0%
1	1	2	11T	Construcción	Intervente	-	20,000,000.00	17,265,142.97	86%	20,000,000.00	3,000	0%	0%
1	1	3	11T	Construcción	Intervente	-	80,000,000.00	79,697,820.59	100%	80,000,000.00	75,280,298.39	94%	94%
1	1	3	11T	Construcción	Intervente	80,000,000.00	-	-	0%	3,000	3,000	0%	0%
1	1	4	024	Urbanización	Intervente	17,500,000.00	-	-	0%	3,000	3,000	0%	0%
TOTAL GENERAL							2,078,771,295.00	2,956,314,891.83	2,824,025,891.48	2,956,314,891.83	2,096,622,538.20		

1.000.0028

27



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	6	2	0	2	6	0	8	5



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
TOTAL	1	2	0	2	1	0	3	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA; UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Corte al 31 de diciembre de 2008

CANT	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	AVANCE		CONVENIO PERIODO MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PROYADA	EN TRÁMITE	PROG.	FINANCIER.			
					Construcción del Acueducto Constituyentes Las Torres, ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Avenida (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Alemán.				\$1,271,221.86	\$0.00				\$0.00	\$1,261,041.24	\$0.00				
1	VOT-03-004REV	00	00	Servicios, S.A. de C.V.	Quedaron de la Construcción del Drenaje Vehicular Acueducto Constituyentes Las Torres	2008-0007	31-03-2008	-	\$1,271,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,261,041.24	\$0.00	100.0%	99.9%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y PROYECTO PROYECTADO EXISTE INCORPORACIÓN DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JAB EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Puente de Puente, ubicado en las lras. 22-180, 20-180 y 22-180 de la Autopista México-Puerto, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				\$1,128,801.70	\$0.00				\$0.00	\$1,128,801.70	\$0.00				
2	VOT-01-2008REV	00	00	GRUPO ESCOBAR, S.A. DE C.V.	Construcción del Puente de Acceso Central en la Autopista México - Puerto	2007-0007	30-04-2008	-	\$1,128,801.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,516.27	N/A	N/A	\$0.00	\$1,128,801.70	\$0.00	100.0%	100.0%	TERMINACIÓN ANTERIOR, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO A INTERÉS, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$260,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CASH EL 24-FEB-08 Y SE TOMÓ A CUENTA EL MONTE DE \$260,000.00 DE CUSTOS NO RECUPERABLES AL 31-AGO-08. AGREGA \$744,393.62 ADEMAS \$24,894.27 DE INTERÉS POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS POR \$11,308.80, \$24,894.27 Y \$24,894.27. SE TIENE EN REVISIÓN MONTE TOTAL QUE SE AGREGA, REDESIGNADO EL 31-10-08
											AMORTIZADO	\$277,191.98								
											POR AMORTIZAR	\$744,393.62								
SUBTOTAL									\$	\$4,491,748.36	\$0.00			\$0.00	\$	3,429,639.94	\$0.00			
					Ampliación de la Estación del Eje 18 Sur, Puente Vehicular Drenaje Río México - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 2 y 4 Sur y Circuito Interior				\$	\$,588,895.40	\$0.00				\$0.00	\$2,779,403.20	\$1,963,377.40			
3	EPO-R-L-1-RE	00	00	Ingeniería y Construcción de las Torres, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 2 y 4 Sur y Circuito Interior, que será compuesto por los siguientes componentes: Puente Vehicular Drenaje ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gto. José María Torres (Proyecto 1), Puente Vehicular	2008-0008	30-12-2008	-	\$2,046,006.40	\$0.00	ANTICIPO	\$504,892.99	N/A	N/A	\$0.00	\$2,779,403.20	\$1,963,377.40	100.0%	74.0%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONO EL PROYECTO COMPLETO, REDESIGNADO EL 24-07-08.
											AMORTIZADO	\$704,892.99								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL									\$	\$,588,895.40	\$0.00			\$0.00	\$2,779,403.20	\$1,963,377.40				
GRAN TOTAL									\$	\$5,480,643.76	\$0.00			\$0.00	\$7,199,043.14	\$3,926,757.40				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

PA
Jorge Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$5,480,643.76	\$0.00	ANTICIPO \$1,526,376.92
		AMORTIZADO \$1,162,622.39
		POR AMORTIZAR \$744,393.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PROYADA	EN TRÁMITE	PROG.	FINANCIER.
\$7,199,043.21	\$1,083,377.40	100%	91%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2008

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

GF

00000033

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de diciembre de 2008

A 31 de diciembre de 2013																			
CÓDIGO	CONTRATO	FECHA	SEGURIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	CONTENIDO (PERÍODO - MONEDA)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	PRELIMINAR	POST-PAID	PACIFIC	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIO		
1	ED06.A0.L.3.0003	01/01/08	SI	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASITAS PARA MODALOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEG. IZAPALAPA ERO. S. Y LOS MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	14-01-08	12-01-08	SI INFORMACIÓN	5,319,544.76		ANTICIPO	2,460,803.40			0.00	0.00	0.00%	30.30%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVÍO A LA SECRETARÍA DE FIANZAS EL C.A.O. CON EL OFICIO N° 045000/07 CONFECCIONADO EN EL 10/01/08
2	ED06.A0.L.3.0075	01/01/08	NO	ALTA PROVISIONES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-ago-08	SI INFORMACIÓN	1,184,302.22		POR AMORTIZAR	585,191.26			0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ESTÁ EN TRÁMITE PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO
3	ED06.A0.L.3.0076	01/01/08	NO	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-ago-08	19-ago-08	SI INFORMACIÓN	1,076,028.83		ANTICIPO	585,014.21			85,010.80	0.00	100.00%	0.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 005-0509-DE-SEA-206-2010, DEL 12/04/10
4	ED06.A0.L.3.0078	01/01/08	NO	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-ago-08	19-ago-08	SI INFORMACIÓN	1,076,028.83		ANTICIPO	585,014.21			848,228.55	0.00	100.00%	79.38%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 005-0509-DE-SEA-206-2010, DEL 12/04/10
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZAPALAPA																			
5	ED06.A0.L.3.0079	01/01/08	NO	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZAPALAPA	31-ago-08	31-ago-08	SI INFORMACIÓN	5,000,000.00		ANTICIPO	1,010,282.40			0.00	506,358.62	1.07%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 EN PODER DEL JURISCO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIÓN EN ADOPAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
5,000,000.00	0.00	ANTICIPO	5,000,000.00
		AMORTIZADO	1,010,282.40
		POR AMORTIZAR	3,989,717.60

TOTAL DE ESTIMACIONES		TOTAL DE AVANCE AL FINAL DEL EJERCICIO	
Presupuesto	En Trámite	Físico	Financiero
5,000,000.00	5,000,000.00	39.27	16.41

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

1. 000.0036

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
(EJERCIO 2011)

Corte al 31 de diciembre de 2011

UNO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN AÑO	TERMINO	RESERVA DE FINANCIACIÓN	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2011	ECUACION	DATOS POR		COMPROBACIÓN MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		RECOMENDACIONES
														MONTO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Constructora del Distributor Vial Andes Periférico-Arco Norte y Ar. Centenario					\$172,370,343.38	\$7,427,526.73	0.00					\$0,000,000.00	\$7,427,526.73	\$0.00			
1	021-01-2307346-04	Fondo Metropolitano	UP	Alfa Proceso y Control, S.A. de C.V.	Construcción del Distributor Vial Andes Periférico-Arco Norte y Ar. Centenario, ubicado en la intersección con el Eje de Acceso y la Delegación Cuauhtémoc, A. Mexico	18/08/2007	30/09/2011	-	\$172,370,343.38	\$7,427,526.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0,000,000.00	\$7,427,526.73	\$0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIÓN DEL 31/08/11. PENDIENTE DE LIQUIDAR PARTE UN ADELDO DE \$541,125.00 DADO A QUE SE TEMA EN PROCESO DE AUDITORIA ADECUADO DE LA CONALUP PARA C.F. 2011 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADECUADO DE LA CONALUP PARA C.F. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE - LIQUIDACIÓN DE PARCELA DE CUMPLIMIENTO VS. VIGILANCIA DOLITIS.
									\$172,370,343.38	\$7,427,526.73	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	31/01/2011	30/09/2011	\$0,000,000.00	\$7,427,526.73	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
									\$172,370,343.38	\$7,427,526.73	0.00					\$0,000,000.00	\$7,427,526.73	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTOS (EN TRÁMITE EJERCICIO 2011)	TOTAL DE ECUACIONES	TOTAL DE ANTICIPOS
\$172,370,343.38	\$7,427,526.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
\$7,427,526.73 0.00 100.00% 99.74%	

px
Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

17-00050039

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

Corte al 31 de diciembre de 2013

CERO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE VIGENCIA		PRELIMINAR DE RETENCIÓN	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO 2013			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Representación de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Variedades Primarias del Distrito Federal				\$208,394.16	\$208,394.16						\$0.00	\$187,336.04	\$0.00			
I	DOP-ADP-3-405-14	Fondo Metropolitano	AP	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	Servicios de obra y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales situados en diversas zonas de la Ciudad de México correspondientes a las polígonos municipales del D.F.	28/08/2014	31/12/2014	-	\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$187,336.04	\$0.00	100.00%	94.98%	Servicios concluidos. Pendiente de recepción y de liquidar la cual se cancelará en la modalidad de ACETAS.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALER									\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00			\$0.00	\$187,336.04	\$0.00					

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2014	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$208,394.16	\$208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGAR	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$187,336.04	0.00	100.00%	94.98%

PA
Ing. Raúl Márquez Martínez
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

SITUACIÓN ACTUAL								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN V/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0000042

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015**

Cuota al 11 de diciembre de 2015

CANT	ALÍNEA	CANTIDAD	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE SETEMPERADA	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONTRATO PERIODO 2015			SOLICITUD		PAGO		PAGO		OBSERVACIONES
						PR	PR				PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
					Reglamento de Infraestructura Urbana (Reglamento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal)				\$7,598,718.20	\$7,598,718.20								\$0.00	\$7,598,718.20	\$0.00		
1	000P-017-1-040-10	Pavimento	M	PAC MAINTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 Puentes Peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, acciones correctivas y repuestos realizados mediante Sistema de Reporte 012	11/01/2015	01/02/2015	*	\$7,598,718.20	\$7,598,718.20	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,598,718.20	\$0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se entregó en la modalidad de ACERVO, en tanto que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la COCER. Reaprovechamiento al 11-01-2017.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTAL									\$7,598,718.20	\$7,598,718.20	\$0.00					\$0.00	\$7,598,718.20	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2015	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$7,598,718.20	\$7,598,718.20	\$0.00	ANTICIPA \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE EJECUCIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADO	CONTRASTE	PAGO	PAGADO
\$7,598,718.20	\$0.00	100.00%	95.04%

PA
 Ing. Juan Manuel Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO 2004

Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

0.000.0046

IMPRESO DE JURANTE FISCALIZADO(S) PARA OBRA PÚBLICA
ENERGO 2016

Enviado a 22 de Dezembro de 2020

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROYECTO O DE MANTENIMIENTO	Monto presupuestado total	Monto contratado a la fecha	COMPROMISO	COMPROMISO PERÍODO MÓVIL			DETENCIÓN		FINANCIACIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					SECO	TERMINO	SECO	FINANCIACIÓN	EN FINANCIACIÓN	FINANCIACIÓN	FINANCIACIÓN		
9	DOCP-64-1-071-16	RECURSOS FINANCIOS	M	PROVEEDORA CADAMCO S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Proyecto 2), integradas por Escuela Secundaria 111, Escuela Vm. Humberto Parraza Jorda (Cda de Sonora), Secundaria 276, Loma Blanca, Primaria Sagrada Familia, Primaria Valentin Velazquez, Secundaria 105, Primaria Santa Clara, Secundaria Tm. 30, Primaria Josefa Hernandez en las Delegaciones Magdalena Contreras y Azcapotzalco, en la Ciudad de Mexico.	01/03/16	31/03/16	-	\$12,281,775	\$12,281,775	60.00	ABORTADO	\$0.00						Trabaja pendiente. Pendiente de confirmación, misma que se sigue en modalidad de ACOPAE. Reaprovechable el 1-ene-17.	
												FOR ABORTADO	\$0.00							
9	DOCP-64-1-079-16	RECURSOS FINANCIOS	M	PROVEEDORA CADAMCO S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 16 Escuelas (Proyecto 5), integradas por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Escuela Pula, Grima Gallo, Escuela Primaria Presidente de Mexico, Escuela Primaria Amador, Loma Blanca, Drenaje de Jalisco, Primaria Mta Jose Guadalupe, Escuela Primaria Toluqueña del Norte, Primaria Gloria Romero, Escuela Secundaria No. 32 (San Felipe Largo), Escuela Secundaria No. 30 "Luisa Guadalupe", Escuela Primaria Miguel Angel Argueta, Primaria Antonio Cano, Escuela Primaria Toluqueña, Escuela Primaria Pascual Garcia, Escuela Primaria Apolo Gordin, Escuela Secundaria 203 Drenaje para todos, Jardín de niños, Primaria S. Emilio, Centro de las Artes, Escuela No. 4021 - M-601, Jardín de niños, Primaria L. Goldenough, en las Delegaciones Miguel Alemán y Nayarit, en la Ciudad de Mexico.	01/03/16	01/03/16	-	\$2,567,676	\$2,567,676	50.00	ABORTADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabaja pendiente. Pendiente de confirmación, misma que se sigue en modalidad de ACOPAE. Reaprovechable el 1-ene-17.
												FOR ABORTADO	\$0.00							
10	DOCP-64-1-082-16	RECURSOS FINANCIOS	M	DISTRIBUIDORA SAK S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 14 escuelas (Proyecto 6), integradas por: Escuela Prim. Santa Maria, Prim. Estelita de la Cruz y la Cruz, Prim. 10, Escuela Sagrada, Prim. Toluqueña, Prim. Centro, Escuela Secundaria Miguel Aleman, Primaria Santa Clara, C. Centro, Primaria Olimpo, Primaria Jose Joaquin Torres Prim. Insurgente, Prim. Prim. Santa Catalina, secundaria en las Delegaciones Santa Clara y Toluqueña, en la Ciudad de Mexico.	01/03/16	01/03/16	-	\$1,444,636	\$1,444,636	50.00	ABORTADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabaja pendiente. Pendiente de confirmación, misma que se sigue en modalidad de ACOPAE. Reaprovechable el 1-ene-17.
												FOR ABORTADO	\$0.00							
11	DOCP-64-1-083-16	RECURSOS FINANCIOS	M	DISTRIBUIDORA SAK S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 15 escuelas (Proyecto 5), integradas por: Primaria Santa Maria Araya, Primaria Republica de Paraguay, Del. Miguel de Cervantes Saavedra y San. No. 47 Toluqueña, Primaria Juan Rull, Primaria No. Miguel Aleman, Primaria Prim. Santa Clara, Primaria Prim. General, Del. Toluca No. 14, San. Miguel, Prim. Toluqueña, Primaria Santa Clara, Prim. Toluqueña de Mexico, Primaria Galileo Galilei, Prim. Del. Secundaria No. 10 "Luisa Guadalupe", Primaria en las Delegaciones Santa Clara, Miguel Alemán, Toluca y Venustiano Carranza, en la Ciudad de Mexico.	01/03/16	01/03/16	-	\$1,444,636	\$1,444,636	50.00	ABORTADO	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabaja pendiente. Pendiente de confirmación, misma que se sigue en modalidad de ACOPAE. Reaprovechable el 1-ene-17.
												FOR ABORTADO	\$0.00							

Downloaded at 21:26 24 December 2019

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, PERO SI LO HUBIERA, SE DEBE ACCEDER A LA MISMA

Arg. Carlos Enrique Mancera Cervera Mas.
Secretaría de Construcción "S1"

Total Contract Value	Revenue Contract Value Recognized in 2016	Total Contract Value	Total Job and Location	
\$9,682,991.47	\$9,682,991.47	\$ 0.00	NEW YORK	0.00
			NEW YORK	0.00
			NEW YORK	0.00
			NEW YORK	0.00

TOTAL DE CONTRIBUÍDORES		TOTAL DE CONTRIBUÍDORES	
Indicador	em milhões	Indicador	em milhões
ET, 644,870,25	6,00	ET, 644,870,25	6,00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	12	4	0	7	9	0	16	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

P.R.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

PA

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000-0051

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Cuota al 27 de diciembre de 2017

CÓDIGO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS PAGADOS EJECUCIÓN 2018	EJECUCIÓN	ANTICIPO		CONVENIO PERÍODO MONEDAS			ESTIMACIÓN		PROMEDIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							MONEDAS	MONEDAS	PROYECTADA	EN TRÁMITE	PROYECTADA	EN TRÁMITE		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.				\$0.0M,000.00	\$0.0M,000.00	\$0.00					\$0.0M,000.00	\$0.0M,000.00	\$0.00			
1	1000AD-1-001-18-010	CRÉDITO	AC	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados del Distrito Federal, ubicado en avenida Chaparral Municipal número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2014-2016	2018-2017	-	\$0.0M,000.00	\$0.0M,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	2018-2017	10-12-2018	\$0.0M,000.00	\$0.0M,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Servicios concluidos. Avance conforme al Contrato de ejecución en trámite y pago al 10 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidación y Recepción. El avance físico financiero corresponde al periodo que se reporta del contrato municipal 1000AD-1-001-18-010, correspondiente al 100% para este periodo (2018-2017) del contrato municipal. Contrato generado en el periodo 2018, que se reporta en este periodo (2017), que se reporta en el que se liquidó.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Destacado y retiro de material de los inmuebles de Bases 10 y Muro de 112				\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00					\$0.00	\$12,000.00	\$0.00			
2	1000AD-1-002-18	RECURSO PROPIO	AC	COORDINACIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MONTAÑA S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Construcción de Bases 10 y Muro de 112, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A continuación del contrato del 10 de septiembre de 2017.	2014-2016	2018-2017	-	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. Recepcionado el 14-jun-18. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Destacado y retiro de material de los inmuebles en calle Hamburg 112				\$0.0M,000.00	\$0.0M,000.00	\$0.00					\$0.00	\$0.0M,000.00	\$0.00			
3	1000AD-1-003-18	RECURSO PROPIO	AC	PROCESOR DE INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	Destacado y retiro de material de los inmuebles en calle de Hamburg número 112, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A continuación del contrato del 10 de septiembre de 2017.	2014-2016	2018-2017	-	\$0.0M,000.00	\$0.0M,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.0M,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-18. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	1000AD-1-004-18	RECURSO PROPIO	AC	GRUPO CONSTRUCTORA DAFNÍ S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Construcción y Retiro de material de inmuebles ubicado en calle de Hamburg número 112, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A continuación del contrato del 10 de septiembre de 2017.	2014-2016	2018-2017	-	\$405,000.00	\$405,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-18. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Mejoramiento a Puentes Peatonales en Vialidades Principales del Distrito Federal (2018).				\$0.0M,000.00	\$0.0M,000.00	\$0.00					\$0.00	\$0.0M,000.00	\$0.00			
5	1000AD-1-005-18	RECURSO PROPIO	AC	CONSTRUCCION ROMA S.A. DE C.V.	Mejoramiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de pláticas cualitativas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 911 y atención programada.	2014-2016	12-12-2016	-	\$0.0M,000.00	\$0.0M,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.0M,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-18. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	1000AD-1-006-18	RECURSO PROPIO	AC	SECTOR CONSTRUCCIONES MATE S.A. DE C.V.	Mejoramiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de pláticas cualitativas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 911 y atención programada.	2014-2016	12-12-2016	-	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. Recepcionado el 28-jun-18. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2018

Cuota al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	REGIMEN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO ESTIMADO	MONTOS CONTRATADOS	EJERCIO 2017	EJERCIO 2018	MONTOS PAGADOS	MONTOS POR PAGAR	CUMPLIMIENTO			ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO							REALIZADO	PARCIAL	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	PROYECTADA	PROYECTADA		
1	2007-03-1-0-001-18	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES	A2	CONSTRUCCIONES I SAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento preventivo y preventivo de 81 Puentes Perforados y 6 estructuras de concreto de calzadas existentes, sustitución material al sistema de drenaje CD y muestreo programado, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	01/01/2018	31/12/2018	0	000,000.00	000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Señalar - Construcción - Pendiente de Liquidación	
TOTAL												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA RED.

P.A.
Ing. Carlos Enrique Mancera Contreras
Subsecretaría de Construcción "A2"

PX
Ing. Roberto Martínez
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS PAGADOS EJERCIO 2018	TOTAL DE EJERCICIOS	TOTAL DE PAGOS
35,874,728.41	27,854,301.93	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO
PAGADA	EN TRÁMITE	PROYECTADA	PROYECTADA
31,464,371.98	0.00	0.00	0.00

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

00000054

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA ESPECIAL 2014
 BOGOTÁ DE DICIEMBRE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2013

[illegible][illegible]

TOTAL OF PARTICIPANTS		NUMBER OF PARTICIPANTS BY SEX	
MALE	FEMALE	MALE	FEMALE
1,111,141,101.00	61,141,101.00	100%	61.14%

SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN

WILFRED ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y

* 000 0155



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	1	0	2	11	1	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	44	0	7	0	37	0	37	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	14	0	3	0	11	0	11	0
TOTAL	71	1	10	2	60	1	61	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 12 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 13 QUE SE REPORTAN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 12 CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	1	0	2	11	1	12	0
TOTAL	12	1	0	2	11	1	12	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y DOCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 13 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 12 CONCLUIDOS, SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2009

Cuenta de IVA de compradores de 1993

CÓDIGO	NOMBRE	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		FRECUENCIA DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJECUCIÓN MES	ECONOMÍA	ACTIVOS		CUMPLIMIENTO PERÍODO MONTOS			SOLICITUD		PAGOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					MONTOS	PAGOS	EN TRANSITO	TERMINO	PAGOS					
					Reapertura del Museo Interactivo Infantil Chapultepec				\$103,746,821.91	\$119,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0,391,746.91	\$885,479.40				
1	SOOP LPI-1-14-1885-12	PARTICIPACIÓN	UPN	GRUPO CORPORATIVO AMADOR, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec	28/12/2016	31/05/2018	-	\$80,040,301.83	\$10,144,346.19	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	18/12/2016	31/05/2018	\$0.00	\$20,416,469.87	\$885,479.40	10.00%	4.14%	El avance físico y financiero correspondiente al contrato que se reporta del contrato mensual del mes de 5 de mayo. Estado de ejecución, con fecha de término de 7 de mayo de 2018. Continúa con los trabajos de construcción.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	SOOP LPI-1-3-388-18	PARTICIPACIÓN	40	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicio de supervisión técnica y financiera para la obra del Museo Interactivo Infantil Chapultepec, primera etapa ubicada en Colón, Estado de México, No. 2025 esquina Calle Toluca, Colonia Las Águilas, Avenida Chapultepec, C.P. 56500, en la Ciudad de México.	04/10/2016	31/12/2018	-	\$1,889,891.94	\$1,889,891.94	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,889,891.94	\$0.00	100.00%	98.00%	Servicio concluido. Pendiente de liquidar y Reaportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	SOOP LPI-1-2-485-18	PARTICIPACIÓN	40	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec (segunda etapa) ubicado en Colón, Estado de México, No. 2025 esquina Calle Toluca, Colonia Las Águilas, Avenida Chapultepec, C.P. 56500, en la Ciudad de México.	28/12/2016	10/12/2018	-	\$89,636,378.94	\$40,000,000.00	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$20,416,469.87	\$0.00	10.00%	15.64%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Reaportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec y del Centro de Salud				\$20,332,961.36	\$20,332,961.36	\$0.00				\$0.00	\$20,332,961.36	\$0.00				
4	SOOP LPI-1-4-873-18	RECURSOS FISCALES	UPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Salud (Centro de Salud) en Toluca, Estado de México, No. 14, Colonia Las Águilas, Avenida Chapultepec, C.P. 56500, en la Ciudad de México.	11/08/2016	31/12/2018	-	\$19,473,360.70	\$19,473,360.70	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,473,360.70	\$0.00	100.00%	98.90%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Reaportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	SOOP LPI-1-4-885-18	RECURSOS FISCALES	UPN	DESARROLLOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Salud (Centro de Salud) en Toluca, Estado de México, No. 14, Colonia Las Águilas, Avenida Chapultepec, C.P. 56500, en la Ciudad de México.	11/07/2016	31/12/2018	-	\$19,889,362.10	\$19,889,362.10	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,889,362.10	\$0.00	100.00%	99.94%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Reaportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Ampliación, Adquisición, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y menor a Centros de Salud				\$76,161,702.00	\$76,161,702.00	\$0.00				\$0.00	\$76,161,702.00	\$0.00				
6	SOOP LPI-1-4-881-18	RECURSOS FISCALES	40	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Salud (Centro de Salud) en Toluca, Estado de México, No. 14, Colonia Las Águilas, Avenida Chapultepec, C.P. 56500, en la Ciudad de México.	02/07/2016	31/12/2018	-	\$3,761,841.35	\$3,761,841.35	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,146,820.18	\$0.00	100.00%	99.53%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Reaportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	SOOP LPI-1-4-881-18	RECURSOS FISCALES	40	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Salud (Centro de Salud) en Toluca, Estado de México, No. 14, Colonia Las Águilas, Avenida Chapultepec, C.P. 56500, en la Ciudad de México.	10/07/2016	31/12/2018	-	\$3,411,083.24	\$3,411,083.24	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,380,803.17	\$0.00	100.00%	99.40%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Reaportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	SOOP LPI-1-4-881-18	RECURSOS FISCALES	UPN	ADOPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" en Toluca, Estado de México, No. 14, Colonia Las Águilas, Avenida Chapultepec, C.P. 56500, en la Ciudad de México.	11/07/2016	31/12/2018	-	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,406,361.67	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Reaportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	SOOP LPI-1-4-881-18	RECURSOS FISCALES	UPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" en Toluca, Estado de México, No. 14, Colonia Las Águilas, Avenida Chapultepec, C.P. 56500, en la Ciudad de México.	11/07/2016	31/12/2018	-	\$18,000,000.00	\$18,421,488.00	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,421,488.00	\$0.00	100.00%	99.97%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Reaportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	SOOP LPI-1-4-881-18	RECURSOS FISCALES	UPN	DESARROLLOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Salud "Toluca", ubicado en Toluca, Estado de México, No. 14, Colonia Las Águilas, Avenida Chapultepec, C.P. 56500, en la Ciudad de México.	11/07/2016	31/12/2018	-	\$18,000,000.00	\$18,264,064.13	\$0.00	ACTIVO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,227,794.09	\$0.00	100.00%	99.90%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Reaportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS EJECUTADOS EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	RECURSOS		CÓMPUTO PERÍODO MONTOS			ESTIMACIONES		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	3000PADI-4-08-18	RECURSOS PROPIOS	40	SHERRON CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	Proyecto Integral para los Trámites de rehabilitación e ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en Calle Prados S/N, entre avenida y Prados de San José, C.P. 15 800, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	10/10/2018	31/12/2018	\$15,000,000.00	\$17,391,399.00	\$17,391,399.00	00.00	ARTICULO		0.00							Trámites concluidos. Responderá el 21-de-2018. Pendiente de liquidar
					Reforma Centro de Salud Topilejo				\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	00.00			00.00	\$1,500,000.00	00.00					
12	3000PADI-4-03-18	RECURSOS PROPIOS	40	GRUPO DN S.A. DE CV	Construcción de Centro Deportivo, cabaña y servicios para rehabilitación y apoyo al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpán ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalpán, C.P. 14500, Alcaldía Tlalapa, en la Ciudad de México.	31/10/2018	08/11/2018	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	00.00	ARTICULO		0.00							Trámites concluidos. Pendiente de liquidar Responderá.
											00.00	AMORTIZADO		0.00							
											00.00	POR AMORTIZAR		0.00							
15	3000PADI-4-04-18	RECURSOS PROPIOS	40	GRUPO DN S.A. DE CV	Construcción de áreas y servicios profesionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Tlalpán, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpán ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalpán, C.P. 14500, Alcaldía Tlalapa, en la Ciudad de México.	31/10/2018	08/11/2018	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	00.00	ARTICULO		0.00							Trámites concluidos. Pendiente de liquidar Responderá.
											00.00	AMORTIZADO		0.00							
											00.00	POR AMORTIZAR		0.00							
TOTAL									\$34,440,899.00	\$37,891,499.00	00.00			00.00	\$34,440,899.00	\$37,891,499.00					

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPLACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.


Cec. Carlos Enrique Méndez Contreras
Subdirección de Construcción "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ARTÍCULOS
\$34,440,899.00	\$37,891,499.00	0.00	ARTICULO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	MONTOS DE PERÍODO FINANCIERO
PAGOS	EN TRÁMITE
\$34,440,899.00	\$37,891,499.00
00.00%	00.00%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

 000.0061 

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2023																				
NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-6-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A. de C.V.	Servicios de supervisión para la construcción del piso de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	6.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Aute Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	6.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alejandro Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	44	0	7		0	37	0	37	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FISCAL FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALIADOS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "E"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PROMEDIO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS	EJECUTADO	IMPORTE		CONSEGUIMIENTO		MONTOS	EJECUTADO		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO		RECIBO	TERMINO			
13	DGCOP-LPN-L-4-154-19	25	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN S.E. Y DISTRITO FRANCISCO DEL PAÍS Y TRONCAL DE	05/05/19	30/12/19	*	7,991,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	385,261.60	0.00	4.82%	4.80%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
14	DGCOP-LPN-L-4-155-19	25	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA	05/05/19	30/12/19	*	16,257,888.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,361.04	0.00	7.08%	7.09%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
15	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	LPN	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUERPOS DE ALMACÉN DE LABORATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE AMPLIACIÓN DEL RUMI N.º 200, COL. ALVARO, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/05/19	24/12/19	*	26,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
16	DGCOP-AD-L-3-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	09/05/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
17	DGCOP-AD-L-3-205-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	05/05/19	24/08/19	*	921,034.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	921,034.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
18	DGCOP-AD-L-3-210-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	05/05/19	24/09/19	*	1,827,927.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,827,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
19	DGCOP-AD-L-3-217-19	25	A.D.	CMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/05/19	26/09/19	*	1,253,244.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,244.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
20	DGCOP-AD-L-3-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/10/19	21/10/19	*	1,639,635.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,639,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
21	DGCOP-AD-L-3-251-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24/05/19	13/10/19	*	1,840,891.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,840,891.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
22	DGCOP-AD-L-3-263-19	15	A.D.	HALLS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/05/19	29/10/19	*	383,293.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	383,293.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
23	DGCOP-AD-L-3-265-19	15	A.D.	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS OYIM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/10/19	30/10/19	*	816,187.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	816,187.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
24	DGCOP-LPN-L-4-260-19	25	LPN	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JARDINES PLANTAS, PLANTAS PARA DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHURUBUSCO DE COLÓN AVILA, C.P. 06000, ALZADO DE OBRAS, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26/05/19	23/03/20	*	61,254,950.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.

00000065

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2019[illegible]

00090266



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	14	0	3	0	11	0	11	0
TOTAL	14	0	3	0	11	0	11	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

1. 0001 0168

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA CADA FORMA DE RENTA 2000
Hasta de corte al 31 de diciembre de 2000

[illegible]

* 000 0069

INFORME DE AYOUBA ISSOU PRÉFICENT FUSIL (GRAN PUBLICA BURUNDI) ESTE
FUSIL DE COMBAT AL. 81 DE DICIEMBRE DE 2020

[illegible]

1998

Entity (Company Name)	Total CO ₂ (2012-2013)	Total CH ₄ and N ₂ O (2012-2013)
2012.01.01-2013.01.01	0.00	0.00

Cost of Information		Market Impact, %	
Market	Estimate	1992	1993
U.S. Stock Market	0.20	0.00	0.00

*No ex-ante/ongoing fee reduction programme implemented per effort to save at distance. Study a literature on the subject ongoing.

10/24/2011 11:41 AM

MTRO. SPAIN & J. J. MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS TO



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	43	1	0	9	35	0	44	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	111	0	14	1	96	1	96	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
	169	1	14	10	146	1	155	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 43 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 44 QUE SE REPORTAN, 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, 43 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES 9 ESTAN RECEPCIONADOS)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS V/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN V/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	43	1	0	9	35	0	44	0
TOTAL	43	1	0	9	35	0	44	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CUARENTA Y TRES ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 44 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, 43 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

P.A.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

P.A.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000-0073

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Como al 31 de diciembre de 2020

CÓDIGO	NOMBRE	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTALES	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	SOLICITUD	AUTORIZACIÓN		COMPROBACIÓN DE PAGOS		MONTOS PAGADOS	EN TRANSITO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					IMPORTE	TERMINO	PROG.	FINANCIERO					
					Reconstrucción del Museo Interactivo Anáhuac (2a Etapa)				\$17,200,000.00	\$17,200,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1	DOCPH-L-3-45-19	PARTICIPACIÓN S	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del Museo Interactivo Anáhuac (segunda etapa) ubicado en Calles Santa Fe y Calles No. 200 esquina Calle Huasteca, Colonia Las Américas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 06000, en la Ciudad de México	2019/01/19	10/10/2020	-	\$99,236,276.94	\$99,236,276.94	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
2	DOCPH-L-3-20-20	PARTICIPACIÓN S	AD	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Anáhuac (segunda etapa) ubicado en Calles Santa Fe y Calles No. 200 esquina Calle Huasteca, Colonia Las Américas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 06000, en la Ciudad de México	24/08/2020	30/10/2020	-	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Servicios concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
					Reconstrucción de Puente Peatonal de Vialidad Fronteriza de la Ciudad de México (2020)				\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
3	DOCPH-L-1-08-20	RECURSOS PROPIOS	AD	INGENIERÍA APLICADA SINGO S.A. DE C.V.	Reconstrucción de puente y obras de 8 puentes peatonales, ubicados en diversas zonas de la Ciudad de México, dentro de las zonas de rehabilitación y renovación programadas	24/08/2020	30/10/2020	-	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Subcontratado el 27 de mayo 2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
					Reconstrucción del Bar-Zabazapalapa en la Ciudad de México				\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
4	DOCPH-L-1-4-03-20	PARTICIPACIÓN S	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bicentenario del Bar-Zabazapalapa, ubicado en Eje 3 Oriente Fronteriza del Paso y Troncales, No. 195, Colonia Grupos de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México	30/08/2020	11/10/2020	-	\$17,772,827.89	\$17,772,827.89	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
5	DOCPH-L-3-18-20	PARTICIPACIÓN S	AD	GRUPO DL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos de Construcción del Bicentenario del Bar-Zabazapalapa, ubicado en Eje 3 Oriente Fronteriza del Paso y Troncales, No. 195, Colonia Grupos de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México C.P. 06000	30/08/2020	31/10/2020	-	\$1,254,720.40	\$1,254,720.40	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
6	DOCPH-L-4-20-20	PARTICIPACIÓN S	AD	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bicentenario del Bar-Zabazapalapa, ubicado en el carril central del carril de Toluca, esquina Calle Progreso en la zona, colonia Las Américas, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México	30/08/2020	31/10/2020	-	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
					Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento integral por etapas a Calles de Salud				\$71,000,000.00	\$71,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
7	DOCPH-L-4-05-20	PARTICIPACIÓN S	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tormenta, ubicado en Calles Santa Fe y Calles No. 200 esquina Calle Huasteca, C.P. 06000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	31/07/2020	30/10/2020	-	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
8	DOCPH-L-4-10-20	PARTICIPACIÓN S	AD	CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tormenta, ubicado en Calles Santa Fe y Calles No. 200 esquina Calle Huasteca, C.P. 06000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	11/07/2020	31/10/2020	-	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
9	DOCPH-L-4-05-20	PARTICIPACIÓN S	LPN	UNION, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tormenta, ubicado en Calles Santa Fe y Calles No. 200 esquina Calle Huasteca, C.P. 06000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	11/08/2020	31/10/2020	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	40.00%	40.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar. NOTA: El porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, correspondiente a 100%, para este servicio 2020 del contrato subcontratado.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
10	DOCPH-L-4-10-20	PARTICIPACIÓN S	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVILA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tormenta, ubicado en Calles Santa Fe y Calles No. 200 esquina Calle Huasteca, C.P. 06000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	23/08/2020	31/10/2020	-	\$1,447,327.94	\$1,447,327.94	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	00.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar. NOTA: El porcentaje de avance físico que se presenta para este servicio, correspondiente a 100%, para este servicio 2020 del contrato subcontratado.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

CATEG.	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	SOLICITA	ARTÍCULO		ESTIMADO (PROMEDIO - MONTOS)			ESTIMADO		AVANCE %		OBSERVACIONES
						2020	2020-2021					2020	2020-2021	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	PROMEDIO	PROMEDIO			
11	DCCOP-PL-4-188-20	PARTICIONAR	UPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (MOMSA, S.A. DE C.V.)	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Mejoramiento del Centro de Salud Solidaridad Teztlahuacán, ubicado en Calle José María Morelos y Calle Vialva, Guadalupe, S/N, Col. Solidaridad Teztlahuacán, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02700, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	07/08/2020	07/04/2021	-	\$17,407,388.00	\$8,754,888.00	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,754,888.00	\$0.00	46.97%	46.94%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual (MOMSA) y el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								
12	DCCOP-AD-4-501-20	PARTICIONAR	AD	GRUPO CONSTRUCTOR (BOSCH, S.A. DE C.V.)	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Mejoramiento del Centro de Salud Solidaridad Teztlahuacán, ubicado en Calle José María Morelos y Calle Vialva, Guadalupe, S/N, Col. Solidaridad Teztlahuacán, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02700, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	10/09/2020	07/05/2021	-	\$1,404,380.18	\$845,380.97	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$845,380.97	\$0.00	60.21%	60.21%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual (BOSCH) y el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								
13	DCCOP-AD-4-508-20	PARTICIONAR	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Especializada de Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Av. Pío del Río Horta, s/n, Col. San Luis, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02800, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	01/08/2020	11/12/2020	-	\$1,809,024.00	\$1,809,024.00	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,809,024.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								
14	DCCOP-AD-4-516-20	PARTICIONAR	AD	GRUPO CONSTRUCTOR (BOSCH, S.A. DE C.V.)	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Mejoramiento del Centro de Salud Villa María Alta, ubicado en Calle Vialva, Guadalupe, S/N, Col. Solidaridad Teztlahuacán, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02700, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	01/10/2020	07/07/2021	-	\$1,313,314.96	\$881,884.97	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$881,884.97	\$0.00	67.19%	67.19%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual (BOSCH) y el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								
15	DCCOP-PL-4-321-20	PARTICIONAR	M	SABINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Mejoramiento del Centro de Salud Villa María Alta, ubicado en Calle Vialva, Guadalupe, S/N, Col. Solidaridad Teztlahuacán, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02700, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	06/01/2020	06/08/2021	-	\$11,407,375.94	\$2,890,000.00	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,890,000.00	\$0.00	25.14%	25.14%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual (SABINO) y el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								
16	DCCOP-AD-4-1-05-20	PARTICIONAR	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interno y Externo para la Clínica Especializada de Medicina Integrativa (CEMI), ubicada en Av. Pío del Río Horta, s/n, Col. San Luis, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02800, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	01/10/2020	07/07/2021	-	\$1,870,000.00	\$1,870,000.00	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,870,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								
					Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,888,484.73	\$14,888,484.73	\$0.00					\$0.00	\$14,888,484.73	\$0.00			
17	DCCOP-PL-4-288-20	PARTICIONAR	M	AG-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en Calle Manuel Capón No. 470 esquina Calle Plan de San Luis, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02800, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	01/08/2020	07/12/2020	-	\$13,408,987.00	\$13,408,987.00	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,408,987.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								
18	DCCOP-AD-4-5-04-20	PARTICIONAR	AD	GRUPO CONSTRUCTOR (BOSCH, S.A. DE C.V.)	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en Calle Manuel Capón No. 470 esquina Calle Plan de San Luis, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02800, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	07/08/2020	07/12/2020	-	\$1,228,888.00	\$1,228,888.00	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,228,888.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								
					Proyecto integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada				\$18,127,964.73	\$18,127,964.73	\$0.00					\$0.00	\$18,127,964.73	\$0.00			
19	DCCOP-PL-4-4-04-20	PARTICIONAR	UPN	AG-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Capón No. 470 esquina Calle Plan de San Luis, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02800, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	01/08/2020	07/12/2020	-	\$13,875,186.00	\$13,875,186.00	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,875,186.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								
20	DCCOP-AD-4-5-03-20	PARTICIONAR	AD	GRUPO CONSTRUCTOR (BOSCH, S.A. DE C.V.)	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Capón No. 470 esquina Calle Plan de San Luis, Puntos de Interés Teztlahuacán, C.P. 02800, Alcaldía Tlalauacán, Ciudad de México.	01/08/2020	07/12/2020	-	\$1,248,000.00	\$1,248,000.00	\$0.00	ARTÍCULO	90.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,248,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
												AMORTIZADO	90.00								
												POR AMORTIZAR	90.00								

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Oficina de Construcción de Obras Públicas "A"

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

BASE	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS PAGADOS SUBTOTAL	SOLICITA	ANTICIPOS	CANTIDAD (PROMEDIO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						MONTOS	PAGOS	ESTIMACIÓN	PROMEDIO	FINANCIAMIENTO				
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud				\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$0.00				\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00				
21	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S. ACREDITADO	AG	INSTRUMENTAL S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Comarca de San Miguel, S. de C. (ubicado en Avda de San Miguel, S. de C. - C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México).	14/08/2020	31/12/2020	-	\$1,540,907.37	\$1,540,907.37	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,540,907.37	\$0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 2 de ago 2021. Pendiente de Liquidar.
22	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S. ACREDITADO	AG	ARQUITECTON DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-88 Remanente, ubicado en Av. San Miguel S/N Mx 17.5, entre Cuarte Camacho San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Remanente, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	14/08/2020	31/12/2020	-	\$1,384,702.38	\$1,384,702.38	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,384,702.38	\$0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 19 de oct 2021. Pendiente de Liquidar.
23	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S. ACREDITADO	AG	GRUPO CONSTRUCTOR ALBA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-88 Remanente, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Cuauhtémoc, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	14/08/2020	31/12/2020	-	\$1,240,801.44	\$1,240,801.44	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,240,801.44	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 18 de oct 2021. Pendiente de Liquidar.
24	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S. ACREDITADO	AG	INSTRUMENTAL S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud S-4 Santa Catalina, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Santa Catalina, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	14/08/2020	31/12/2020	-	\$985,046.78	\$985,046.78	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$985,046.78	\$0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 18 de oct 2021. Pendiente de Liquidar.
25	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S. ACREDITADO	AG	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud General Remanente, ubicado en Calle Río San Mateo de López Matías S/N Col. San Mateo General Remanente, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	14/08/2020	31/12/2020	-	\$1,344,570.91	\$1,344,570.91	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,344,570.91	\$0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
					Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos hospitales de salud de la Ciudad de México.				\$7,296,303.89	\$7,296,303.89	\$0.00				\$0.00	\$7,296,303.89	\$0.00				
26	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S.	AG	CONSTRUCTORA PERISCO, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Salud General Remanente, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Cuauhtémoc, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	-	\$1,274,369.84	\$1,274,369.84	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,274,369.84	\$0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
27	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S.	AG	CONSTRUCTORA PERISCO, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Salud General Remanente, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Cuauhtémoc, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	12/04/2020	21/04/2020	-	\$475,071.28	\$475,071.28	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$475,071.28	\$0.00	100.00%	99.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
28	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S.	AG	GRUPO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Salud General Remanente, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Cuauhtémoc, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$674,830.62	\$674,830.62	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$674,830.62	\$0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
29	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S.	AG	EMPRESA DE DESARROLLO OTIS, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Salud General Remanente, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Cuauhtémoc, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$1,887,157.66	\$1,887,157.66	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,887,157.66	\$0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
30	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S.	AG	ECOSOLAR OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Salud General Remanente, ubicado en Calle Río San Mateo de López Matías S/N Col. San Mateo General Remanente, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	27/04/2020	28/04/2020	-	\$133,158.42	\$133,158.42	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$133,158.42	\$0.00	100.00%	99.40%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 7 de ago 2021. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
31	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S.	AG	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICA S. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Salud General Remanente, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Cuauhtémoc, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	10/04/2020	30/05/2020	-	\$396,281.36	\$396,281.36	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$396,281.36	\$0.00	100.00%	91.28%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
32	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S.	AG	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICA S. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Salud General Remanente, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Cuauhtémoc, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	30/05/2020	14/06/2020	-	\$391,430.76	\$391,430.76	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$391,430.76	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.
33	DOCCP-AD-L-3-28-20	PARTICIPACION S.	AG	DESARROLLOS DE PROYECTOS DE OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Salud General Remanente, ubicado en Calle Río San Mateo de López Matías S/N Col. San Mateo General Remanente, C.P. 10000, Estado de México, en la Ciudad de México.	10/05/2020	10/05/2020	-	\$398,775.19	\$398,775.19	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$398,775.19	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 7 de ago 2021. Pendiente de Liquidar y Reaprovechados.

1. 00020076



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	EJECUCIÓN	RENTAS		CONVENIO PERSONAL MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					MONTO	MONTO	MONTO	PAIDAR	EN TRÁMITE	PROG.	FINANCIADO			
34	2020CP-01-0-00000000	PROYECTO DE	AC	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS S.A. DE C.V.	Trabajo de la construcción de Hospital General para la atención de personas afectadas por COVID-19 en el Hospital General Tlalisco, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Tuna No. 888, Col. Vía Centroamericana 1, Sección Tlalisco, C.P. 10000, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	-	\$666,873.11	\$666,873.11	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	00.00	00.00	\$666,873.11	\$0.00	100.00%	90.00%	Trabajo concluido. Revisado el 11 sep 2020. Pendiente de liquidar.	
35	2020CP-01-0-00000000	PROYECTO DE	AC	WADA INGENIERÍA S.A. DE C.V.	Servicio relativo a "Módulo Técnico de Inspección Visual de Pavimento de Seguros, Estructura y de las Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y de Gas, en el Centro de Mantenimiento de la Olla (C.M.O.) Las Vigas perteneciente de los hospitales: Hospital General de Tlalisco, Hospital de Especialidades Dr. Roberto Goñi y Hospital General Dr. Enrique Cabero ubicado en la Ciudad de México".	01/04/2020	30/06/2020	-	\$150,188.98	\$150,188.98	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	00.00	00.00	\$150,188.98	\$0.00	100.00%	90.14%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Revisado.	
					Complejo Cultural Enrique de Chapultepec.				\$67,241,475.28	\$0.00	00.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
36	2020CP-01-0-00000000	FONDO DE CAPITALIZAC.	IF	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MONTELLI S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adornamiento de la Teatro Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Barón, Salto de Encarnación de la Secretaría de Cultura, El Centro y Encarnación, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Centro Histórico del Centro, Cuernavaca Chapultepec, C.P. 11580, Avenida Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2020	30/06/2020	-	\$4,414,007.08	\$0.00	00.00	AMORTIZADO	\$1,384,288.12	18/02/2020	14/07/2020	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. Revisado el 23 de 2020. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
37	2020CP-01-0-00000000	FONDO DE CAPITALIZAC.	IF	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adornamiento de Teatro 2do. Capilla, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Centro Histórico del Centro, Cuernavaca Chapultepec, C.P. 11580, Avenida Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2020	30/06/2020	-	\$2,106,238.47	\$0.00	00.00	AMORTIZADO	\$602,771.68	10/02/2020	08/07/2020	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
38	2020CP-01-0-00000000	FONDO DE CAPITALIZAC.	IF	DISTRIBUIDORA DE ALUMINOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adornamiento de la Primera Etapa de la Academia del Museo del Barrio (Museo de Historia) ubicado en Av. Miguel Chapultepec, la Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2020	30/06/2020	-	\$2,402,728.48	\$0.00	00.00	AMORTIZADO	\$728,818.78	08/02/2020	01/07/2020	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
39	2020CP-01-0-00000000	FONDO DE CAPITALIZAC.	IF	GRUPO CONSTRUCTORA RAMIREZ Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adornamiento de la Plaza Principal, Cultura y la Sala de los Sábios del Museo Nacional de Historia "Cuernavaca de Chapultepec" ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S.A. Cuernavaca Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Avenida Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2020	30/06/2020	-	\$0,760,178.38	\$0.00	00.00	AMORTIZADO	\$1,737,283.01	18/02/2020	08/08/2020	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
40	2020CP-01-0-00000000	FONDO DE CAPITALIZAC.	IF	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adornamiento de las Areas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siglo XIX ubicado en Calle A Pasa No. 28 entre Miguel y Miguel Polanco, C.P. 11580, Avenida Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2020	31/12/2020	-	\$2,402,728.48	\$0.00	00.00	AMORTIZADO	\$7,288,818.78	08/02/2020	01/07/2020	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
41	2020CP-01-0-00000000	FONDO DE CAPITALIZAC.	IF	AC-CARREY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adornamiento de las Areas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rubén Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 81, Sección de Chapultepec, Primera Sección, C.P. 11580, Avenida Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2020	30/06/2020	-	\$1,115,888.07	\$0.00	00.00	AMORTIZADO	\$0,102,367.48	08/02/2020	01/08/2020	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
42	2020CP-01-0-00000000	FONDO DE CAPITALIZAC.	IF	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adornamiento de Teatro Guillermo Ochoa, ubicado en Av. Paseo de la Reforma del Centro, Cuernavaca Chapultepec, C.P. 11580, Avenida Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	08/01/2020	30/06/2020	-	\$2,386,204.88	\$0.00	00.00	AMORTIZADO	\$688,497.48	08/02/2020	01/07/2020	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Cueto al 31 de diciembre de 2023

CANTO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO MONTOS			EFECTUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGAR	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
02	2023P-LPSP-4-019-23	FINANCIEROS DE CAPITAL	LP	GRUPO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la mejora de la seguridad vial en la zona de la Avenida Insurgentes Sur, entre la Avenida Chapultepec y la Avenida Miguel Alemán, C.P. 11500, Ciudad de México.	04/01/2023	31/12/2023	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIP.	\$0,000,000.00	04/01	04/01	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	El avance financiero para este periodo, hasta el 31 de diciembre de 2023, es de \$0.00, correspondiente al pago del anticipo.	
												ACERTUACIÓN	\$0,000,000.00								
												POR ACERTUAR	\$0.00								
03	2023P-LPSP-5-015-23	FINANCIEROS DE CAPITAL	IP	CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	Servicio de apoyo técnico, administrativo y operativo para la construcción, rehabilitación, renovación, conservación y adecuación de las obras de infraestructura vial en la zona de la Avenida Chapultepec, entre la Avenida Insurgentes Sur y la Avenida Miguel Alemán, C.P. 11500.	01/01/2023	31/12/2023	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIP.	\$1,200,000.00	04/01	04/01	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	El avance financiero para este periodo, hasta el 31 de diciembre de 2023, es de \$1,200,000.00, correspondiente al pago del anticipo.	
												ACERTUACIÓN	\$1,200,000.00								
												POR ACERTUAR	\$0.00								
TOTAL									\$32,000,000.00	\$32,000,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0,000,000.00	\$0.00					

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECEPCIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.


Ing. Carlos Enrique Méndez Contreras
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2023	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ARTÍCULOS
\$32,000,000.00	\$32,000,000.00	\$0.00	ARTÍCULO
			ARTÍCULO
			POR PAGAR

TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ARTÍCULOS	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ARTÍCULOS
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

* NOTA: SE DEBE DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS RESULTANTES.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	111	0	14		1	96	1	96	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]

7. 00000081

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA, ORGANOS DECONCENTRADOS, AGENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS 11

CONTINUED ON BACK COVER

INFORME DE AVANCE FUSCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

[illegible]

033 9082

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NOMBRE DEL CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		VALOR CONTRATADO	EJECUCIÓN	ANTICIPA	DETALLE PERIODO (MAYO)			EJECUCIÓN		PAGO A		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	RECIBO	PAGAR	EN TRÁMITE	PAGO	TERMINADO		
64	DGCOP-IR-L-5-243-20	10	IR	R.L.C. INFRAESTRUCTURA	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	26/10/20	30/06/21	1,033,773.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,033,960.97	0.00	100.00%	85.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
65	DGCOP-IR-L-5-243-20	25	IR	GRUPO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	30/03/20	28/03/21	3.3 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,844,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
66	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	IR	MC CARTNEY INTERVACION AL S. DE R.L	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	21/09/20	18/01/21	5,558,189.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,587,938.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
67	DGCOP-IR-L-4-248-20	25	IR	MC CARTNEY INTERVACION AL S. DE R.L	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	21/09/20	18/01/21	10 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	7,808,829.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
68	DGCOP-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANEOS" DE PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	21/09/20	28/12/20	0.49 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
69	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	21/09/20	18/03/21	3.7 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	2,994,943.88	0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
70	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	IR	GRUPO PLAMIE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	24/09/20	22/03/21	2.8 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
71	DGCOP-AD-L-3-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	14/08/20	03/10/20	1.86 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
72	DGCOP-AD-L-3-266-20	25	A.D.	CONFORMA CONSTRUCTO RES. S.A. DE C.V.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	29/08/20	18/10/20	1.88 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,778,262.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOP-IR-L-4-269-20	25	IR	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	28/09/20	28/01/21	6.50 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	8,796,138.25	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOP-IR-L-5-270-20	11	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	01/10/20	31/12/20	1.21 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,118,932.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	2,662,124.52	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,912,283.87	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOP-IR-L-4-273-20	25	IR	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	08/10/20	11/02/21	8.58 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	7,162,021.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOP-LPH-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACION Y PROMOCION DE LA	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	02/10/20	29/01/21	18.50 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	02/10/20	27/03/21	4,563,055.38	23,010,111.38	0.00	100.00%	96.23%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	IR	PARADOXA, S.A. DE C.V.	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	6,307,946.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
80	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	IR	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	5,823,990.38	0.00	100.00%	66.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOP-LPH-L-4-278-20	25	L.P.N.	CONAR CONSORCIO DE	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	07/10/20	05/03/21	16.35 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	14,549,934.83	0.00	93.90%	88.95%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA	
82	DGCOP-LPH-L-1-279-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCION NA CONDESA, S.A. DE C.V.	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	15/10/20	11/02/21	14.10 MDP	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	30/08/21	24/10/21	3,167,613.97	15,932,547.71	0.00	100.00%	83.30%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-IR-L-3-285-20	25	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION	PROYECTO TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERNA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE PROYCCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	30/10/20	21/01/21	3,696,883.22	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	3,696,883.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
84	DGCOP-AD-L-3-291-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANEOS" DE PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	22/10/20	29/11/20	1,453,140.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
85	DGCOP-AD-L-3-292-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SERA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANEOS" DE PROYECTOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN	28/10/20	26/11/20	1,197,108.40	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	1,197,108.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

1. 00970083



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍA, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2020

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CMS	PROYECTO	TP	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	PRECIOS C/DE MONTAJE	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	CONTRATO PRINCIPAL - USUARIOS				FINANCIACIÓN		AVANCE		CONSIDERACIONES	
												RECIBI	TERMINO	USUARIOS	PAGADA	EN TRANSITO	RECIBI	FINANCIADO			
86	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO FARDY ARQUITECTO	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEOS QUADRIENALES (MAYOR) UNIDAD EN CALLE DEL CENTRO HISTÓRICO	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
87	DGCOP-AD-L-3-285-20	25	A.D.	DISEÑO ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	24/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
88	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	26/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
89	DGCOP-IR-L-4-296-20	25	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	13/10/20	19/02/21	6.70 MDP	8,557,340.21	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,557,340.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
90	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	IR	CONSTRUCCIÓN ONES CLIPES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO Y DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN LA CARRERA DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,588,344.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,584,861.79	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
91	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	IR	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	25/10/20	17/04/21	2.56 MDP	1,900,579.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,935,104.18	0.00	100.00%	75.49%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
92	DGCOP-IR-L-1-296-20	11	IR	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO	15/10/20	31/12/20	*	6,284,722.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,281,367.99	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
93	DGCOP-IR-L-1-297-20	25	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ONES	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	01/10/20	26/01/21	11.80 MDP	11,493,959.60	0.00	AMORTIZADO	N/A	01/10/20	28/02/21	2,816,019.88	12,709,270.15	0.00	100.00%	80.44%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
94	DGCOP-IR-L-4-288-20	25	IR	ALURE SELENE ESPINOSA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	08/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,620,438.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	9,620,438.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
95	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	IR	GRUPO QUIRYA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO Y DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN LA CARRERA DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL	08/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
96	DGCOP-IR-L-3-303-20	25	IR	RAJASO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	09/10/20	17/12/20	2.00 MDP	830,633.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	830,633.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
97	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	IR	AM CEMT S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	25.00%	25.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA		
98	DGCOP-IR-L-4-304-20	15	L.P.N.	LURCON S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO Y DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN LA CARRERA DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	22,379,533.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
99	DGCOP-AD-L-3-305-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO Y DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN	23/09/20	21/10/20	1.86 MDP	1,952,433.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,952,433.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
100	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	QUEEN COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEOS QUADRIENALES (MAYOR) UNIDAD EN CALLE DEL CENTRO HISTÓRICO	21/10/20	18/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
101	DGCOP-IR-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIÓN ONES DELTA	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	29/10/20	25/02/21	*	13,985,398.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	11,434,482.94	0.00	73.00%	35.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA		
102	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.D.	SLADCO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	22/10/20	18/02/21	7.10 MDP	10,808,476.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	22/10/20	19/03/21	2,590,076.73	13,156,729.85	0.00	100.00%	99.62%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
103	DGCOP-AD-L-3-320-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA A JAVIER	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEOS QUADRIENALES (MAYOR) UNIDAD EN CALLE DEL CENTRO HISTÓRICO	22/10/20	20/11/20	*	888,800.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	888,800.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
104	DGCOP-IR-L-1-322-20	25	IR	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	30/10/20	26/02/21	10.37 MDP	12,922,220.49	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,067,944.92	15,266,820.52	0.00	100.00%	97.62%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
105	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	IR	MAGDEX S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO Y DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN LA CARRERA DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL	30/10/20	29/12/20	8.20 MDP	7,185,796.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,133,756.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
106	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.D.	FERRANDEA CAÑALES ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ONES	PROYECTO RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEOS QUADRIENALES (MAYOR) UNIDAD EN CALLE DEL CENTRO HISTÓRICO	29/10/20	18/11/20	0.57 MDP	557,304.30	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	557,304.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
107	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.D.	FERRANDEA CAÑALES ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ONES	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD PLANEOS PLANEOS PLANEOS PLANEOS	27/10/20	17/02/21	8.19 MDP	11,285,346.26	0.00	AMORTIZADO	N/A	27/10/20	18/03/21	2,784,910.32	7,998,414.70	0.00	100.00%	50.45%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

1. 00000084

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

* Si esta localización le informaciones correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL DE ESTIMACIONES		RANGE GENERAL AL PERIODO	
PAGOS	EN MIL DOL.	PERIODO	RANGE
573,575,118.79	905,436.42	01.00%	89.73%

ING. CARLOS CUAUTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TC



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
TOTAL	15	0	0	0	15	0	15	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO-ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

00000086

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE CREDITO Y SERVICIO
ASISTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD
 CONVENIO PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS
 ENTRE LA SECRETARIA DE CREDITO Y SERVICIO ASISTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD Y LA SECRETARIA DE CREDITO Y SERVICIO ASISTENCIAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA (CASA PUEBLA EJERCICIO 2020)
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2020

[illegible]

Nota: Para efectos del presente informe, los avances de conceptos multianuales se consideran con el 100% de puntos Puntos a Puntos.

2016 2015	2016, 2015 2014	2016, 2015, 2014	2016, 2015, 2014
161,394,211.01	6,181,985.01	ASSETS	0.0
		LIABILITIES	0.0
		Equity	0.0
		Equity	0.0

Product	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019
2019-01-01	0.00	100%	100%	100%

Setor de Trabalho Departamental de Normatização e Comunicação

INGENIERO EN CIVIL
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y

9.000000087



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	16	0	1	18	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	24	0	0	0	24	0	24	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	95	0	14	0	81	0	81	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	1	2	0	11	0	11	0
TOTAL	134	17	16	1	134	0	135	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 19 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021, 16 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; 18 ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTA RECEPCIONADO Y 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	16	0	1	18	0	19	0
TOTAL	3	16	0	1	18	0	19	0

NOTA: DE LOS 19 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 16 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,
18 ESTÁN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO.
1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE.
SÓLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

4.00000090

Change of TS on stretching in 100°C

+ 003.0091

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de diciembre de 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJECUCIÓN 2021	EJECUCIÓN	CANTIDAD POR EJECUCIÓN - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DOCCP-04-F-1-MT-20	FONDOS DE CAPITALIZADO	04	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOPE, S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición del Teatro Alfa Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte San Hipólito, Colonia Polanco, Ciudad de México, C.P. 11900, Estado Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	7	\$2,190,208.47	\$2,190,208.47	00.00	ANTICIPO		\$0.00					Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos. Debido a la entrega tardía del pago del anticipo (del 30 de la CDPMS), fecha del pago del anticipo, a fines 2021.
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$1,281,219.48	\$0.00	100.00%	25.17%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					
11	DOCCP-04-F-1-MT-20	FONDOS DE CAPITALIZADO	04	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOPE, S.A. DE C.V.	Trabajo Preliminar para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición de la Pórtica, Obra de la Junta del Museo del Casco del Centro de Historia ubicada en San Miguel Chapultepec 14, Sección Miguel Hidalgo, 11900 Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	7	\$2,432,729.19	\$2,432,729.19	00.00	ANTICIPO		\$0.00					Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos. Debido a la entrega tardía del pago del anticipo (del 30 de la CDPMS), fecha del pago del anticipo, a fines 2021.
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$2,382,386.61	\$0.00	100.00%	65.68%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					
12	DOCCP-04-F-1-MT-20	FONDOS DE CAPITALIZADO	04	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOPE, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición de la Plaza del Centro, ubicada en la zona de los edificios del Museo Nacional de Historia, ubicada en la Pórtica del Centro de Historia, ubicada en San Miguel Chapultepec 14, Sección Miguel Hidalgo, 11900 Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	7	\$5,761,179.38	\$5,761,179.38	00.00	ANTICIPO		\$0.00					Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos. Debido a la entrega tardía del pago del anticipo (del 30 de la CDPMS), fecha del pago del anticipo, a fines 2021.
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$4,980,330.71	\$0.00	100.00%	85.93%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					
13	DOCCP-04-F-1-MT-20	FONDOS DE CAPITALIZADO	04	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOPE, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición de la Plaza del Centro, ubicada en la zona de los edificios del Museo Nacional de Historia, ubicada en la Pórtica del Centro de Historia, ubicada en San Miguel Chapultepec 14, Sección Miguel Hidalgo, 11900 Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	7	\$24,012,388.00	\$24,012,388.00	00.00	ANTICIPO		\$0.00					Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos. Debido a la entrega tardía del pago del anticipo (del 30 de la CDPMS), fecha del pago del anticipo, a fines 2021.
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$24,008,911.38	\$0.00	100.00%	65.68%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					
14	DOCCP-04-F-1-MT-20	FONDOS DE CAPITALIZADO	04	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOPE, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición de la Plaza del Centro, ubicada en la zona de los edificios del Museo Nacional de Historia, ubicada en la Pórtica del Centro de Historia, ubicada en San Miguel Chapultepec 14, Sección Miguel Hidalgo, 11900 Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	7	\$12,174,088.27	\$12,174,088.27	00.00	ANTICIPO		\$0.00					Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos. Debido a la entrega tardía del pago del anticipo (del 30 de la CDPMS), fecha del pago del anticipo, a fines 2021.
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$12,162,331.48	\$0.00	100.00%	65.40%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					
15	DOCCP-04-F-1-MT-20	FONDOS DE CAPITALIZADO	04	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOPE, S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición del Teatro Guadalupe Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte San Hipólito, Colonia Polanco, Ciudad de México, C.P. 11900, Estado Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	7	\$2,388,204.86	\$2,388,204.86	00.00	ANTICIPO		\$0.00					Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos. Debido a la entrega tardía del pago del anticipo (del 30 de la CDPMS), fecha del pago del anticipo, a fines 2021.
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$1,991,879.12	\$0.00	100.00%	35.66%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					
16	DOCCP-04-F-1-MT-20	FONDOS DE CAPITALIZADO	04	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOPE, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición del Museo Nacional de Historia, ubicada en la Pórtica del Centro de Historia, ubicada en San Miguel Chapultepec 14, Sección Miguel Hidalgo, 11900 Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	7	\$19,881,316.81	\$19,881,316.81	00.00	ANTICIPO		\$0.00					Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos. Debido a la entrega tardía del pago del anticipo (del 30 de la CDPMS), fecha del pago del anticipo, a fines 2021.
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$19,867,346.81	\$0.00	100.00%	65.34%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					
17	DOCCP-04-F-1-MT-20	FONDOS DE CAPITALIZADO	04	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOPE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Apoyo Técnico, Rehabilitación, Renovación y Adquisición de los Años del Teatro Guadalupe Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte San Hipólito, Colonia Polanco, Ciudad de México, C.P. 11900, Estado Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	7	\$1,198,701.12	\$1,198,701.12	00.00	ANTICIPO		\$0.00					Trabajos concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de los trabajos. Debido a la entrega tardía del pago del anticipo (del 30 de la CDPMS), fecha del pago del anticipo, a fines 2021.
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$1,147,279.51	\$0.00	100.00%	55.61%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$1,147,279.51	\$0.00	100.00%	55.61%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					
18	DOCCP-04-F-1-MT-20	FONDOS DE CAPITALIZADO	04	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOPE, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios de Obra e Infraestructura del Museo Cultural Teatro Guadalupe Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte San Hipólito, Colonia Polanco, Ciudad de México, C.P. 11900, Estado Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	7	\$20,880.42	\$20,880.42	00.00	ANTICIPO		\$0.00					Trabajos concluidos.
											00.00	AMORTIZADO		\$0.00	\$20,880.42	\$0.00	100.00%	55.61%	
											00.00	FOR AMORTIZADO		\$0.00					

4-25

00000092

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Cuote al 31 de diciembre de 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANEXOS		LÍNEAS DE IMPORTE MONTOS			ESTIMACIÓN		PAGOS		COMPRONETOS
						INICIO	TERMINO							PREV.	CONTRAT.	ACTUAL	PAGOS	EN TRÁMITE	PAGOS	FINANCIERO	
18	0000140-7-1-180-21	2	ORDINARIO	CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO S.A. DE C.V.	Trabajo Complementario de Obra e Infraestructura del Teatro Cultural Tereza Julia Cordero, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte, en Colonia Centro, Primer Cuadrante, S.P. 11860, Alameda Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	18/12/2021	31/12/2021		840,100.21	840,100.21	80.00	ANEXO	80.00	84	84	80.00	840,000.00	80.00	100.00%	80.00%	Trabajo concluido
TOTALES									840,100.21	840,000.00	80.00					80.00	840,000.00	80,000.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECONSTRUCCIÓN DE PROPORCIONAL EN CUANTO SE NECESITA


Ing. Carlos Enrique Mancera Contreras
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL ECONOMIZADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMIZADO	TOTAL DE ANEXOS
100,000,000.00	100,000,000.00	8.00	ANEXO 80.00
			ANEXO 80.00
			ANEXO 80.00

TOTAL DE ECONOMIZADO	TOTAL DE ANEXOS	TOTAL DE ECONOMIZADO	TOTAL DE ANEXOS
100,000,000.00	100,000.00	10.1%	80.00%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

1. 000.0093



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	24	0	0	0	24	0	24	0
TOTAL	24	0	0	0	24	0	24	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO


00000094
11

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de diciembre de 2022

Al 31 de diciembre de 2022																					
MEMORIAL	CONTRATO	E.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	INDICADOR	CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		DESBENTAJACIONES			
C.A.S.	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOF-LPN-L-006-21	01	LPN	Consa Empresarial y Compañía S. de R. L. de C.V.	Refortificación a Base de Placas de acero en traves, columnas y pilotes del Puente Vehicular Novedades Toluca, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México	21-feb-21	31-jun-21	\$ 22,817,775.36	22,817,336.43	0.00	ANTICIPO		0.00					En proceso de Acta Entrega-Recepción			
											AMORTIZADO		0.00	01-ago-21	14-sep-21	4,454,134.65	4,219,773.84	13,943,254.86	100.00	100.00	
											POR AMORTIZAR		0.00								
2	DGCOF-AD-L-0-006-21	01	AD	Celinas del Buzo, S.A. de C.V.	Sapientia externa para los trabajos de Refortificación a Base de Placas de acero en traves, columnas y pilotes del Puente Vehicular Novedades Toluca, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	23-dic-21	29-mar-22	\$ 1,055,103.43	1,025,607.28	0.00	ANTICIPO		0.00	NA	NA	NA	208,103.16	208,103.16	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega-Recepción
											AMORTIZADO		0.00								
											POR AMORTIZAR		0.00								
3	DGCOF-LPN-L-0375-21	00	LPN	Desarrollo sustentable Am. S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cisterna Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el perímetro del proyecto	08-jul-21	31-dic-21	\$ 169,819,871.29	139,000,181.79	0.00	ANTICIPO		48,906,899.69	17-sep-21	13-feb-22	NA					Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total (cuajado de obra por convenio)
											AMORTIZADO		0.00	04-mar-22	26-mar-22		86,971,287.78	0.00	84.12	82.87	
											POR AMORTIZAR		0.00	27-mar-22	31-dic-22						
4	DGCOF-IR-F-0-109-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cisterna Nacional Chapultepec y áreas adyacentes	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,886,214.79	5,811,352.42	0.00	ANTICIPO		0.00	07-sep-22	21-dic-22		5,867,612.90	0.00	88.75	88.75	Convenio de obra
											AMORTIZADO		0.00	27-mar-22	21-dic-22						
											POR AMORTIZAR		0.00								
5	DGCOF-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Marinos Grey, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cisterna Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,388.80	72,705,811.11	0.00	ANTICIPO		21,815,800.33	28-mar-22			85,251,768.58	0.00	85.12	86.75	Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO		0.00	20-abr-22	28-may-22	NA					
											POR AMORTIZAR		0.00								
6	DGCOF-IR-F-0-112-21	02	IR	CAMEC Ingeniería S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso a la Cisterna Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	2,689,989.84	2,689,989.84	0.00	ANTICIPO		0.00	20-sep-21	30-mar-22						Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO		0.00	20-abr-22	28-may-22	NA	2,689,227.78	0.00	91.88	91.88	
											POR AMORTIZAR		0.00								
7	DGCOF-LPN-F-011-21	01	LPN	Jaque Ingenieros Constructora, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chantre en la Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México	20-sep-21	19-dic-22	\$ 82,524,271.84	82,389,363.88	0.00	ANTICIPO		0.00				29,878,432.17	0.00	100.00	92.00	Por liquidar
											AMORTIZADO		0.00	NA	NA	NA					
											POR AMORTIZAR		0.00								
8	DGCOF-IR-L-0-114-21	01	IR	Dizain Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chantre en la Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México	23-sep-21	23-may-22	\$ 2,303,028.86	2,433,188.67	0.00	ANTICIPO		0.00				1,380,000.00	0.00	100.00	88.88	Por liquidar
											AMORTIZADO		0.00	NA	NA	NA					
											POR AMORTIZAR		0.00								
9	DGCOF-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Acados, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del aparcamiento 1 y 2, fase al año diez, salidas y accesos	01-mar-21	18-mar-22	\$ 102,830,000.00	80,314,186.88	0.00	ANTICIPO		27,694,769.57				84,878,878.80	0.00	85.52	58.48	Convenio modificatorio en monto y plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO		0.00	NA	03-jun-22	NA					
											POR AMORTIZAR		0.00								
10	DGCOF-IR-F-0-121-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del aparcamiento 1 y 2, fase al año diez, salidas y accesos	28-mar-21	18-mar-22	\$ 4,043,239.03	4,840,489.87	0.00	ANTICIPO		0.00	21-mar-22							Convenio modificatorio en monto y plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO		0.00	03-jun-22		\$ 905,488.00	3,865,843.48	0.00	76.00	76.00	
											POR AMORTIZAR		0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Al 31 de diciembre de 2021

CANTO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERÍODO-MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	PRÓXIMA	EN TRÁMITE	POR PAGAR	POR PAGAR	
11	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Alonso, S.A. de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de construcción definitiva de tránsito en el carril B14, 05 y 011 a base de concreto hidráulico al Puerto Velasco La Ciénega, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-mar-21	30-mar-21	483,885.12	483,885.12	0.00	ANTICIPO	0.00							En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	483,885.12	0.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							
12	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Ars, S.A. de C.V.	Contribución de carpintería bajo Puente Canal Nacional en Carretera Central de Auto de Periferia Oriente en la Alcaldía Benito Juárez, sobre la base de precios unitarios	01-mar-21	30-mar-21	822,437.21	822,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00							En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	822,437.21	0.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							
13	DGCOP-AD-L-1-144-21	01	AD	Manti Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Trabajo de infraestructura emergente para puente en el carril de la Línea "C" de Metrolife en Tlalver	01-mar-21	30-mar-21	5,117,815.20	5,117,815.20	0.00	ANTICIPO	0.00							En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	5,117,815.20	0.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							
14	DGCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A. de C.V.	Trabajo adicional de las obras emergentes en carriles de acceso peatonal al Metro en Cebal Panadero	01-mar-21	30-mar-21	511,213.79	499,473.39	0.00	ANTICIPO	0.00							En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	499,473.39	0.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							
15	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Trabajo de rehabilitación de puente peatonal sobre el parque ecológico Xochimilco, sistema México para rehabilitación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a nuevas unidades de este predio para su explotación y construcción de cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-mar-21	30-mar-21	1,408,849.77	1,408,849.77	0.00	ANTICIPO	0.00							En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	1,408,849.77	0.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							
16	DGCOP-IF-F-4-173-21	01	IF	MCH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 1 José María Bello, ubicado en Calles Vallejo No. 328 Col. Trinitarios de Norte, C.P. 02830 Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	01-mar-21	31-mar-21	3,148,815.90	3,007,846.79	0.00	ANTICIPO	0.00							Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	3,007,846.79	0.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							
17	DGCOP-IF-F-4-174-21	01	IF	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Av. General Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Ochoa, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Alemán, s.p. 11850, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	01-mar-21	31-mar-21	3,119,812.06	3,081,965.66	0.00	ANTICIPO	0.00							Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	3,081,965.66	0.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							
18	DGCOP-IF-F-4-174-21	01	IF	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 24 León Guzmán, ubicado en Calle Ernesto P. Urucho No. 83 Col. Olvera del Centro C.P. 01430, Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	01-mar-21	31-mar-21	4,387,870.00	4,454,410.84	0.00	ANTICIPO	0.00							Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	4,454,410.84	0.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							
19	DGCOP-IF-F-4-175-21	01	IF	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 4 Ignacio Ramírez, ubicado en Av. Río Colorado s. 3674, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 06010 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	01-mar-21	31-mar-21	3,119,812.06	3,052,961.35	0.00	ANTICIPO	0.00							Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	3,052,961.35	0.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							
20	DGCOP-IF-F-4-177-21	01	IF	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 2 General Ignacio Zaragoza, ubicado en Calle 83 SN Exq. Calles Ignacio Zaragoza, Col. Puente C.P. 10020 Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	01-mar-21	31-mar-21	2,745,258.60	4,118,968.86	0.00	ANTICIPO	0.00							Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	4,118,968.86	100.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00							

00000096

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO POR	CONVERSIÓN PERIODO-MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE N		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					NETO	TERMINO	NETO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
21	DGCOP-B-F-4-179-21	01	IR	Sustia, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrego y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No. 10 Santa Degrada, ubicado en Av. Centenario No. 2289, Col. Ampliación Santa Hermenegilda, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,118,812.27	3,881,385.98	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,871,713.90	0.00	100.00	99.90	Por Físico
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-B-F-4-188-21	01	IR	Grupo FARE del Centro, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrego y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No. 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calles Miguel Lerdo de Tejada N.107, Col. La Provenza, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,133,458.28	3,138,745.90	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,138,745.28	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-B-F-4-187-22	01	IR	Grupo Quirón, S.A. de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cari Alamos", ubicado en Av. Canal Nacional 584, Col. Villa Guadalupe entre Alameda Cuernavaca Centro Calzón del Huero y Calzón de las Bómbas) C.P. 04860, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,011.28	3,198,360.60	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,198,360.60	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-B-F-4-188-21	01	IR	ASCH, S.A. de C.V.	Trabajo de Rehabilitación del Centro de Asistencia e Integración Social Cerebros Jóvenes Primera Etapa, precio unitario y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 16,523,805.11	10,884,111.34	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	10,884,111.34	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
8,477,845,819.79	949	ANTICIPO 38,405,182.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	AVANCE GENERAL AL PERIODO	FINANCIERO
16,812,964.52	16,812,964.52	54.90 93.33

Ing. Rolando Hernández Fernández Balancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Peñero Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio Díaz Melero Calderín
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	95	0	14	0	81	0	81	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DECONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	ALÍNEA CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN FIN	PRESUPUESTO SUB. INVENTARIO	VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONTRATO PERIODO INICIO	CONTRATO PERIODO FIN	VALOR PAGADO	EFECTUADO EN MONTO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	CONSIDERACIONES	
1	DGCOP-AD-L-3-015-21	15	A.D.	PROYECTOR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALIDA, RESERVA ETAPA, UNICIÓN EN LA AUTOMATIZACIÓN MULTIMEDIA DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL MUSEO, DESARROLLAR "GRUPO MULTIMEDIA" Y "P. INVENCIÓN	15-mar-21	11-ago-21	1.44 MDP	1,448,413.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	15-mar-21	21-oct-21	105,022.92	1,551,435.96	0.20	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	LP.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PLANTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INMIGRACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LABORES (PLANEAS) "PLANEAS SANTA MARTHA" UNICIÓN EN CALLE MARCOS EN MEDIO EN ESCUELA CALLE PEDRO MARQUEZ SANTA, ESCUELA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,758,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	LP.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PLANTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INMIGRACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LABORES (PLANEAS) "PLANEAS SANTA MARTHA" UNICIÓN EN CALLE MARCOS EN MEDIO EN ESCUELA CALLE PEDRO MARQUEZ SANTA, ESCUELA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,700,526.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,103,886.28	0.00	37.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DGCOP-S-L-1-013-21	25	I.R.	CARDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANEJO DE RECONSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, TRABAJO "GRUPO L.P. COMPROBACIÓN POR LAS EXISTENTES OBRAS" Y "LUNA TRAMODOTTY" UNICIÓN EN AZ. REV. RECONSTRUCCIÓN, SIN CEN. PRODU. COLOMBIA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,109,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,452,804.28	0.00	100.00%	34.55%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	LP.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MAS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PLANTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INMIGRACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LABORES (PLANEAS) "PLANEAS SANTA MARTHA" UNICIÓN EN CALLE MARCOS EN MEDIO EN ESCUELA CALLE PEDRO MARQUEZ SANTA, ESCUELA SANTA MARTHA	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,578,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,333,294.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	LP.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PLANTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INMIGRACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LABORES (PLANEAS) "PLANEAS SANTA MARTHA" UNICIÓN EN CALLE MARCOS EN MEDIO EN ESCUELA CALLE PEDRO MARQUEZ SANTA, ESCUELA SANTA MARTHA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,990,796.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	455,857.03	0.00	10.02%	8.85%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
7	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	LP.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDANO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PLANTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INMIGRACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LABORES (PLANEAS) "PLANEAS SANTA MARTHA" UNICIÓN EN CALLE MARCOS EN MEDIO EN ESCUELA CALLE PEDRO MARQUEZ SANTA, ESCUELA SANTA MARTHA	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,235,182.49	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	LP.N.	CBM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PLANTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INMIGRACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LABORES (PLANEAS) "PLANEAS SANTA MARTHA" UNICIÓN EN CALLE MARCOS EN MEDIO EN ESCUELA CALLE PEDRO MARQUEZ SANTA, ESCUELA SANTA MARTHA	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,032,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
9	DGCOP-LPN-L-4-021-21	25	LP.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PLANTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INMIGRACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LABORES (PLANEAS) "PLANEAS SANTA MARTHA" UNICIÓN EN CALLE MARCOS EN MEDIO EN ESCUELA CALLE PEDRO MARQUEZ SANTA, ESCUELA SANTA MARTHA	24/03/21	27/07/21	5.60 MDP	5,798,078.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,798,078.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-1-023-21	25	LP.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PLANTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INMIGRACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LABORES (PLANEAS) "PLANEAS SANTA MARTHA" UNICIÓN EN CALLE MARCOS EN MEDIO EN ESCUELA CALLE PEDRO MARQUEZ SANTA, ESCUELA SANTA MARTHA	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,448.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	30-mar-21	15-oct-21	18,881,496.64	0.00	100.00%	65.02%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-023-21	25	LP.N.	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PLANTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INMIGRACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y LABORES (PLANEAS) "PLANEAS SANTA MARTHA" UNICIÓN EN CALLE MARCOS EN MEDIO EN ESCUELA CALLE PEDRO MARQUEZ SANTA, ESCUELA SANTA MARTHA	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	9,531,090.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	9,272,006.63	0.00	100.00%	87.28%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

00000099



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO VIG. INICIAL	GASTO CUMPLADO	EJECUCIÓN	ANTICIPO		COMPRAS PERIODO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIAL	TERMINO	INICIAL	TERMINO	INICIAL	TERMINO	FINANCIERO	FÍSICO		
12	DGCOP-LPN-4-024-21	25	LPN	GRUPO GUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: PLAZA DEL MERCADO, MERCADO EN CALLE DEL MERCADO DE COLONIA SANTA LUCÍA, ALICIA ALVARO ORTEGA, JARDÍN DE NIÑOS EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,204.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DGCOP-LPN-1-025-21	28	LPN	CONSTRUCTO RAE INMOBILIARIA NOROCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: PLAZA DEL MERCADO, MERCADO EN CALLE DEL MERCADO DE COLONIA SANTA LUCÍA, ALICIA ALVARO ORTEGA, JARDÍN DE NIÑOS EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	6,622,532.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
14	DGCOP-AD-5-026-21	25	AD	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, MONITOREO Y DE VERIFICACIÓN DE COSTOS PARA LA OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD	30/03/21	01/09/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-LPN-4-027-21	25	LPN	RECRED DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: PLAZA DEL MERCADO, MERCADO EN CALLE DEL MERCADO DE COLONIA SANTA LUCÍA, ALICIA ALVARO ORTEGA, JARDÍN DE NIÑOS EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	06/04/21	23/08/21	4.70 MDP	4,468,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-IR-5-029-21	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MONITOREO	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS VITUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	929,063.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	94.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-1-029-21	15	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTO RAE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: PLAZA DEL MERCADO, MERCADO EN CALLE DEL MERCADO DE COLONIA SANTA LUCÍA, ALICIA ALVARO ORTEGA, JARDÍN DE NIÑOS EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	13/04/21	10/08/21	24.6 MDP	24,367,334.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	13/04/21	09/09/21	1,857,183.87	26,226,387.32	0.00	100.00%	99.67%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-LPN-1-030-21	25	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: PLAZA DEL MERCADO, MERCADO EN CALLE DEL MERCADO DE COLONIA SANTA LUCÍA, ALICIA ALVARO ORTEGA, JARDÍN DE NIÑOS EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	14/04/21	14/10/21	13.18 MDP	11,897,985.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,281,152.76	0.00	100.00%	96.44%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-IR-5-033-21	25	IR	BYBO, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS VITUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	985,148.75	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	55.06%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-LPN-4-033-21	25	LPN	JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: PLAZA DEL MERCADO, MERCADO EN CALLE DEL MERCADO DE COLONIA SANTA LUCÍA, ALICIA ALVARO ORTEGA, JARDÍN DE NIÑOS EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,897,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,897,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-LPN-4-035-21	25	LPN	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: PLAZA DEL MERCADO, MERCADO EN CALLE DEL MERCADO DE COLONIA SANTA LUCÍA, ALICIA ALVARO ORTEGA, JARDÍN DE NIÑOS EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	13/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,188,993.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	1.00%	1.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
22	DGCOP-AD-3-033-21	25	AD	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: PLAZA DEL MERCADO, MERCADO EN CALLE DEL MERCADO DE COLONIA SANTA LUCÍA, ALICIA ALVARO ORTEGA, JARDÍN DE NIÑOS EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	23/04/21	01/09/21	0.42 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-LPN-4-046-21	25	LPN	GRUPO QUIVAX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: PLAZA DEL MERCADO, MERCADO EN CALLE DEL MERCADO DE COLONIA SANTA LUCÍA, ALICIA ALVARO ORTEGA, JARDÍN DE NIÑOS EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	27/04/21	24/09/21	4.50 MDP	4,795,584.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,795,584.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PERÍODO DE EJECUCIÓN MES	PERÍODO DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO CON ESTIMACIÓN	VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONTRIBUCIÓN PERICIAL / FOLIO			EJECUCIÓN		FINANCIAMIENTO		OBSERVACIONES
												ACTA	TERMINO	VALOR	ACTUAL	EN MARTE	PREVIO	FINANCIADO	
24	DGCOP-LPN-L-041-21	25	LPN	GRUPO CUNSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	27/04/21	24/08/21	6.20 MDP	6,237,832.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,237,832.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-LPN-L-042-21	25	LPN	LAD ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-043-21	25	LPN	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	28/04/21	25/08/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,933.38	0.00	0.00%	4.88%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
27	DGCOP-IR-L-048-21	25	LPN	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	05/05/21	31/10/21	1.88 MDP	1,488,888.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	807,503.70	0.00	100.00%	88.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURTA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	IR	MADDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANUTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,759.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,642,978.84	0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	IR	ING. JOSÉ ANGELO HERREJÓN CHAVEZ	TRABAJO DE MANUTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,824,878.24	0.00	100.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	LPN	AD OPLUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	13/06/21	09/10/21	15.5 MDP	14,896,901.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
32	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	13/06/21	09/10/21	16.8 MDP	15,598,989.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
33	DGCOP-LPN-L-1-056-21	15	LPN	KAPPA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MANUTENCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	26/05/21	23/08/21	20.5 MDP	19,443,380.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	18,725,732.34	0.00	96.02%	96.02%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
34	DGCOP-AD-L-3-058-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	01/06/21	20/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DTARSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE PUENTES Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANUTENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLANEACIÓN, PLANEACIÓN, PLANEACIÓN) UNICION EN CALLE CHILANGA EN ENTRE LAS CALLES TENDRA Y ABAJOS, COLONIA MOLINO, ALCALDIA, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,870,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

00000101

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORD.	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MEDICIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN CONTRATOS	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS UNITARIOS	VOLUMEN CONTRACTADO	ECONOMÍA	INDICADOR		CONDICIONES PRECISO, MONTO			ENTREGAS		RENTAS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	ANTICIPO	RENTAS	MONTO	RENTAS	EN MONTE	PRECIO	PAROCIALES	
36	DGCOP-AD-L-2-085-21	25	A.D.	GRUPO FAZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ANCHURA LIBERTAD, ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURES VALORES SALVADOR CRUZ BORDO Y PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON SAN JUAN DE ARAGON	18/06/21	07/07/21	1.20 MDP	1,388,541.35	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,388,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCOP-AD-L-5-088-21	25	A.D.	INGENERIA MAS ARQUITECTURA A.S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAHUATIMON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON SAN JUAN DE ARAGON	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-AD-L-2-089-21	25	A.D.	GRUPO QUIWA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ANCHURA LIBERTAD, ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURES VALORES SALVADOR CRUZ BORDO Y PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON SAN JUAN DE ARAGON	30/06/21	16/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-LPN-L-1-673-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAGON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON	21/07/21	28/08/21	17.6 MDP	16,750,782.71	0.00	ANTICIPO	N/A	01/07/21	25/10/21	1,485,508.54	17,657,095.28	0.00	100.00%	95.86%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAHUATIMON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON SAN JUAN DE ARAGON	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	885,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL	
41	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO FLAME S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAGON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	917,000.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DGCOP-R-L-4-076-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAGON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON	06/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,276,307.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,276,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOP-R-L-4-080-21	25	I.R.	MAGDEX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAGON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON	09/07/21	05/11/21	6.8 MDP	6,513,968.65	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,513,968.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOP-R-L-4-081-21	25	I.R.	LAPIZ VERDE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAGON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,988,816.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	3.00%	2.52%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA	
45	DGCOP-R-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANIFICACION ESTRATEGICA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAGON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON	12/07/21	08/11/21	9 MDP	6,217,172.48	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
46	DGCOP-AD-L-3-083-21	15	A.D.	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRERA PUBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAHUATIMON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON SAN JUAN DE ARAGON	13/07/21	08/11/21	0.82 MDP	816,791.05	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	816,791.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
47	DGCOP-AD-L-3-084-21	25	A.D.	MAGDEX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAGON, UBICADA EN CALLE ORIENTE 1948, SAN JUAN DE ARAGON	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.T.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	COSTO ESTIMADO	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO		CÓMPUTO PERÍODO - MONEDA			EJECUCIÓN		AVANCE F		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	APRO	MONED	MOED	PROGSA	EN TRÁMITE	PROGSA	EN TRÁMITE	
48	DGCOP-RL-3-085-21	25	LR	IGNITIA DESARROLLO S. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES PLURALE" UNIDAD EN CAMINO REAL A TOLUCA, CDMX, COLUMBIA, BOGOTÁ Y SECCION ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	18/07/21	18/10/21	2.4 MDP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-AD-3-085-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES PLURALE" UNIDAD EN CAMINO REAL A TOLUCA, CDMX, COLUMBIA, BOGOTÁ Y SECCION ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	20/07/21	20/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-RL-4-087-21	25	LR	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES PLURALE" UNIDAD EN CAMINO REAL A TOLUCA, CDMX, COLUMBIA, BOGOTÁ Y SECCION ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	18/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	100.00%	96.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-3-088-21	15	A.D.	GRUPO ALM INSTALACIONES S. DE RL DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE ALUMENADO Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MEXICO, SAN ESTEBAN, UBICADA EN LAS	22/07/21	20/08/21	0.92 MDP	808,995.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	808,995.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-3-091-21	15	A.D.	RVA PRODUCTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PASADIZO PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MEXICO, SAN ESTEBAN, UBICADA EN LAS	04/08/21	02/09/21	1.44 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-RL-1-101-21	15	LR	CARDEM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN PARA EL SERVICIO 2 DE LA UNIVERSIDAD DEL CAMINO, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO 140 AVENIDA PUERTO RICO 200, COLUMBIA, SAN JERÓNIMO, BOGOTÁ, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y	24/08/21	22/10/21	2.9 MDP	2,986,958.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,986,721.20	0.00	100.00%	99.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-3-104-21	25	A.D.	RVA PRODUCTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO PARA PLURES CAMINOS, UBICADOS EN FRACCIONES DEL TERRITORIO CAMINO REAL, SAN ESTEBAN, CAMINO REAL Y CALLE CALA, COLUMBIA, CAMPESTRE, PERDIDO, ALCALDIA ESTANISLAO, CIUDAD DE MEXICO, EN	27/08/21	25/09/21	0.29 MDP	299,912.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	299,912.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-3-107-21	25	A.D.	SURYA T793 S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES PLURALE" UNIDAD EN CAMINO REAL A TOLUCA, CDMX, COLUMBIA, BOGOTÁ Y SECCION ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	03/08/21	22/09/21	1.61 MDP	1,416,896.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,416,896.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-3-108-21	25	A.D.	SURYA T793 S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES PLURALE" UNIDAD EN CAMINO REAL A TOLUCA, CDMX, COLUMBIA, BOGOTÁ Y SECCION ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	03/08/21	22/09/21	0.75 MDP	796,206.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	796,206.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-RL-4-115-21	25	LR	CORPORACION CONSTRUCTO RA AVE FENIX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO MAIOR Y/O MENOR DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES PLURALE" UNIDAD EN CAMINO REAL A TOLUCA, CDMX, COLUMBIA, BOGOTÁ Y SECCION ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	08/10/21	31/12/21	9.75 MDP	8,768,370.61	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.68	0.00	25.00%	22.28%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
58	DGCOP-RL-4-119-21	25	LR	DESARROLLO CONSTRUCCION E INSTALACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES PLURALE" UNIDAD EN CAMINO REAL A TOLUCA, CDMX, COLUMBIA, BOGOTÁ Y SECCION ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,583.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,583.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-RL-4-125-21	25	LR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES PLURALE" UNIDAD EN CAMINO REAL A TOLUCA, CDMX, COLUMBIA, BOGOTÁ Y SECCION ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	5.8 MDP	7,617,774.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	647,930.97	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	PP	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	PRESUPUESTO CON MODIFICACION	MONTOS CONTRATADOS	ESTIMADO	AUTOPOR		EJECUCIÓN PERIÓDICA - FÍSICO			ESTIMACIÓN		PUNTO B		OBSERVACIONES
											ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	VALOR	PAGADO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
60	DGCOP-IR-L-4-121-21	25	IR	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	6.5 MDP	6,070,788.23	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,070,788.19	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-IR-L-4-122-21	25	IR	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,135.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	110,174.85	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
62	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	IR	CONAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,804,386.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,804,460.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-IR-L-4-125-21	25	IR	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	14/10/21	31/12/21	2.5 MDP	2,298,305.33	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,298,304.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-IR-L-1-127-21	25	IR	CONSTRUCTO RA DOLCE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	18/10/21	31/12/21	4.5 MDP	5,103,997.64	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,758,939.97	0.00	100.00%	93.29%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-AD-L-2-135-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	23/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-1-132-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	20/11/21	0.98 MDP	910,770.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	359,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ALICATORIA ELÉCTRICA, SISTEMAS EN MEDIO RÚRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	14/11/21	0.28 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAME, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ALICATORIA ELÉCTRICA, SISTEMAS EN MEDIO RÚRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	20/11/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-AD-L-3-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO R MACRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ALICATORIA ELÉCTRICA, SISTEMAS EN MEDIO RÚRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	20/11/21	0.25 MDP	269,329.81	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	269,329.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-AD-L-5-158-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ALICATORIA ELÉCTRICA, SISTEMAS EN MEDIO RÚRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	20/11/21	1.44 MDP	1,444,506.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,506.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-AD-L-5-163-21	15	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ALICATORIA ELÉCTRICA, SISTEMAS EN MEDIO RÚRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JOSE MARCO, UNIDAD EN CALLE COMERCIO N° 11 COLONIA SANTA CRUZ SOCHOTEC, ALCALDÍA XICOMILCO, DISTRITO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	14/11/21	0.86 MDP	940,882.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	940,882.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	PERÍODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE CON MODIFICACIONES	ESTIMADO	ANTICIPO		CÓMPUTO PERÍODO MUESTRA			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
						Inicio	Termino			Anticipo	Amortizado	ImpORTE	Termino	MonTO	ImpORTE	En Trámite	ImpORTE	Financiado		
72	DGCOP-AD-L-1-184-21	25	A.D.	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	30/12/21	31/12/21	*	1,422,644.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,271,341.03	0.00	100.00%	88.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
73	DGCOP-AD-L-1-185-21	15	A.D.	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO EN EL AREA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO, UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	01/11/21	30/11/21	0.93 MDP	838,070.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	518,183.11	0.00	100.00%	81.46%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
74	DGCOP-AD-L-1-186-21	15	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLER, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	963,663.99	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
75	DGCOP-AD-L-1-188-21	25	A.D.	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	30/12/21	31/12/21	*	1,412,342.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,255,898.88	0.00	100.00%	88.92%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
76	DGCOP-AD-L-2-176-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LÓPEZ MUÑOZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	01/11/21	30/11/21	0.247 MDP	216,269.07	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	216,269.07	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
77	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	08/12/21	27/12/21	0.94 MDP	841,906.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	841,906.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
78	DGCOP-AD-L-2-184-21	25	A.D.	CONSULTORES SE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	30/11/21	30/11/21	1.30 MDP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
79	DGCOP-AD-L-2-194-21	25	A.D.	SURYA T700, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	27/12/21	31/12/21	*	1,428,763.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,428,763.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
80	DGCOP-AD-L-2-185-21	25	A.D.	LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	27/12/21	31/12/21	*	1,431,145.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,431,145.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
81	DGCOP-AD-L-2-196-21	25	A.D.	SURYA T700, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,430,863.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
82	DGCOP-AD-L-2-197-21	25	A.D.	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	27/12/21	31/12/21	*	1,437,462.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,437,462.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									
83	DGCOP-AD-L-2-188-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS PLAZAS PLAZAS DE CALLES UNIDAD UNIDAD EN AREA INTERIOR, PROTECTORA, BARRA DE CALLES, EDUCACIÓN, ASOCIACIÓN, ALICIA	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.80	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTI	N/A									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	F.P.	SEGURIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS CON MODIFICACIONES	GASTOS CONTRATADOS	EJECUCIÓN	ANTICIPO		COMPRONETOS PERIÓDICOS			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE				
54	DGCOP-AD-L-2-189-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS MARCELO RUFINO, A PRECIO FIJO, A TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	27/12/21	31/12/21	*	1,386,075.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,386,075.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
55	DGCOP-AD-L-2-205-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DEPORTIVAS PLAZAS SAN JUAN, SAN JUAN, UNIDAD EN CALLE FRANCISCO RUIZ, SAN JUAN, SAN JUAN, TEPIC, ALCALDÍA	27/12/21	31/12/21	*	576,530.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	576,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
56	DGCOP-AD-L-1-291-21	25	A.D.	IGNITIA DESARROLLO S. DE C.V.	TRABAJO DE REESTRUCTURACIÓN DE PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS, UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,434,588.68	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
57	DGCOP-AD-L-1-303-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS, CONCEPTO INFRAESTRUCTURA UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
58	DGCOP-AD-L-1-303-21	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL RAO, S. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS, INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	30/12/21	31/12/21	*	887,245.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	887,245.31	0.00	100.00%	86.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
59	DGCOP-AD-L-1-304-21	25	A.D.	JOSE ANGEL HERREJON CHAVEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA REPARACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS, UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	30/12/21	31/12/21	*	887,578.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	887,578.55	0.00	100.00%	84.08%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
60	DGCOP-AD-L-1-305-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDADO	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE PASADIZO EN EL PUENTE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS, UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,434,588.68	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
61	DGCOP-AD-L-1-306-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS, UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	30/12/21	31/12/21	*	574,172.33	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	574,172.33	0.00	100.00%	74.51%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
62	DGCOP-AD-L-4-201-21	25	I.R.	MOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ON, S. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ASISTENCIA, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS, UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	30/12/21	28/04/22	*	4,498,935.88	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	28/04/22	N/A	4,498,935.88	0.00	100.00%	37.33%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-1-298-21	25	I.R.	MOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ON, S. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS, UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	30/12/21	28/04/22	*	4,060,295.16	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	28/04/22	N/A	4,060,295.16	0.00	100.00%	88.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-4-209-21	25	I.R.	JOSE ANGEL HERREJON CHAVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE PASADIZO, LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS, UNIDAD EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE RETURNA ME. 12, LT 184	30/12/21	28/04/22	*	5,362,545.21	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	28/04/22	N/A	5,362,545.21	0.00	100.00%	43.28%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, AUTORA, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

[illegible]

* Si se está localizando la información correspondiente a este cargo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL COSTS (in \$ mil.)	TOTAL DE COSTS (in \$ mil.)	TOTAL DE COSTS (in \$ mil.)	
888,188,460.89	8.00	AMOUNTS	8.00
		AMOUNTS	8.00
		AMOUNTS	8.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJE RELATIVO AL PERIODO	
PASADAS	EN TRÁMITE	PERIODO	PERCENTAJE
354,127,466.52	0.00	87.18%	79.87%

ARG. CARLOS CLAUTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "CI"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

A. 009 0107



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	1	2	0	11	0	11	0
TOTAL	12	1	2	0	11	0	11	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

A. 00000108

INFORME DE AVANCE TRABAJO FINANCIERO PARA CADA PÚBLICA ECONÓMICA 2002
FOLIO DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

TO THE COMMON FUND	TO THE SPECIAL FUND	TOTAL \$2,400,000.00	
\$12,000,000.00	\$,000,000.00	REVENUE	0.0
		EXPENSES	0.0
		FOR AMOUNT	0.0

TOTAL 22-23 REVENUE		PERCENT OF 2022-23 REVENUE	
REVENUE	22-23 REVENUE	PERCENT	PERCENT
50,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%

[†] See also [www.elsevier.com/locate/bscbs](#) for a complete list of articles in this special issue.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE INVESTIGAȚII ȘTIINȚIFICE
Județul Iași, Municipiul Iași, Strada Ștefan cel Mare, Nr. 10

EDUARDO ALVARO MANTUA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS T

1. 00000109



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

8.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2022

FECHA DE REGISTRO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	35	0	0	7	28	23	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	67	1	0	0	68	0	68	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	55	4	0	0	59	0	59	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	49	0	1	0	48	0	48	0
TOTAL	206	5	1	7	203	23	187	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 35 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 30 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 5 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2022 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D": SE CELEBRO CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, AL CONTRATO DGCOP-IR-L-1-012-22 EN EL QUE SE REDUJO EL IMPORTE CONTRATADO QUEDANDO EN \$9'491,711.30. EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-029-22 NO CONTABILIZA PARA EFECTOS DEL PRESENTE REPORTE POR SU TERMINACIÓN ANTICIPADA.

1.000.0111



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	35	0	0	7	28	23	12	0
TOTAL	35	0	0	7	28	23	12	0

NOTA: LOS 35 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 30 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 5 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SÓLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


P.A.
Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias,
Subdirección de Construcción "A1"


P.A.
Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de diciembre de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INGRESOS	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS EJECUTADOS AL EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPROBANTE PERIODO - MONTOS			ESTRATEGIA		AVANCE %		OBSERVACIONES
CÓDIGO	CONTRATO					2022	2023					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
					Mantenimiento a Puente Peatonal en Vialidades Perimetrales de la Ciudad de México (2022)				\$9,999,971.35	\$9,999,971.35	\$0.00				\$0.00	\$97,222,222.22	\$91,222.22				
1	DCCOPADL-1-021-22	PARTICIPACION	AD	RESERVA CIAL, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Reparación a 2 Puente Peatonal ubicado en la Vialidad Sur de la Avenida y Caminos de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 25-jun-23 Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
2	DCCOPADL-1-026-22	PARTICIPACION	AD	RESERVA CIAL, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a un Puente Peatonal, ubicado en la Vialidad Sur de la Avenida (Calle de la Ciudad de México) y Caminos de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Reaprovechados el 19-jun-23 Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
3	DCCOPADL-1-031-22	PARTICIPACION	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Rehabilitación a 4 Puente Peatonal ubicado en diversas Vialidades de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,381,248.80	\$0.00	99.20%	91.88%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
4	DCCOPADL-1-036-22	PARTICIPACION	AD	CONSORCIO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puente Peatonal ubicado en diversas Vialidades de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,403,048.20	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
5	DCCOPADL-1-039-22	PARTICIPACION	AD	GRUPO SOLARIS, S.A. DE C.V.	Reparación del Puente Peatonal ubicado en Calles de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,109,800.76	\$0.00	99.74%	99.99%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
6	DCCOPADL-1-037-22	PARTICIPACION	AD	DISEÑO Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 7 Puente Peatonal ubicado en la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,144,907.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
7	DCCOPADL-1-040-22	PARTICIPACION	AD	MM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puente Peatonal ubicado en diversas Vialidades de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,414,220.91	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
8	DCCOPADL-1-050-22	PARTICIPACION	AD	GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 2 Puente Peatonal ubicado en la Avenida de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$999,999.97	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
9	DCCOPADL-1-021-22	PARTICIPACION	AD	BAU INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Extracción y Traslado de Escombros para Mitigar el Riesgo de Colapso del Puente Peatonal ubicado en la Vialidad Sur de la Avenida y Caminos de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,777,600.04	\$992.71	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
10	DCCOPADL-1-034-22	PARTICIPACION	AD	MM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mitigación de Riesgo de Colapso del Puente Peatonal ubicado en la Vialidad Sur de la Avenida y Caminos de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$994,204.09	\$40,999.91	100.00%	94.32%	Trabajos concluidos. Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
11	DCCOPADL-1-051-22	PARTICIPACION	AD	GRUPO SOLARIS, S.A. DE C.V.	Reparación y Cambio del Estado Actual de los Puente Peatonal ubicado en las Vialidades Perimetrales y Caminos de la Ciudad de México.	01/01/2022	30/09/2022	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,406,809.07	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
12	DCCOPADL-1-056-22	PARTICIPACION	AD	WESH, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 10 Puente Peatonal ubicado en diversas Vialidades de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	97.44%	Trabajos concluidos. Liquidados.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
13	DCCOPADL-1-053-22	PARTICIPACION	AD	GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puente Peatonal ubicado en diversas Vialidades de la Ciudad de México, derivado de trabajos por parte del BANC y servicios de mantenimiento.	01/01/2022	30/09/2022	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00			\$0.00		
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00			\$0.00		

- Datos al 31 de diciembre de 1999.

[illegible]

00000114

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de diciembre de 2022

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CUMPLIMIENTO PERIODO - 2022			EJECUCIÓN		FINANCIA		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							RECIBO	TERMINO	RECIBO	RECIBIDA	EN TERMINO	RECIBO	TERMINO	
					Proyecto Integral para la Construcción del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en Av. Sonoma No. 22.				\$11,787,846.00	\$11,787,846.00	00.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
24	DOCCP-AD-1-0040-22	RECURSOS PROPIOS	AD	DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Demolición y Retiro de Escenario de Fútbol ubicado por dentro de Sonoma No. 22, entre las Calles Chapultepec y Colima San Antonio Road, Col. Chapultepec, C.P. 06000, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México.	1/08/2022	12/12/2022	\$12,000,000.00	\$11,787,846.00	\$11,787,846.00	00.00	ANTICIPA	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajo concluido.
					Intervención, abastecimiento y retiro de la primera planta denominada "Los Grandes Valores Nacionales", ubicada en la Av. Juárez No. 82.				\$5,147,340.01	\$5,147,340.01	00.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
25	DOCCP-RI-1-1041-22	PARTICIPACION E	RI	CAJ DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	Intervención y Demolición y Retiro de la Primera Planta denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Angel Bolívar, primera etapa, ubicada en el inmueble de Avenida Juárez No. 82, Col. Centro, C.P. 06000, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México.	28/02/2022	31/07/2022	\$2,400,000.00	\$2,398,021.00	\$2,398,021.00	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$2,398,021.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Reaprobado el 08-ago-22 Liquidado.
26	DOCCP-RI-1-110-22	PARTICIPACION E	RI	CAJ DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	Intervención y Demolición y Retiro de la Primera Planta denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Angel Bolívar, Segunda Etapa, ubicada en el inmueble de Avenida Juárez No. 82, Col. Centro, C.P. 06000, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México.	28/02/2022	09/11/2022	\$2,398,000.00	\$2,348,018.72	\$2,348,018.72	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$2,348,018.72	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo Concluido. Liquidado. Reaprobado el 14-ago-2022.
27	DOCCP-RI-1-114-22	PARTICIPACION E	RI	CAJ DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	Montaje y Traslado de la Primera Planta denominada "Los Grandes Valores Nacionales" de Angel Bolívar ubicada en el inmueble de Avenida Juárez No. 82, Col. Centro, C.P. 06000, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México.	28/02/2022	27/11/2022	\$3,348,000.00	\$3,486,325.41	\$3,486,325.41	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$3,486,325.41	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajo Concluido.
					Proyecto Integral para la Construcción del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en Av. Juárez No. 82.				\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	00.00					\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00			
28	DOCCP-RI-1-0048-22	PARTICIPACION E	RI	DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Demolición y Retiro de Escenario de Fútbol ubicado por dentro de Avenida Juárez No. 82, entre las Calles Chapultepec y Humboldt, Col. Centro, C.P. 06000, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México.	28/02/2022	11/08/2022	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo Concluido. Liquidado. Reaprobado el 14-ago-2022.
					Trabajo de Construcción de la Cancha Multifuncional, ubicada en Av. 16 de Septiembre No. 16.				\$7,016,490.00	\$7,016,490.00	00.00					\$0.00	\$0,700,000.00	\$0.00			
29	DOCCP-AD-1-0050-22	PARTICIPACION E	AD	MANEJO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción de la Cancha Multifuncional, ubicada en Av. 16 de Septiembre No. 16, Col. Chapultepec, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, Ciudad de México.	20/09/2022	09/11/2022	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$4,700,000.00	\$0.00	50.00%	50.00%	Trabajo en proceso de ejecución.
30	DOCCP-AD-1-110-22	PARTICIPACION E	AD	CONSTRUCCIONES METÁLICAS FELS S.A. DE C.V.	Montaje, Fabricación, Armadura, Transporte y Montaje de Estructura Metálica y desmontaje para la Cancha Multifuncional, ubicada en Av. 16 de Septiembre No. 16, Col. Chapultepec, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, Ciudad de México.	21/12/2022	28/11/2022	\$7,446,000.00	\$7,301,487.20	\$7,301,487.20	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,307,000.00	\$0.00	100.00%	95.75%	Trabajo concluido.
					Demolición y retiro de los Muros del área de Franchises del Centro Deportivo Xochimilco.				\$475,712.00	\$475,712.00	00.00					\$0.00	\$475,712.00	\$0.00			
31	DOCCP-AD-1-1051-22	PARTICIPACION E	AD	MANEJO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de los Muros del área de Franchises del Centro Deportivo Xochimilco, ubicada en Francisco Díaz y Av. 16 de Septiembre, Col. Chapultepec, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, Ciudad de México.	20/09/2022	11/08/2022	\$500,000.00	\$475,712.00	\$475,712.00	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$475,712.00	\$0.00	100.00%	95.00%	Trabajo concluido. Liquidado.
					Trabajo de Mejoramiento y Rehabilitación del suelo en el Módulo Cancha y Urrutia.				\$4,746,887.74	\$4,746,887.74	00.00					\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00			
32	DOCCP-AD-1-0064-22	PARTICIPACION E	AD	CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Trabajo de mejoramiento y rehabilitación del suelo en el Módulo Cancha y Urrutia, ubicado en Av. 16 de Septiembre No. 16, Col. Chapultepec, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, Ciudad de México.	28/02/2022	31/03/2022	\$4,750,000.00	\$4,746,887.74	\$4,746,887.74	00.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	100.00%	95.00%	Trabajo Concluido.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de diciembre de 2022

CÓDIGO	NOMBRE	FV	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS	MONTOS CONTRATADOS FUERORA DEL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONSUMO (PAGADO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PAGADO	TERMINO	MONTOS	PAGADO	EN TRANSITO	PAGADO	TERMINADO			
					Construcción de instalaciones telecomunicaciones y eléctricas en el Hospital General Cuernavaca.				\$7,461,000.00	\$7,461,000.00	\$0.00				\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00				
71	DOCOM-CL-1-186-22	PARTICIPACION	B	GRUPO CONSTRUCTORES MEXICO, S.A. DE C.V.	Bastidores de 100 m de la tubería existente de tubería corrugada de 100mm (4") de diámetro por tubería de polietileno de alta densidad de 100mm (4") de diámetro, RD-41, para agua potable, así como la instalación de 340 m de tubería de polietileno alta densidad corrugada de 457 mm (18") de diámetro, para drenaje sanitario, de la tubería de 2.40 m de diámetro, hasta drenar al sistema existente de 9.00 m (36"), ubicado en la Calle Mariano Escobedo s/n Av. 19 de Septiembre, entre las Avenidas Ahuacá, 36000 y Centro, colonia Cuernavaca, Alameda Cuernavaca de México, C.P. 36000 Ciudad de México.	09/08/2022	30/12/2022	\$7,461,000.00	\$7,461,000.00	\$7,461,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	40.00%	Trabajo en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Trabajo de Cableado y Reemplazo de la Línea Eléctrica Subestación Centro de Salud Lomas de Pedernales.				\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
72	DOCOM-CL-1-186-22	PARTICIPACION	B	GRUPO CONSTRUCTORES MEXICO, S.A. DE C.V.	Revisión, Pruebas y Puesta a Sistema Eléctrico en Monte Lomas en el Centro de Salud Lomas de Pedernales, Centro Lomas de Pedernales Alameda Cuernavaca de México, C.P. 36000 Ciudad de México.	09/11/2022	30/12/2022	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajo Consultivo.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
73	DOCOM-CL-1-186-22	PARTICIPACION	B	GRUPO CONSTRUCTORES MEXICO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Cableado y Reemplazo de la Línea Eléctrica para la Subestación existente en el Centro de Salud Lomas de Pedernales.	09/11/2022	30/12/2022	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$112,400.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo Consultivo, Liquidado.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTAL									\$11,461,000.00	\$11,461,000.00	\$0.00				\$0.00	\$1,112,400.00	\$1,112,400.00				


Ing. Carlos Enrique Manero Contreras.
Subdirector de Construcción "A2"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2022	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$11,461,000.00	\$11,461,000.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJE DE AVANCE	
PAGADO	EN TRANSITO	PAGADO	POR TRANSITO
\$1,112,400.00	\$1,112,400.00	100.00%	100.00%

00000116

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO- CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

¹ *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1029-1042.

[illegible]

4. 001 0117

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de diciembre de 2020

CÓDIGO	CONTRATO	E.O.	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE VIGENCIA CONTRACTUAL		Monto Construcción Original	ECONOMÍA	RECHERCA		Ejecución (PROMEDIO ANUAL)			ESTIMADO		AVANCE %		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino					Inicio	Termino	Avance	Promedio	Se Muestra	Promedio	Avance Muestra	
07	BOOCP-004-A-010-00		Manejo de residuos	00	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la Ciudad de México	01/01/2017	30/06/2021	1,398,234.00	0.00	00/01/2017	00/01/2017	0.00	00/01/2017	0.00	1,361,879.22	0.00	00.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 6 Feb. 2021
08	BOOCP-004-A-010-00		Manejo de residuos	100	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la Ciudad de México	01/01/2017	30/06/2021	1,398,234.00	0.00	00/01/2017	00/01/2017	0.00	00/01/2017	0.00	1,361,879.22	0.00	00.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 6 Feb. 2021
09	BOOCP-004-A-010-00		Manejo de residuos	00	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la Ciudad de México	01/01/2017	30/06/2021	1,398,234.00	0.00	00/01/2017	00/01/2017	0.00	00/01/2017	0.00	1,361,879.22	0.00	00.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 6 Feb. 2021

PA
Ing. Carlos Enrique Herrera Cervera
Subdirector de Construcción "A"

PA
Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	67	1	0	0	68	0	68	0
TOTAL	67	1	0	0	68	0	68	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

A. 000 0120

CÓDIGO	NOMBRE	F.F.	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INICIATIVA	MONEDERA GOBIERNO	POBLACIÓN	ENTREGA	CONVENIO PERÍODO ANTERIOR			EJECUCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					RECIBI	TERMINO	RECIBI	INICIADA	EL PERÍODO	FIN DEL PERÍODO	PROYECTADO	
1	DOCPF0000010	01	PP	PP	Operación y Mantenimiento del Centro de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Sistemas y Aplicaciones Web	01-mar-17	31-dic-17	INFORMACIÓN	6,211,419.40	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	49,276,419.41	0.00	NA	NA	Monto a pagar por el contrato 0001 de la DOCPF0000010
3	DOCPF001100002	01	UP	UP	En Arg. Ciudad de México, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	11,496,701.28	16,236,363.34	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	9,843,040.40	0.00	100.00	100.00	Por pagar
5	DOCPF001600002	01	AD	AD	Agencia de Administración de Contratos, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	216,064.35	284,739.28	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	0.00	11,000.00	100.00	0.00	Por pagar
4	DOCPF001600003	01	AD	AD	Multiservicios de México, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	7,084,254.40	1,495,967.07	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	1,495,967.07	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entregas Recepciones y Pagos
5	DOCPF001600004	01	AD	AD	Multiservicios de México, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	8,785,340.08	2,085,250.81	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	2,085,250.81	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entregas Recepciones y Pagos
6	DOCPF001600005	01	AD	AD	Agencia Civil, Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	7,785,340.08	8,885,877.36	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	8,885,877.36	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entregas Recepciones y Pagos
7	DOCPF001600006	01	AD	AD	Agencia Civil, Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	8,785,340.08	8,885,877.36	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	8,885,877.36	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entregas Recepciones y Pagos
8	DOCPF001600007	01	AD	AD	Agencia Civil, Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	1,445,070.04	1,445,070.04	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	1,445,070.04	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entregas Recepciones y Pagos
9	DOCPF001600008	01	AD	AD	Agencia Civil, Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	7,084,254.40	7,079,884.40	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	4,374,167.07	0.00	81.00	85.00	Por pagar
10	DOCPF001600009	01	UP	UP	Proyecto de México, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	33,281,265.40	31,282,065.40	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	33,281,265.40	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entregas Recepciones y Pagos
11	DOCPF001600010	01	UP	UP	Proyecto de México, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	101,281,265.40	101,281,265.40	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	84,276,419.41	0.00	83.21	85.00	Por pagar
12	DOCPF001600011	01	AD	AD	Agencia Civil, Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	8,885,877.36	4,134,688.71	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	2,101,480.97	0.00	83.00	81.00	Por pagar
13	DOCPF001600012	01	UP	UP	Proyecto de México, S.A. de C.V.	01-mar-17	31-dic-17	101,281,265.40	8,885,877.36	0.00	ANEXO	NA	NA	NA	8,885,877.36	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entregas Recepciones y Pagos

121

[illegible]

6

123

124

[illegible]

AL 31 de diciembre de 2022																			
LÍNEA	CONTRATO	VIG.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		ACUMULATIVO DE INVERSIÓN A	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AUTOPAGO	FORMULARIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PROG.	TRAMITE	BOLETO	PROG.	TRAMITE	PROG.	TRAMITE	
85	DOOPADP-028-22	02	AD	Corredor Urbano, S.A. de C.V.	Servicios de Ingeniería técnica, administrativa y financiera para el estudio preliminar y el Proyecto Integral para la construcción del edificio de oficinas y planta de energía de la Ciudad Nacional (Ciudadela), sobre la base de planos preliminares y tiempos determinados.	31-01-22	30-06-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTEPRO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
86	DOOPADP-029-22	02	AD	Ingredim Explotación, S.A. de C.V.	Permisos legales para realizar el desarrollo inmobiliario, así como el estudio preliminar y el Proyecto Integral para la construcción del edificio de oficinas y planta de energía de la Ciudad Nacional (Ciudadela), sobre la base de planos preliminares y tiempos determinados.	31-01-22	31-06-22	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	ANTEPRO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	Por tramitar
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
87	DOOPADP-030-22	02	AD	Ingredim Explotación, S.A. de C.V.	Permisos legales para realizar el desarrollo inmobiliario, así como el estudio preliminar y el Proyecto Integral para la construcción del edificio de oficinas y planta de energía de la Ciudad Nacional (Ciudadela), sobre la base de planos preliminares y tiempos determinados.	31-01-22	31-06-22	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	ANTEPRO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
88	DOOPADP-031-22	02	AD	Ingredim Explotación, S.A. de C.V.	Servicios de Ingeniería técnica, administrativa y financiera para el estudio preliminar y el Proyecto Integral para la construcción del edificio de oficinas y planta de energía de la Ciudad Nacional (Ciudadela), sobre la base de planos preliminares y tiempos determinados.	31-01-22	31-06-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTEPRO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

NOTA: EL CONTRATO DOOPADP-028-22, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2022 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DOOPADP-028-22, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DOOP-02.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE AUTOPAGO	
12,000,000.00	0.00	ANTEPRO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE CONTRATOS	AVANCE GLOBAL	AL PERIODO	
PROG.	TRAMITE	PROG.	TRAMITE
0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Roberto Alexander Fernandez Beltrán
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pacheco Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eduardo David Muñoz Cárdenas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	55	4	0		0	59	0	59	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

00127

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2012[illegible]



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CANT	NOMBRE OPERA	FF	ACALDERE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PLAZO ESTIMADO	MONTOS CONTRATADO (M\$)	EJECUTADO	ANTICIPO		COMPARACIÓN PERIODO - REAL			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	COMO	INICIADA	21/12/2022	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-AD-L-1-003-22	15	A.D.	VOL PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA, UBICADA EN LA ANTIGUA INSTITUCIÓN MILITAR DE BATELLEJO DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PARQUE DEPORTIVO CAMPO ALTIPO N° 147, AVENIDA UNICO DE GUERRA N° 147, COLONIA PUEBLO NUEVO, AL CALLEJÓN DE LA UNIDAD, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-jul-22	01-ago-22	8.4 MDP	330,163.59	0.00	ANTICIPO	N/A	02-nov-22	01-dic-22	87,540.90	437,704.49	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
11	DGCOP-AD-L-1-054-22	25	I.R.	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) UBICADO EN CALLE SIERRA N° 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA DE GUERRA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-22	10-ago-22	8 MDP	5,257,028.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	55,132,984.22	0.00	100.00%	97.94%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-1-057-22	25	A.D.	ROMES-CONSTRUCT, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	20-jul-22	24-ago-22	1.5 MDP	1,418,964.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,418,964.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-1-085-22	25	A.D.	ROMES-CONSTRUCT, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN PARA BANDA PERIFERIAL EN LOS PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) UBICADO EN CALLE SIERRA N° 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA DE GUERRA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	06-ago-22	04-sep-22	0.5 MDP	478,507.48	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	478,507.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-1-070-22	25	AD	LARIZ VERDE, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA DE MUEBLES ESPECIALES FIJOS EN MADERA PARA EL PLAZA MUSEO INTERACTIVO UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL MUSEO INTERACTIVO EN CALLE SIERRA N° 40, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA DE GUERRA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	26-ago-22	24-sep-22	0.5 MDP	327,879.01	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	327,879.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-1-077-22	25	AD	ROMES-CONSTRUCT, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	23-ago-22	21-sep-22	1.5 MDP	1,319,536.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,319,536.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-1-078	25	AD	GRUPO QUINZA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZA COMPOSTORES MEXICANOS" UBICADO EN CALLE FOLCLÓRICOS MEXICANOS EN COLONIA COMPOSTORES MEXICANOS	20-ago-22	18-sep-22	0.8 MDP	583,441.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	583,441.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORD	NOMBRE OBRA	F.F.	ACALDIA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		RECURSOS CON- REFERENCIA	Monto CONTRATADO 2022	EJECUCIÓN	ENTRADA		CONVENIO PERIODO 2022			RENTAS		FINANCIAMIENTO		OBSERVACIONES
						FECHA	TERMINO				ANTICIPO	N/A	PROG.	TERMINO	MONTOS	PAJAS	EN TRABAJO	PROG.	FINANCIADO	
17	DGCOP-RL-1-079-22	25	3E	FORLARI FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 14"	18-ago-22	15-se-22	1 MOP	8,312,032.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,443,712.39	1,084,083.80	100.00%	42.44%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
18	DGCOP-RL-1-081-22	25	3E	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES PELIGUERO, UBICADO EN CALLE PELIGUERO, NUMERO 2, COLONIA ROSALES, C.P. 15070, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD	20-ago-22	27-nov-22	12 MOP	10,150,428.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,278,577.35	871,850.65	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-1-087-22	25	AD	ZAMMA OBRAS SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES DE "QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VERA, No. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDIA TLAXIAC, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.0 MOP	1,418,006.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,299,587.97	33,330.33	100.00%	94.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-RL-4-090-22	25	3E	MAGDEX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES PASTORES, UBICADO EN CALLE AGRICULTORES EN ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A	24-ago-22	01-dic-22	8 MOP	5,649,762.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,033,622.36	616,140.36	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-RL-1-094-22	25	3E	MAGDEX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES BUENOS AIRES EDIFICIO 1 Y 2, UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS PÉREZ 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	23-ago-22	20-nov-22	6 MOP	5,589,049.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,505,795.02	867,317.92	100.00%	56.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-RL-5-095-22	25	3E	ANMA INGENIERIA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO, DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) A	08-sep-22	31-dic-22	3 MOP	2,754,397.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,011,507.90	479,025.71	100.00%	26.43%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-RL-4-101-22	25	3E	GUADCO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES LOS RAMBOYANES, UBICADO EN CALLE LOS RAMBOYANES, COLONIA PUENTES DEL PEDREGAL, ALCALDIA TLAXIAC, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	02-sep-22	19-oct-22	3 MOP	2,851,509.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,851,509.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

LÍNEA	HERRERA SUBPROYECTO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	RENOVACIÓN DEL SERVICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN MES	TERMINO DÍAS	PRECIOS MOP	MONT COSTESTADO	ECONOMIA	ANÁLISIS PAGO	TIPO	FORMA	MATERIA	PRUEBA	EXTENSION DE TIEMPO	PAGO	PAGADERO	SITUACIONES	
24	DGCOF-AD-L-1-103- 22	25	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE DEMOLICIONES DE RESTAURACIÓN DE CALLES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD. ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZARES "PLAZARES BUENOS AIRES" UBICADO EN CALLE DR ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	13-sep-22	12-oct-22	0.18 MOP	148,203.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	148,203.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
25	DGCOF-AD-L-5-104- 22	25	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA REVISIÓN ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZARES) PLAZARES BUENOS AIRES, UBICADO EN CALLE DR ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA	14-sep-22	12-nov-22	0.60 MOP	548,606.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	548,574.28	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
26	DGCOF-RU-L-1-105- 22	25	R	INOVAR Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZARES) PLAZARES RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN EN COL. OLIVAR DEL COND. ZOA, SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	15-sep-22	13-dic-22	8 MOP	7,494,547.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,403,286.83	1,011,026.27	100.00%	99.93%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
27	DGCOF-AD-L-1-110- 22	15	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA YACCHAY, TLAPAL" UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A GUERRAVACA S. COLOMA LA JOYA, ALCALDÍA TLAPAL, C.P. 14080, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-sep-22	25-nov-22	1 MOP	852,015.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	849,318.16	0.00	100.00%	99.69%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
28	DGCOF-LPM-F-1-113- 22	25	LPM	ROMES- CONSTRUIRE S.A. DE C.V.	ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ADQUIRIR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE RIO DE LA LOZA No. 88, COLONIA DOCTORES, C.P. 06725, ALCALDÍA CUAUHTEMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A	21-sep-22	30-nov-22	15 MOP	14,239,851.76	0.00	ANTICIPO	N/A	01-sep-22	15-dic-22	1,423,983.16	15,644,561.36	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVO A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTE Y PLAZO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
29	DGCOF-AD-L-5-124- 22	15	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA REVISIÓN Y PROYECTO ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS "W" Y "E", ASÍ COMO EL PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H", Y DEL "EDIFICIO DE SERVICIOS". PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADOS EN AV. RIO CHURUSCO No. 1153, COLONIA SAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO "K", "E" Y "H", Y CALLE CULTURA PROGRESIVA No. 11, COLONIA GRUPOS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA (EDIFICIO DE SERVICIOS) CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-sep-22	30-nov-22	1 MOP	864,477.47	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	432,238.76	432,238.71	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	NOMBRE OBRA	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO OBL. REFERENCIAL	VALOR CONTRATO (M\$)	EDIFICADA	GASTOS		GASTOS PERIODO			ESTADO		PORCENTAJES		OBSERVACIONES
											ANTICIPO	AMORTIZADO	BASE	COMIS.	MULTI.	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
30	DDCOP-AD-L-1-141-22	25	AD	ROMES-CONSTRUYE S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTÁMENES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANALES, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,000.07	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIO EL TOTAL DEL CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											FOR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	
31	DDCOP-RL-L-1-141-22	15	RI	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE SACOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA VIREHABACA No. 11, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-nov-22	7 MDP	6,230,920.07	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,050,194.91	100.00%	81.05%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											FOR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,050,194.91	100.00%	81.05%	
32	DDCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO No. 1190, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IXTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.03	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,021,106.76	100.00%	70.83%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											FOR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,021,106.76	100.00%	70.83%	
33	DDCOP-RL-L-1-146-22	15	RI	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AME FENIX S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO H DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO No. 1190, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IXTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	6.5 MDP	5,981,977.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,015,620.16	100.00%	83.84%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											FOR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,015,620.16	100.00%	83.84%	
34	DDCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	GUAYO, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMERA ETAPA" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO No. 1190, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IXTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,444,564.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,330,625.36	100.00%	93.51%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											FOR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,330,625.36	100.00%	93.51%	
35	DDCOP-AD-L-1-146-22	15	AD	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	DESARMADO, TRASLADO Y MONTAJE DE CASSETAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA OCUPACIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ZONA AL A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	893,011.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	772,558.94	100.00%	86.51%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											FOR AMORT.	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	772,558.94	100.00%	86.51%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	SÍMBOLO CONCEPTO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO COSTO ESTIMADO	Monto CONTRATADO (M\$)	SOLICITUD	ANTICIPO		CÓMPUTO PERÍODO (MONTOS)			ESTADO DE PAGOS		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Anticipo	Amortizado	Base	Termino	Monto	Pagado	En Trámite	Físico	Financiero	
36	DGCOP-AD-L-1-149-22	18	AD	C. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	DEMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE CASITAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA OCUPACIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) DE LA CIUDAD DE MÉXICO ZONA EL A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	806,657.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	804,233.47	100.00%	86.06%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
37	DGCOP-AD-F-1-154-22	25	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO PATIO HOTEL, DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN COL. PERON DE LOS BAÑOS ALCALDIA VERISTIANO CARRANZA.	17-06-22	31-06-22	17 MDP	16,742,628.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
38	DGCOP-AD-F-1-155-22	25	AD	ALFA PROVEEDORES S.Y. CONTRATISTA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN COL. PERON DE LOS BAÑOS ALCALDIA VERISTIANO CARRANZA.	17-06-22	31-06-22	9 MDP	8,507,428.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
39	DGCOP-AD-F-1-156-22	25	AD	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN COL. PERON DE LOS BAÑOS ALCALDIA VERISTIANO CARRANZA.	17-06-22	31-06-22	28 MDP	25,863,243.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
40	DGCOP-AD-F-3-181-22	25	AD	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	TRABAJO PRELIMINAR EN EDIFICIO "TERMINAL" EN "PATIO HOTEL" Y "ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN COL. PERON DE LOS BAÑOS ALCALDIA VERISTIANO CARRANZA C.P. 15600.	29-06-22	31-06-22	1.4 MDP	1,399,976.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
41	DGCOP-AD-L-1-184-22	25	AD	GUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CARPINTERÍA Y HERRERIA PARA LOS PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA COMUNA ALVARO OBREGON" UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN COLONIA OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA SECCIÓN ALCALDIA ALVARO OBREGON CIUDAD DE MÉXICO.	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,444,507.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
42	DGCOP-AD-L-1-185-22	25	AD	GUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CARPINTERÍA Y HERRERIA PARA LOS PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA COMUNA ALVARO OBREGON" UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN COLONIA OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA SECCIÓN ALCALDIA ALVARO OBREGON CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-22	31-06-22	0.1 MDP	95,350.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

CANT	NÚMERO DE OBRA	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN	Monto estimado del contrato	CANTIDAD	ANTICIPO		CONVENIO PERIODO DE EJECUCIÓN			ESTIMADO EN TRANSITO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Anticipo	Amortizado	Inicio	Termino	Suplido	Plazado	En Transito	Porcentaje	Porcentaje	
43	DGCOP-AD-L-1-185-22	25	AD	MC CARTNEY INTERNACIONAL S DE RL DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR PARA LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLARES BOSQUE DE ARAGON" UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO BA 110 EN COLONIA SAN JUAN DE ARAGON, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-06-22	31-06-22	0.3 MDP	292,974.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
44	DGCOP-AD-L-1-187-22	25	AD	LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLARES URSULO GALVAN" UBICADO EN CALLE URSULO GALVAN NUMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO GUETZALCOAS, ALCALDIA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-06-22	31-06-22	1.9 MDP	1,445,994.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
45	DGCOP-AD-L-1-188-22	25	AD	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELACION, CRISTALES, ALUMBRERIA, ACABADOS REGULARS Y SALIDAS DE VOZ, DATOS PARA EL "PLARES REAL DE SAN MARTIN" UBICADO EN LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,246,540.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
46	DGCOP-AD-L-1-189-22	25	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, PINTURA, LUMBRERIA E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLARES REAL DE SAN MARTIN" UBICADO EN CALZADA REAL SAN MARTIN N° 375 COLONIA REVOLUCION TABALLANES, ALCALDIA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	30-06-22	31-06-22	0.56 MDP	500,813.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
47	DGCOP-AD-L-1-190-22	25	AD	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACCESORIOS DE BANCOS DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLARES DIF GUETZALCOAS" UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL N° 36 COLONIA GUADALUPE, ALCALDIA TLAXIHAL, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-06-22	31-06-22	0.2 MDP	177,298.18	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
48	DGCOP-AD-L-1-191-22	25	AD	IRADADO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	30-06-22	31-06-22	1.8 MDP	1,392,653.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	NOMBRE DEL PROYECTO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS DE P.V. (MILLONES DE PESOS)	MONTOS DE FINANCIACIÓN	ECONOMÍA	APORTE		CONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO			ESTIMACIÓN DE TRÁFICO		PROMEDIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PRECIO	TERMINO	MONTOS	PRECIO	ESTIMACIÓN	PROMEDIO	PRECIO	PROMEDIO		
49	DGCOP-AD-L-1-193-22	25	AD	ROMES-CONSTRUAAT S. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PUESTA EN MARCHA EN EL "PLAZAS EL EMPOTRADO EN LA ALCALDIA TULAHUAY CUADE DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-06-22	31-06-22	1 MDP	752,816.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
50	DGCOP-AD-L-1-193-22	26	AD	GRUPO QUIYEM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ALBAÑILERIA, ACABADOS, HERRERIA Y CANCERERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CEDA" UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
51	DGCOP-AD-L-1-194-22	25	AD	GRUPO QUIYEM, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA METALICA EDIFICIO 2 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CEDA" UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO	30-06-22	31-06-22	1.4 MDP	1,354,294.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
52	DGCOP-AD-L-1-195-22	25	AD	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA S. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS CEDA" UBICADO EN CALLE SUBASTA Y PRODUCTORES AREA FEDERAL, CENTRAL DE ABASTO, C.P. 8840 ALCALDIA TULAHUAY CUADE DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALICADO Y TIEMPO	30-06-22	31-06-22	0.35 MDP	300,007.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
53	DGCOP-AD-L-1-196-22	26	AD	GRUPO QUIYEM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CEDA" UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA TULAHUAY	30-06-22	31-06-22	0.7 MDP	876,105.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
54	DGCOP-AD-L-1-197-22	25	AD	GRUPO QUIYEM, S.A. DE C.V.	TRABAJO RELATIVO A TRÁMITE, PERMISOS, LICENCIAS Y ESTRUCTURA METALICA DE EDIFICIO 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CEDA" UBICADO EN AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,438,295.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
55	DGCOP-AD-L-1-198-22	25	AD	GRUPO QUIYEM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y VOZ Y DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CEDA" UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
56	DGCOP-AD-L-1-199-22	25	AD	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CEDA" UBICADO EN 1RA. CERRADA DE CHALAPOTEC, 2.7 KM-35, LT-33, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA TULAHUAY CUADE DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30-06-22	31-06-22	0.4 MDP	396,954.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CANT	NÚMERO EXTERNO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO 2022	EJECUCIÓN	ANULACIÓN		CONTRATO PERÍODO MENSUAL			ESTADO DE PAGOS		PAGOS		OBSERVACIONES
											ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MENSUAL	PAGADA	EN PAGOS	PAGADA	PARCIALMENTE	
57	DOCOF-AD-L-1-200-22	25	AD	YAVELMAR S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PILARES BUENOS AIRES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS NO. 481 COL. BUENOS AIRES, ALTAVERA	30-de-22	31-de-22	1.5 MDP	1,446,372.23	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
58	DOCOF-AD-L-1-201-22	25	AD	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA UBICADO EN EJE 5 NORTE EN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN GARCERÁN, AL CALDA GUSTAVO A.	30-de-22	31-de-22	1.1 MDP	1,086,953.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
59	DOCOF-AD-L-1-202-22	25	AD	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJO SOLICITADOS POR EL USUARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PILARES LA PLAZA, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD CERRADA DE PRAY SERVANDO TERESA DE ROS Y CHAMALPOCICA	30-de-22	31-de-22	1.3 MDP	1,276,091.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

TOTAL ESTIMADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANULACIÓN
225,883,898.88	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTE N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		PAGOS SEGUROS		N/A
PAGADA	EN PAGOS	PAGADA	PARCIALMENTE	
116,467,225.46	20,984,895.53	88.47%	\$3.91%	

ARG. CARLOS CUAUTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	49	0	1	0	48	0	48	0
TOTAL	49	0	1	0	48	0	48	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0137

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2011
PRIMA DE CUENTA NÚM. 11 DE DICIEMBRE DE 2011

[illegible]

IMPORTE DE AVANCE FONDO FINANCIERO PARA CUNA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

IMPORTE DE GASTOS FISCOS FINANCIADOS PARA UNA PERSONA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DEL 2022

[illegible]

INFORME DE MANEJO FINANCIERO PARA UNA PÚBLICA SUBCÓMISIÓN DE
FACILIDAD DE CRÉDITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2011
FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

[illegible]

401(k) Plan	401(k) Plan
-------------	-------------

NOTA: Se declara Clavento Modificatorio de Monte, al contrato DCCP-04-1-02 en el que se reduce el importe contratado quedando en Bs. 490,713.30, el contrato DCCP-04-1-02-22 no se contabiliza para efectos del presente reporte por su Terminación Anticipada.

total debt	total debt	total debt	
400,700,000.00	5,040,000.00	debt	0.00
		debt	0.00
		debt	0.00

TOTAL DEBITORS		TOTAL CREDITORS	
PRE-2005	POST-2005	PRE-2005	POST-2005
208,200,000.00	22,800,000.00	60.0%	60.0%

¹Una de las posibilidades de la corriente de pensamiento antropológico es el estudio de los factores físicos y fisiológicos de los sujetos.

PHOTO: NANCY L. WHITE VANDERKAM
Illustration: L'Amédée Desrochers/Le Monde de la construction de l'homme

INTELEKTUELNOG SVOJSTVA



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

9. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



2022 Flores
de Magón

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2022

CDMX/SOBSE/DGAF/12-12-2022/

20

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención a los oficios CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/23.11.22/001 y CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/07.12.22/004, mediante los cuales envía propuesta de afectación líquida por un importe de \$92,000,000.00 (Noventa y dos millones de pesos 00/100M.N.), así como las Fichas Técnicas de los Proyecto Inversión 022NR206 "Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Arte y Oficios", 022NR207 "Rehabilitación del Panteón Dolores Equipamiento y 022NR248 "Cineteca Nacional Chapultepec (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec)", así mismo remite las requisiciones de obra DCOP "B" 048, DCOP "B" 049, DCOP D-22 REQ-OP-05-3, para otorgar suficiencia.

Al respecto, le informo que se solicitó la Afectación Presupuestaria Líquida C 07 C0 01 14204 (anexa), por un importe total de, \$92,000,000.00 (Noventa y dos millones de pesos 00/100M.N.), así como las Fichas Técnicas (anexas), autorizadas por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto, así mismo envió las Requisiciones de Obra DCOP "B" 048, DCOP "B" 049, DCOP D-22 REQ-OP-05-3, con suficiencia presupuestal (anexas), mismas que han sido registradas en nuestros controles, conforme al calendario autorizado que se detalla a continuación:

R	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	GR	PTDA	TG	DI	OG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K010	25	R	5	2	4	6121	2	1	00	022NR0206	DCOP "B" 048	10,000,000.00
Denominación Del Proyecto				"Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Arte y Oficios"												

R	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	GR	PTDA	TG	DI	OG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K010	25	R	5	2	4	6121	2	1	00	022NR0248	DCOP "B" 049	50,000,000.00
Denominación Del Proyecto				"Cineteca Nacional Chapultepec (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec)"												

R	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	GR	PTDA	TG	DI	OG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K010	25	R	5	2	4	6121	2	1	00	022NR0207	DCOP D-22 REQ-OP-05-3	32,000,000.00
Denominación Del Proyecto				"Rehabilitación del Panteón Dolores Equipamiento"												

No omito comentar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a las partidas presupuestales e importes de dichas requisiciones, las cuales no eximen de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.a.p.

M. en I. Jesús Asdrúbal Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. secretariadestruyservicios@cdmex.gob.mx

Mtra. Guadalupe Cárdena Sánchez - Directora de Finanzas en la SOSE. gsanchez@cdmex.gob.mx

C.P. Gustavo Santamaría Martínez - Subdirector de Administración de Recursos - Dirección PSTI. gsantamaria@hotmail.com

Mtro. Ricardo Ceñillo del Río. - Subdirector de Administración de Recursos Financieros de Obras Públicas. ricardo.ceñillo@trihua.com.mx

Lic. Ángel Calderín Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOSE. acalderin@cdmex.gob.mx

DGAF 12493, 12834, 12939

SPCP 2146, 2299, 2294

Folios:

OES/ACC/NGFP/vic



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



Ciudad de México a 19 de enero de 2023

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/19-01-23/005

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

Me refiero a la 12ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, celebrada el pasado 08 de diciembre del presente.

Respecto al caso presentado por esta Dirección y atendiendo la petición realizada por la Contralora Ciudadana relacionada con el mismo caso, durante la presentación solicitó los estudios realizados para la Estabilización del Talud de la pared Poniente del Estacionamiento de la Cineteca Nacional.

Por lo que envío a usted, el estudio solicitado para que por su conducto se haga llegar la información a la solicitante y con esto atender la petición realizada en esa sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



C.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas - jfuentes@cdmx.gob.mx
C.c.e.p. Ing. José Luis Pichardo Hernández. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1" - jpichardo03@cdmx.gob.mx
RAFB/JLPH/luz*

PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN.

Informe técnico.

ESTACIONAMIENTO CINETECA.

VASCO DE QUIROGA 1345, 4ª. SECC. BOSQUE DE CHAPULTEPEC,
CAMPO MILITAR NO.1, ALVARO OBREGON, CDMX. C.P. 01219.

OCTUBRE 2021.

ÍNDICE

1. Introducción.....	1
1.2. Objetivo.....	1
2. Análisis geotécnico.....	1
3. Procedimiento constructivo de la excavación.....	5
3.1. Control.....	13
4. Conclusiones y recomendaciones.....	13
5. Referencias.....	14

Anexo 1. Pruebas de laboratorio.
Anexo 2. Memoria de cálculo.
Anexo 3. Planos.

1. Introducción.

El presente informe contiene el procedimiento de excavación y estabilización de los taludes de manera permanente para la construcción del estacionamiento de la Cineteca Nacional ubicado en Av. Vasco de Quiroga 1345, 4ª. Secc. Bosque de Chapultepec, Campo Militar no.1-F, Álvaro Obregón, CDMX. C.P. 01219

Este documento es una ampliación del informe del estudio del subsuelo (Ref. 1) realizado para la determinación de la capacidad de carga de la cimentación de este proyecto, donde además se requiere que los taludes generados por la excavación sean permanentes.

1.2. Objetivo.

Este documento comprende el procedimiento de excavación y el análisis de taludes permanentes, así como el método de estabilización de estos de acuerdo con las normas generales aplicables para su construcción.

2. Análisis geotécnico.

Para el análisis de los taludes permanentes se obtuvieron las propiedades mecánicas mediante un ensaye triaxial consolidado no drenado (Tx-CU) (**Anexo 1**) sobre la muestra cubica recuperada en la campaña de exploración del estudio del subsuelo (**Ref. 1**), resultando una cohesión de 24.0 T/m² y un ángulo de fricción de 45°.

Material	γ (ton/m ³)	Cohesión (t/m ²)	ϕ °
Arcilla arenosa saturada	1.746	24.5	45

Tabla 1. Propiedades mecánicas para el análisis de la estabilidad de los taludes.

Se evaluó la estabilidad de los cortes contemplando las condiciones más críticas, es decir, los cortes verticales de mayor altura bajo condiciones dinámicas y una sobrecarga uniforme de 2.0 T/m² sobre la corona del talud, producto del peso de la bodega colindante al poniente.

Se utilizó el método de equilibrio límite (falla circular), con el procedimiento de dovelas, donde se supone un estado de deformación plana, aplicando la ley de resistencia Mohr-Coulomb a lo largo de la superficie de falla. El factor de seguridad de cualquier superficie potencial de falla se obtuvo como el cociente del momento resistente que produce la fuerza de fricción, contrario al deslizamiento, entre el momento motor de las fuerzas que provocan el mismo:

$$FS = \frac{MR}{MD} \dots \dots \dots (1)$$

Donde:

FS = Factor de seguridad (adimensional).

MR = Momento resistente (T-m/m).

MD = Momento deslizante (T-m/m).

El análisis numérico se realizó a través de un programa de computación (Slide V.6.005), mediante el cual se determina la posición y radio del círculo más crítico para la selección, partiendo de una cuadrícula de centros de círculos.

El procedimiento de análisis es iterativo, ya que deben escogerse diversos centros de círculos, variando el radio de estos, hasta obtener el factor de seguridad mínimo asociado al centro del círculo en cuestión. Repitiendo la operación para todos los centros de círculo seleccionados, se determina el factor de seguridad mínimo de la sección analizada.

Se analizaron tres cortes verticales de 4 m, 8 m y 9 m los cuales corresponden con las profundidades de excavación máximas para cada talud respecto al nivel de terreno natural (**Figuras 1 a 3**).

Así, el factor de seguridad mínimo en condiciones dinámicas es de **5.11**, utilizando un coeficiente sísmico de 0.186 obtenido del programa SASID, **resultando así que el talud permanente es estable**.

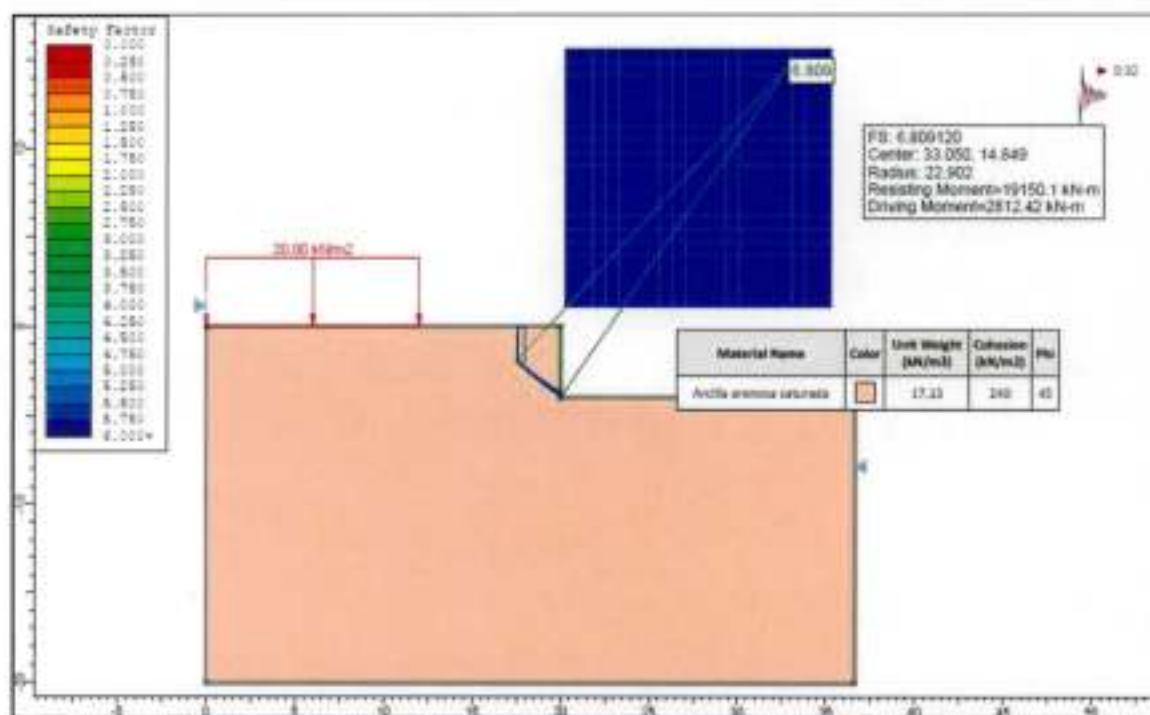


Figura 1. Analisis de talud vertical permanente de 4 m de altura FS=6.809.

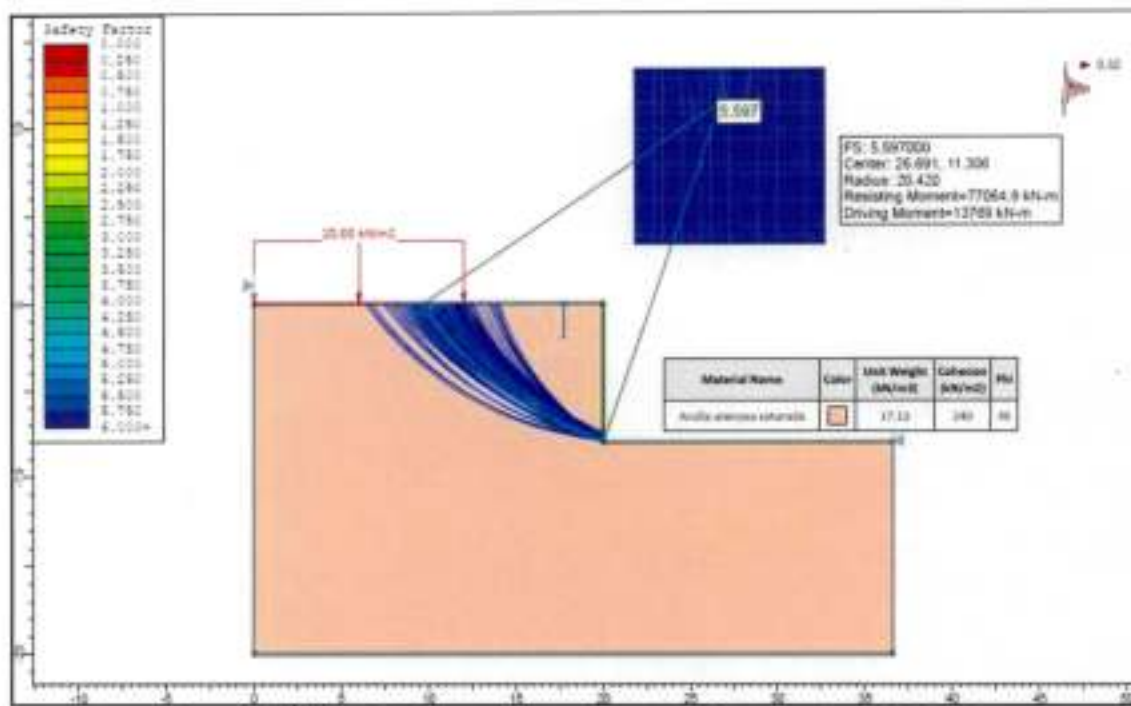


Figura 2. Analisis de talud vertical permanente de 8 m de altura FS=5.597.

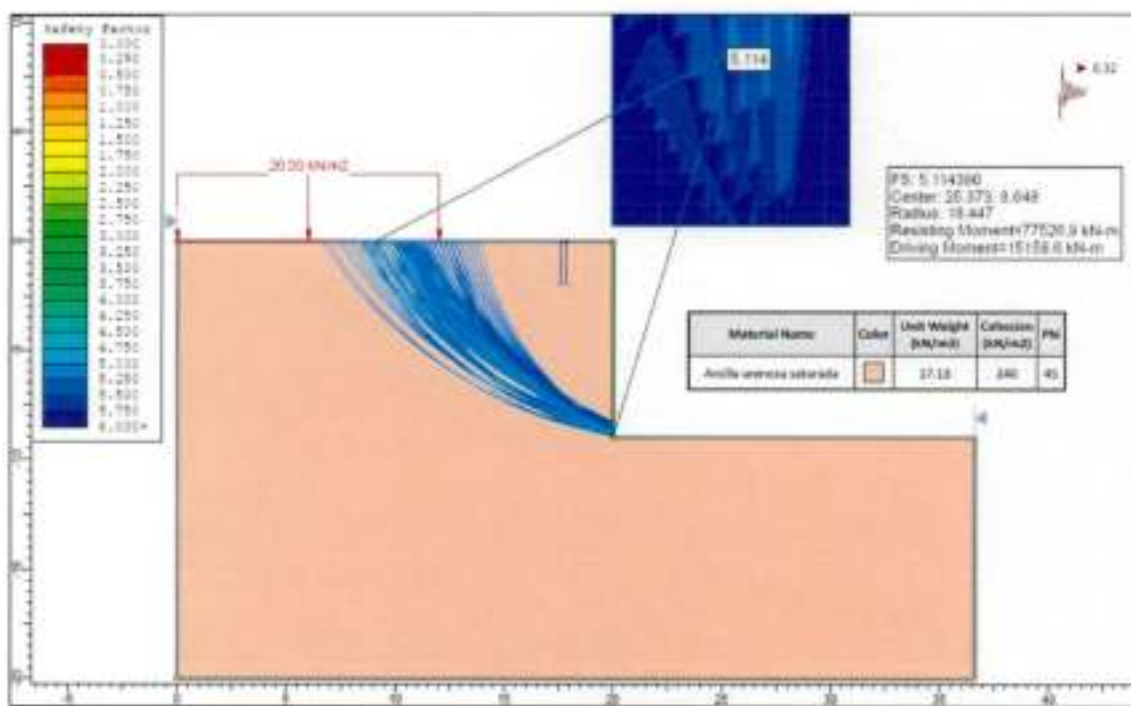


Figura 3. Analisis de talud vertical permanente de 9 m de altura FS=5.114.

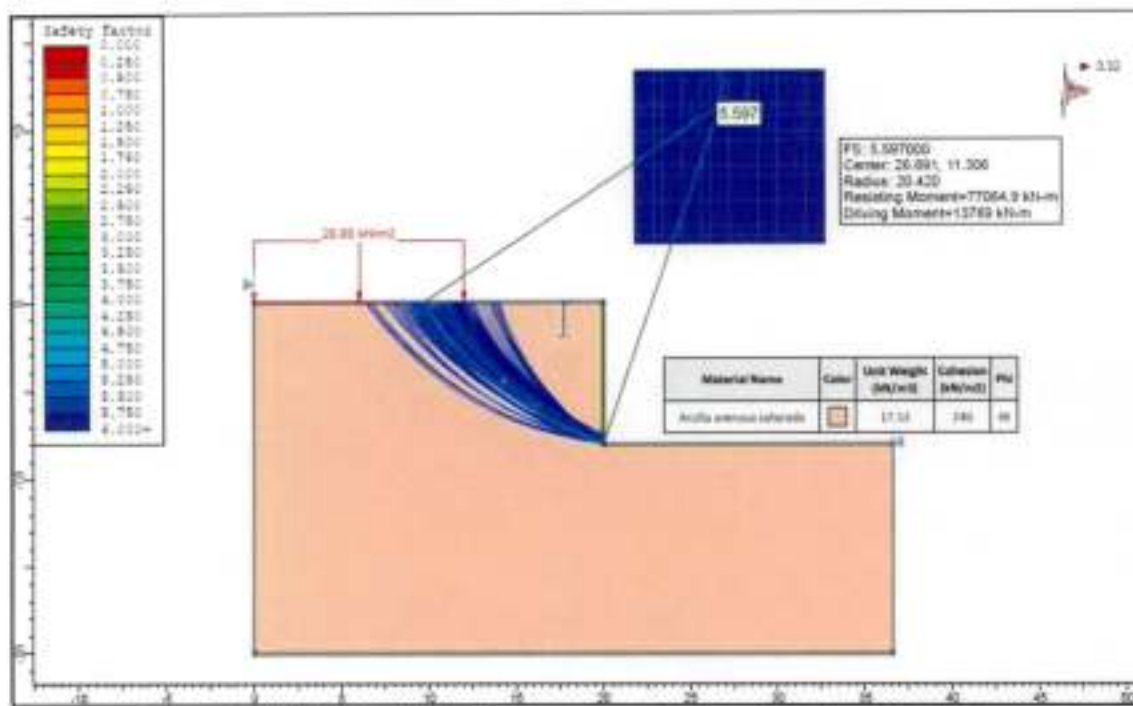


Figura 2. Analisis de talud vertical permanente de 8 m de altura FS=5.597.

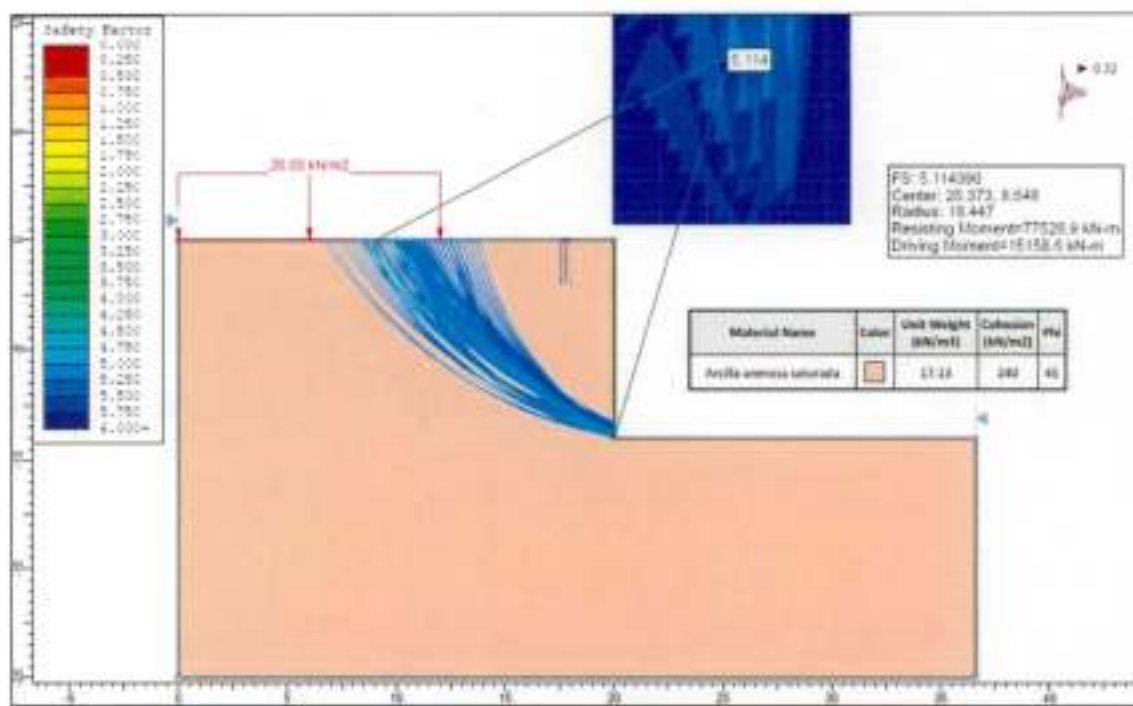


Figura 3. Analisis de talud vertical permanente de 9 m de altura FS=5.114.

Con la finalidad de mantener las propiedades mecánicas intactas y previniendo alguna sobre saturación causada por alguna tubería rota o intemperización pluvial, se analizaron los taludes colocando drenes y anclajes de fricción (**Anexo 2**) aumentando así el factor de seguridad a **5.22**.

Las especificaciones para la estabilización del talud serán las siguientes:

1. Protección del talud mediante una pantalla de concreto lanzado $f'c=200$ kg/cm² de 10 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10.
2. Anclas de fricción de varilla de acero de 1 1/2" diam. en barreno de 4" diam. dispuestas con una pendiente descendente de 10° respecto a la horizontal.
3. Mezcla de inyección cemento-agua-fluidizante de 250 kg/cm².
4. Atraques de concreto $f'c=200$ kg/cm² armado con vs # 3 @ 15 cm en ambos sentidos.
5. Presión de inyección 5 kg/cm²
6. Placa de reacción de 25 x 25 cm $e=1/2"$
7. Separación horizontal: 4 m Separación vertical: 3 m
8. Dren de penetración transversal de PVC hidráulico ced. 40 de 2" diam. en barreno de 3" diam. dispuesto con una pendiente ascendente de 15° respecto a la horizontal.
9. Separación horizontal: 4 m
10. Dren capa de 1 m de largo de tubería de 1" de PVC hidráulico ced. 40, en barreno de 1 1/2" de diam. dispuesto con una pendiente ascendente de 15° respecto a la horizontal.
11. Separación horizontal: 4 m
12. Se deberá colocar una cuneta al pie del talud y una contra cuneta en la corona del talud para recolectar y dar salida al agua pluvial.

3. Procedimiento constructivo de la excavación.

1. Se iniciará el proceso de excavación en la secuencia y anchos que se indican en las **Figuras 4 a 6**, desde el nivel del terreno natural hasta la cota +4.30 m entre los ejes 1 y 8. La excavación se ejecutará por medios mecánicos en forma expedita, de norte a sur.

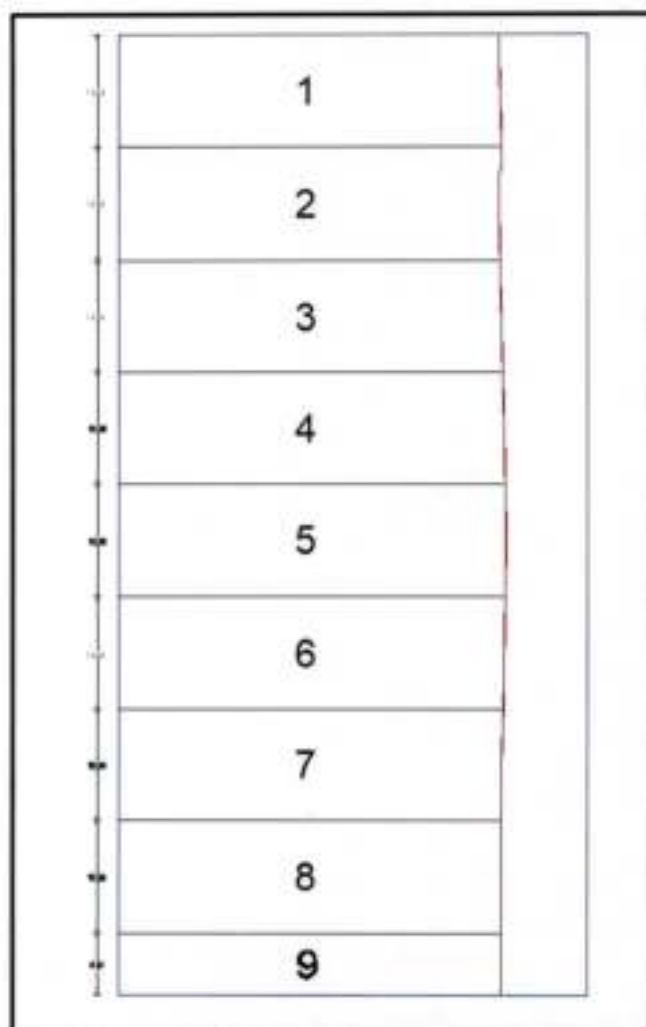


Figura 4. Secuencia de excavación en planta Etapa 1, N+4.30.

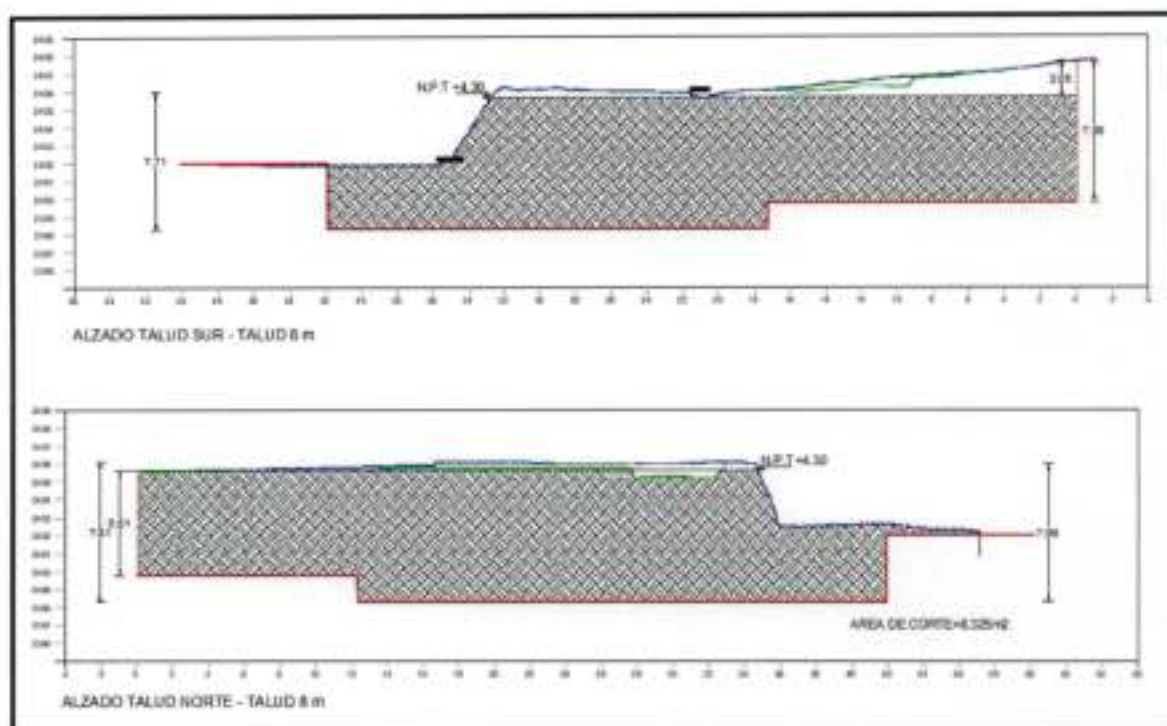


Figura 5. Nivel de excavación Etapa 1, alzados norte y sur, N+4.30.

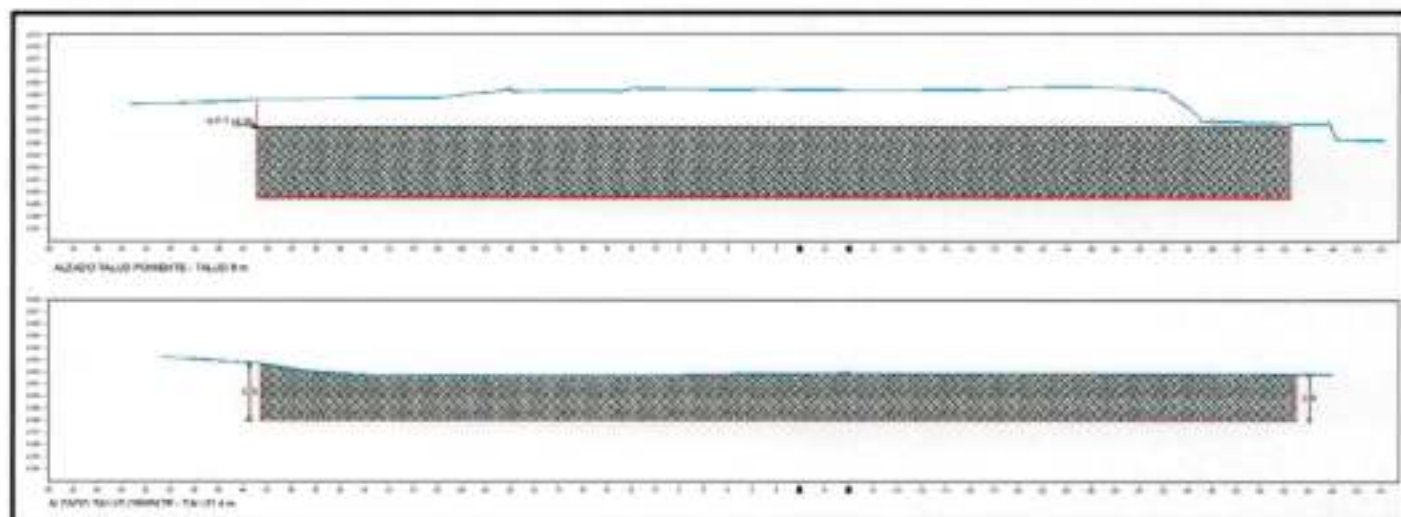


Figura 6. Nivel de excavación Etapa 1, alzados oriente y poniente, N+4.30.

2. Llegando al nivel + 4.30 se iniciará la construcción del primer nivel de anclas en el talud poniente de norte a sur, a la par, se excavará hasta el nivel -0.30 del talud norte y al nivel +1.80 del talud sur procediendo a la construcción del primer nivel de anclaje, además se podrá excavar el núcleo central hasta los niveles máximos de excavación (N.M.E) dejando bermas de 5 m con una inclinación de 60° respecto a la horizontal, el talud oriente se podrá excavar en su totalidad. (Figuras 7 a 9).

La ubicación de las anclas y drenes se deberá realizar mediante un trazo topográfico.

Se deberá respetar la secuencia de excavación siempre de norte a sur en tramos de 10 m como se muestra en la figura 7.

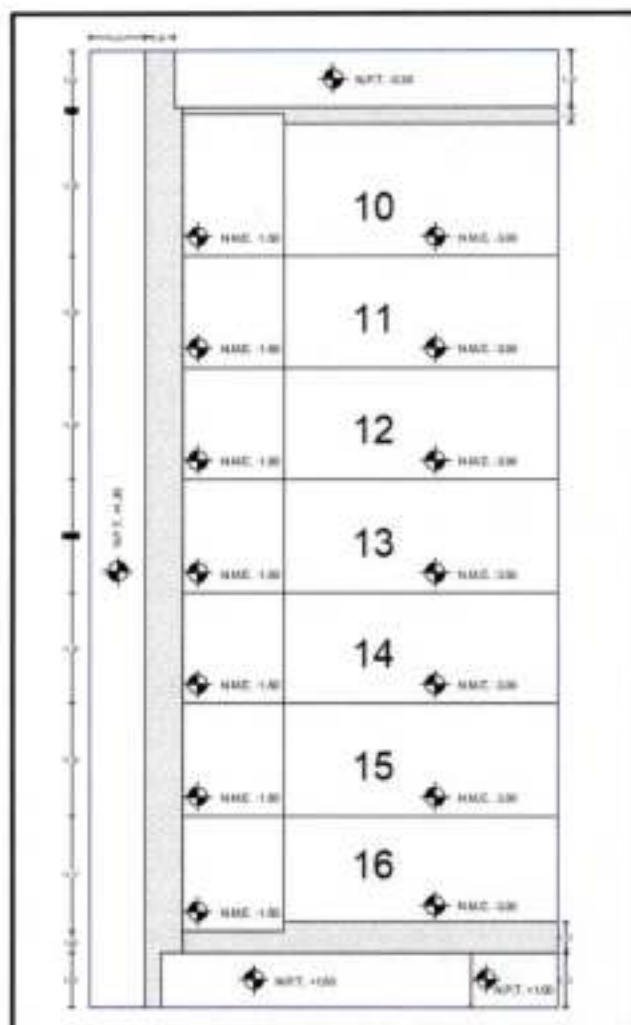


Figura 7. Secuencia de excavación en planta Etapa 2.

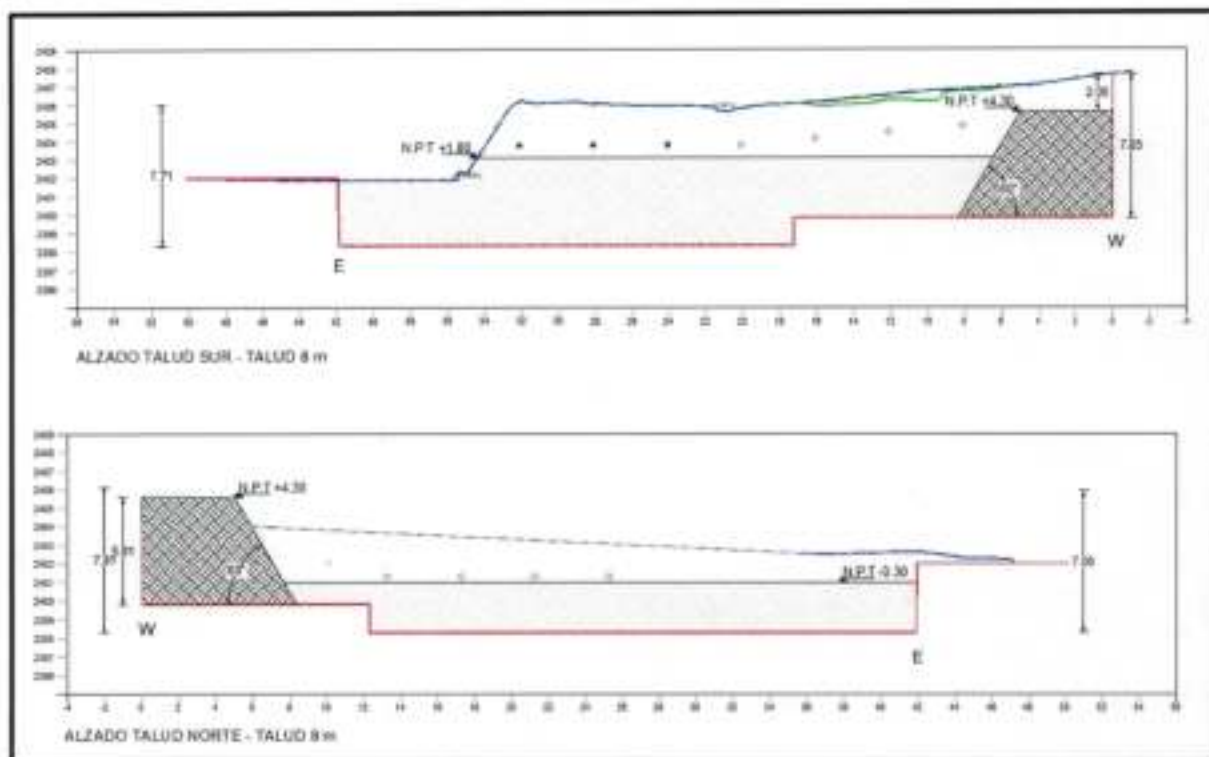


Figura 8. Nivel de excavación Etapa 2, alzados norte y sur, berma 5 m, talud 60°.

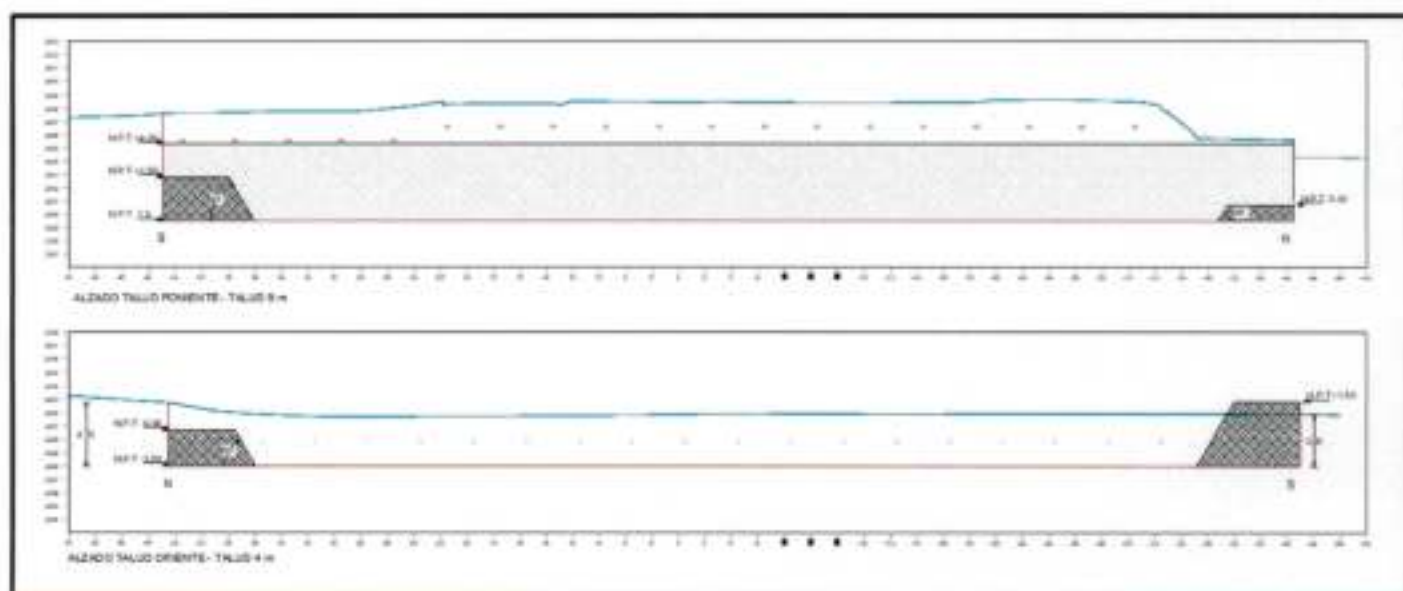


Figura 9. Nivel de excavación Etapa 2, alzados oriente y poniente, berma 5 m, talud 60°.

3. Con la segunda etapa de excavación estabilizada (anclas y protección del talud con concreto lanzado), se continuará respetando la misma secuencia de norte a sur dejando bermas perimetrales de 5 m llegando al N.M.E en el talud norte, al nivel +1.30 en el talud poniente y al nivel -0.70 en el talud sur, iniciando la construcción del primer nivel de drenes y el segundo nivel de anclas. (**Figuras 10 a 12**).

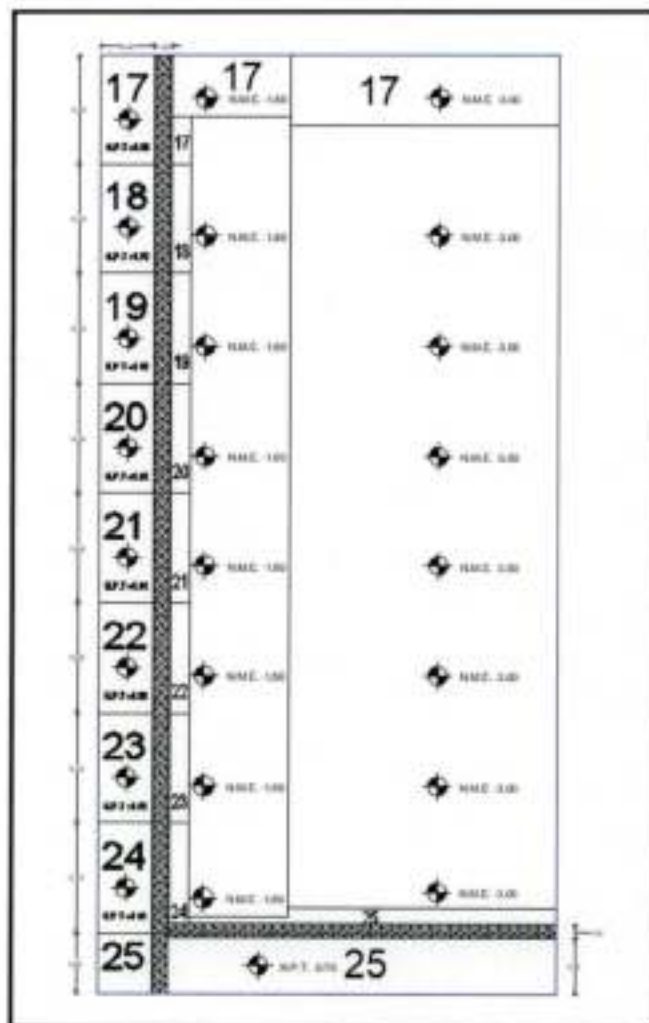


Figura 10. Secuencia de excavación en planta Etapa 3.

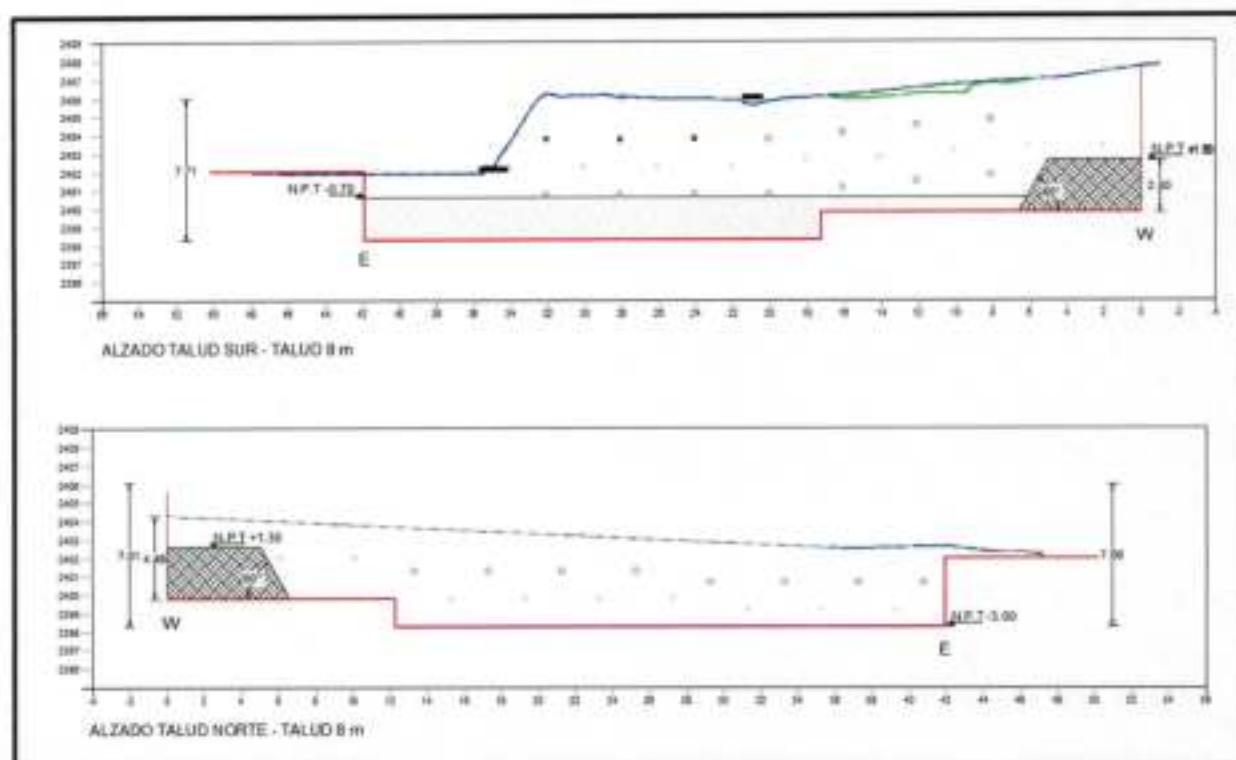


Figura 11. Niveles de excavación Etapa 3, alzados norte y sur, berma 5 m, talud 60°.

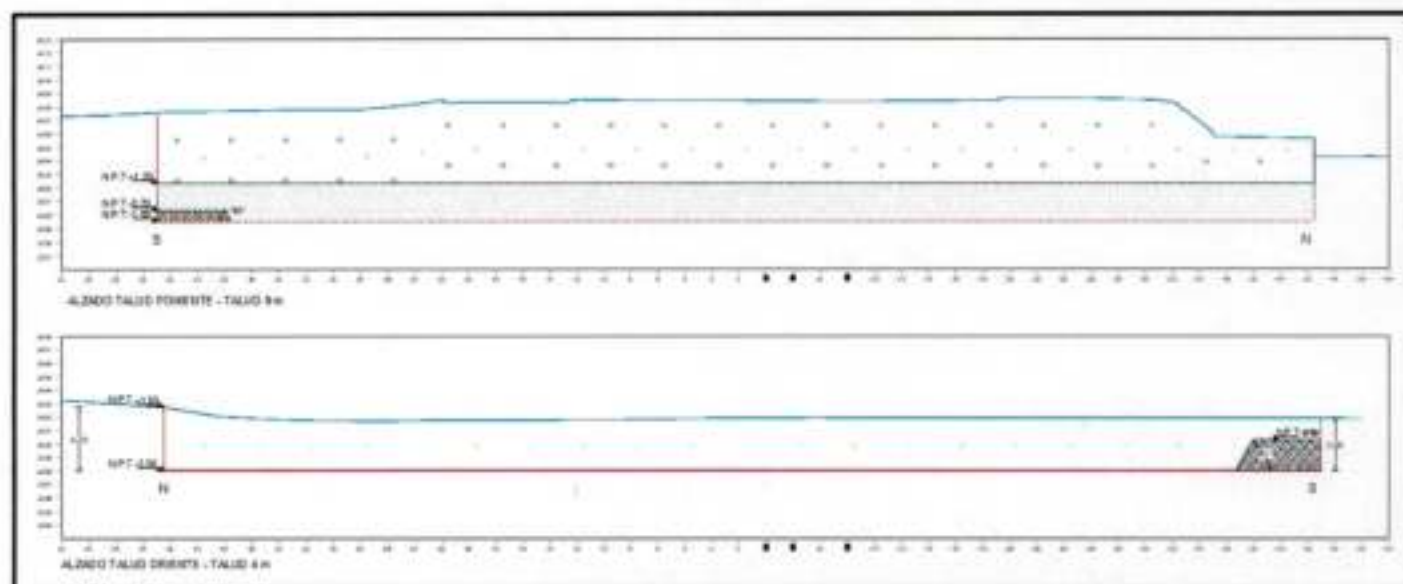


Figura 12. Niveles de excavación Etapa 3, alzados oriente y poniente, berma 5 m, talud 60°.

4. Finalmente, con la tercera etapa de excavación estabilizada, se llevará a cabo la última etapa llegando hasta el nivel máximo de excavación en todos los taludes, colocando en su totalidad las anclas y drenes faltantes, así como la protección de los taludes con concreto lanzado. (Figuras 13 a 15).

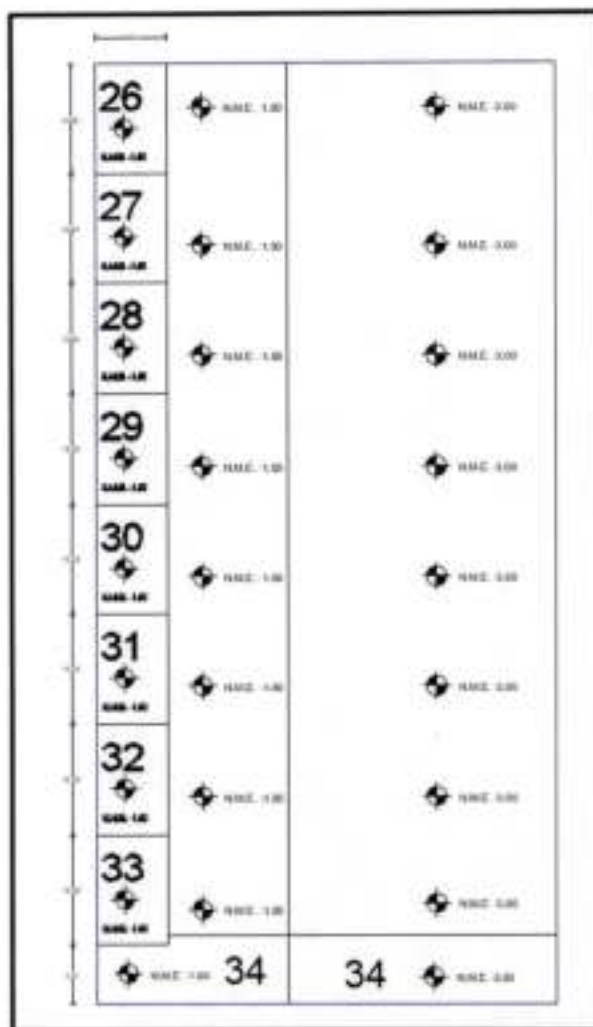


Figura 13. Secuencia de excavación en planta Etapa 4.

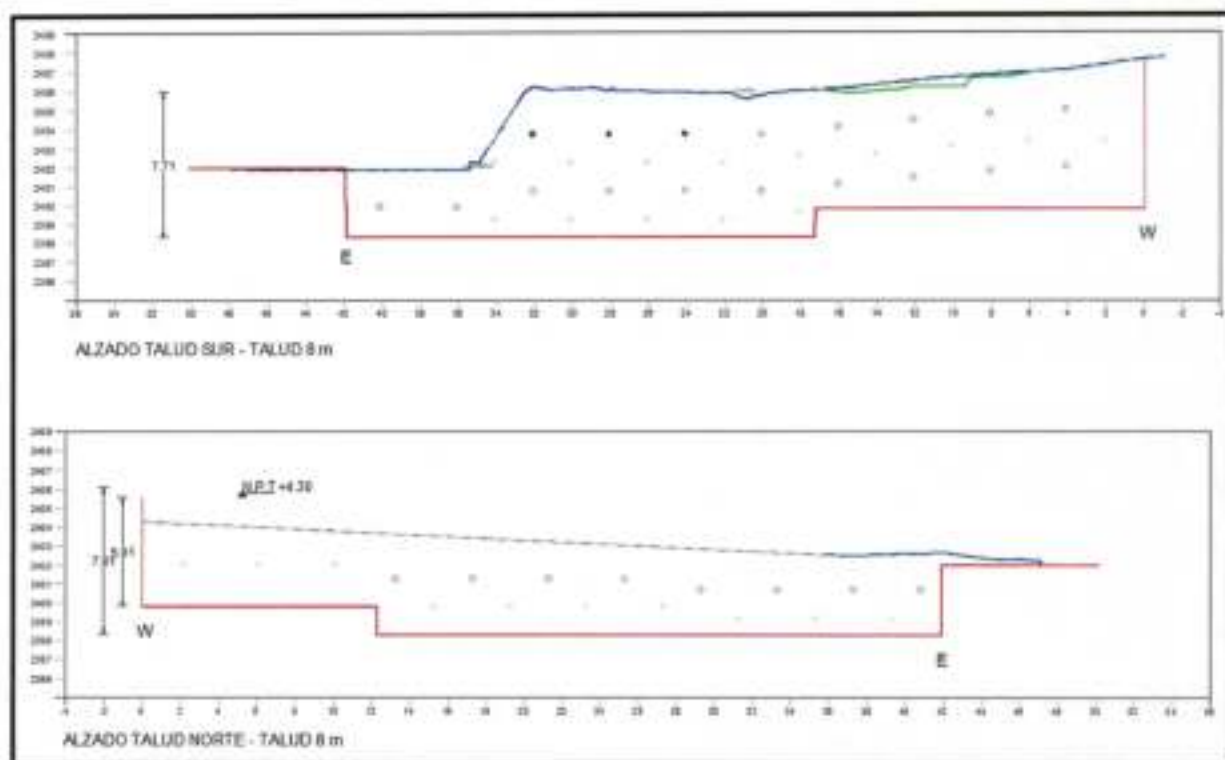


Figura 14. Niveles de excavación Etapa 4, alzados norte y sur.

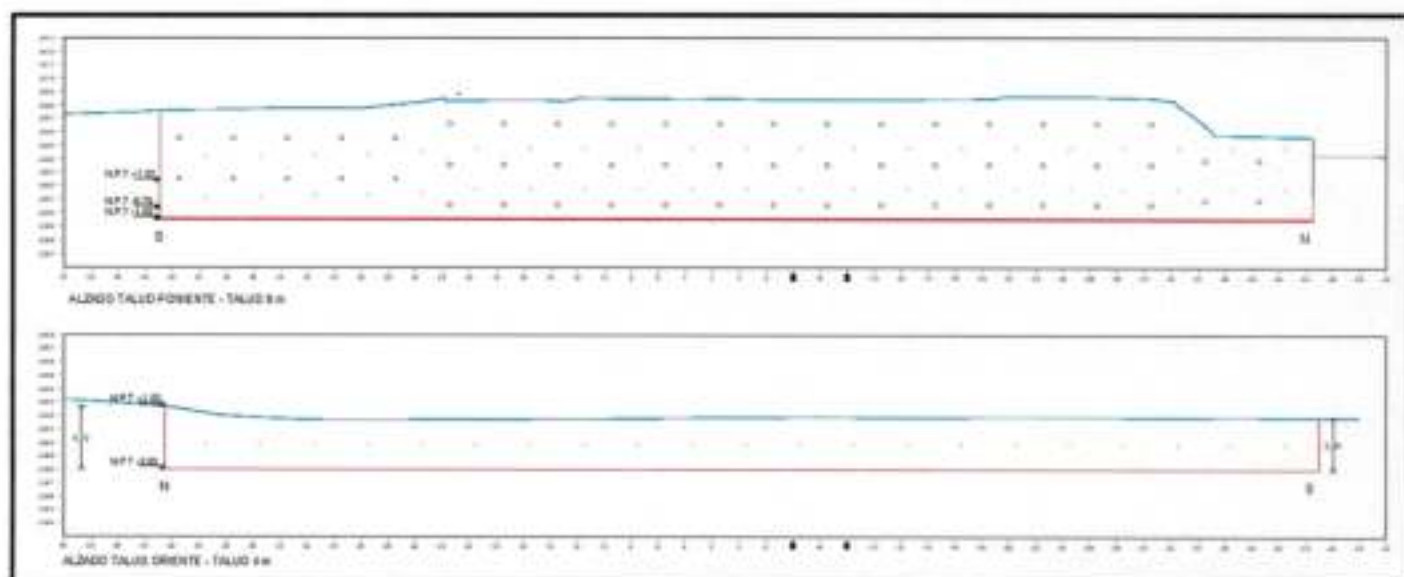


Figura 15. Niveles de excavación Etapa 4, alzados oriente y poniente.

3.1. Control.

Previo al inicio de la obra, se recomienda revisar el estado general de los inmuebles colindantes. También es recomendable contratar un seguro de responsabilidad civil, el cual ampare los riesgos inherentes a la construcción de la obra, por daños a terceros en sus bienes o en sus personas, vigente durante todo el desarrollo de la obra y hasta su total terminación.

Así mismo, se recomienda que un geotecnista inspeccione semanalmente la excavación durante su ejecución.

Durante todo el proceso de construcción se realizarán mediciones de nivel en cada sitio de columna, con referencia a un banco de nivel superficial dispuesto a 50 m del inmueble o cualquier otro reciente o de más de 2 niveles. Una vez que hayan colado las columnas del sótano, se marcarán las referencias en éstas.

En todos los casos, se realizarán mediciones semanales durante la construcción de la estructura; quincenales hasta su terminación; y semestrales durante los 2 años subsecuentes. También es recomendable realizar mediciones anuales y después de sismos intensos. Su interpretación quedará a cargo de un especialista en geotecnia.

4. Conclusiones y recomendaciones.

- 1.- Se concluye que la estabilización de los taludes garantiza un buen comportamiento de manera permanente.
- 2.- La excavación se deberá realizar por etapas de norte a sur, estabilizando cada etapa antes de continuar con la siguiente.
- 3.- El trazo de las anclas y drenes se deberá realizar con ayuda de equipo topográfico.
- 4.- Con la finalidad de agilizar los trabajos se podrán ubicar las anclas en su posición, colocando el armado para sus respectivos atraques y la malla electrosoldada para después colocar el concreto lanzado y después realizar los trabajos de perforación y colocación de las anclas, debiendo concluir en su totalidad los trabajos antes de continuar con la siguiente etapa.
- 5.- Se podrá excavar el núcleo central hasta su nivel máximo de excavación sin afectar las etapas de estabilización dejando bermas de 5 m con una pendiente de 60°.

Atentamente.

Geotecnum, S.A.S. de C.V.

Ing. Issac Barrera Carrillo
Ced. Prof. 8843041

5. Referencias.

Ref. 1 Estudio del subsuelo, Estacionamiento Cineteca, septiembre 2021, Geotecnum S.A.S. de C.V.

ANEXO 1.

PRUEBAS DE LABORATORIO.



JHV LABORATORIO

Luis Alberto Flores Rodriguez

JHV Geotecnia, Mecánica de Suelos y Control de Calidad

REGISTRO DE ENSAYE DE TRIAXIAL CONSOLIDACIÓN RÁPIDA (Tx Cu)											
PROCEDIMIENTO:		PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADA RÁPIDA (TX CU) ASTM D 4767									
Fecha de ensayo:	08-sep-21	Fecha de ensayo:	17/09/2021	Mostrador N°:	MC-01	Informe N°:	1				
Procedencia:	ESTACIONAMIENTO			Sondeo N°:	SM-1	Hoja N°:	1 de 3				
Obras:	CINETECA NACIONAL			Profundidad (m):	3						
Cliente:	GEOTECNUM SAS DE C.V.										
Equipo empleado:	Bco Para Ensayo Triaxial JHV-CT-01, prensa JHV-TX-01, báscula JHV-B-012, venier JHV-VER-01, balsa JHV-HDR-1, Recipiente Aluminio JHV-Tara-1										
Clasificación:	Arcilla con arena café-rojo con gravas hasta de una p/g. C.I. Muy Dura										

deformación en %

ESPESOR TANGENCIAL, kg/cm²

Realizó ensayo

Rafael Contreras Nazari

Nombre, firma y cargo

Revisó y autorizó

David Cortés Rodríguez

Nombre, firma y cargo

PBA	γ_{hs} kg/m³	γ_{hf} kg/m³	γ_{ss} kg/m³	γ_{sf} kg/m³	G _{so} %	G _{sf} %	e _v	e _f	G _s	G _f	σ_3 kg/cm²	$\sigma_1 - \sigma_3$ kg/cm²
1	1748	1740	1588	1400	25.8	24.8	0.765	0.754	80.8	80.1	0.580	15.91
2	1737	1888	1429	1511	22.1	25.0	0.738	0.834	74.1	97.3	1.080	17.14
3	1752	2191	1413	1750	24.8	24.8	0.747	0.430	79.3	105.8	2.080	21.29
PROM.	1748	1942	1412	1556	22.7	24.9	0.749	0.691	78.1	108.3	Ss +	2.469

INDICAR LA INTRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL AUTORIZADOR DEL LABORATORIO CENTRAL, JHV, A RETEL LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME DE REFERENCIA EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS REPORTADAS

CÓDIGO: JHV-PGEO-08	REVISIÓN: 1	ANEXO: JHV-PGEO-08-02	FECHA DE EMISIÓN: 13/01/2020	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 13/01/2020
------------------------	----------------	--------------------------	---------------------------------	--

Calle: Escorpión Mzn. 8 Lote 8 Col. Josefa Ortiz de Domínguez C.P. 55117 - Ecatepec de Morelos Estado de México

Tel. GG: 744 1051 419 - SG: 744 3261 562 - Oficina: (55) 15 62 00 57 E-mail: Laboratorio-JHV@hotmail.com

G. J. 165



JHV LABORATORIO

Luis Alberto Flores Rodriguez

JHV Geotecnia, Mecánica de Suelos y Control de Calidad

REGISTRO DE ENSAYE DE TRIAXIAL CONSOLIDACIÓN RÁPIDA (TXCU)			
PROCEDIMIENTO:		PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADA RÁPIDA (TXCU) ASTM D 4767	
Fecha de ensayo:	05-sep-21	Fecha de registro:	17/09/2021
Procedencia:	ESTACIONAMIENTO	Muestra N°:	MC-01
Obra:	CINETEC NACIONAL	Sondeo N°:	SM-1
Cliente:	GEOTECNIO SAS DE C.V.	Profundidad (m):	3
Equipo utilizado:	Bor Para Ensayo Triaxial JHV-CT-01, prensa JHV-TS-01, báscula JHV-B-002, sensor JHV-ME-01, sensor JHV-MOR-1, Recipiente Aluminio JHV-Tar-1		
Clasificación:	Arcilla con arena, café rojo con gravilla de 0.075 a 0.425 mm, C.I. Muy Dura		

PROB-1

CODIGO: JHV-GEOT-08	REVISADO: 1	ASESOR: JHV-GEOT-05-02	FECHA DE EMISIÓN: 13/07/2020
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 13/07/2020			

Calle: Escorpion Mzn. 8 Lote 8 Col: Josefa Ortiz de Dominguez C.P. 55117 - Ecatepec de Morelos Estado de México
Tel. GG: 744 1051 419 - SG: 744 3261 562 - Oficina: (55) 15 62 00 57 E-mail: Laboratorio-JHV@hotmail.com



JHV LABORATORIO

Luis Alberto Flores Rodriguez

JHV Geotecnia, Mecánica de Suelos y Control de Calidad

PROCEDIMIENTO:		REGISTRO DE ENSAYE DE TRIAXIAL CONSOLIDACIÓN RÁPIDA (Tx-Cu)	
		PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADA RÁPIDA (TX-CU) ASTM D 4767	
Fecha de ensayo:	08-sep-21	Fecha de ensayo:	11/09/2021
Procedencia:	ESTACIONAMIENTO	Muestra N°:	MC-01
Obra:	CINETECA NACIONAL	Sondeo N°:	SM-1
Cliente:	GEOTECNUM SAS DE C.V.	Profundidad (m):	3
Equipo utilizado:	Buz Para Ensayo Triaxial Camara Humida JHV-CT-01, prensa JHV-TX-01, termostato JHV-B-032, sensor JHV-VER-01, bomba JHV-HDR-1, Recipiente Humedo JHV-Tasa-1		
Clasificación:	Arcilla con arena, café rojo con preconsolidación de una plg., C.I. Muy Dura		


PROB-3

COORDO:	REVISADO:	AUSEJO:	FECHA DE EMISIÓN:	FECHA DE ENTRADA EN USO:
JHV-PO-00-08	1	JHV P-06-0-04-02	13/07/2020	13/07/2020


Calle: Escorpión Mzn. 8 Lote 8 Col: Josefa Ortiz de Domínguez C.P. 55117 - Ecatepec de Morelos Estado de México

Tel. GG: 744 1051 419 - GG: 744 3261 562 - Oficina: (55) 15 62 00 57 E-mail: Laboratorio-JHV@hotmail.com


ANEXO 2.
MEMORIA DE CÁLCULO.

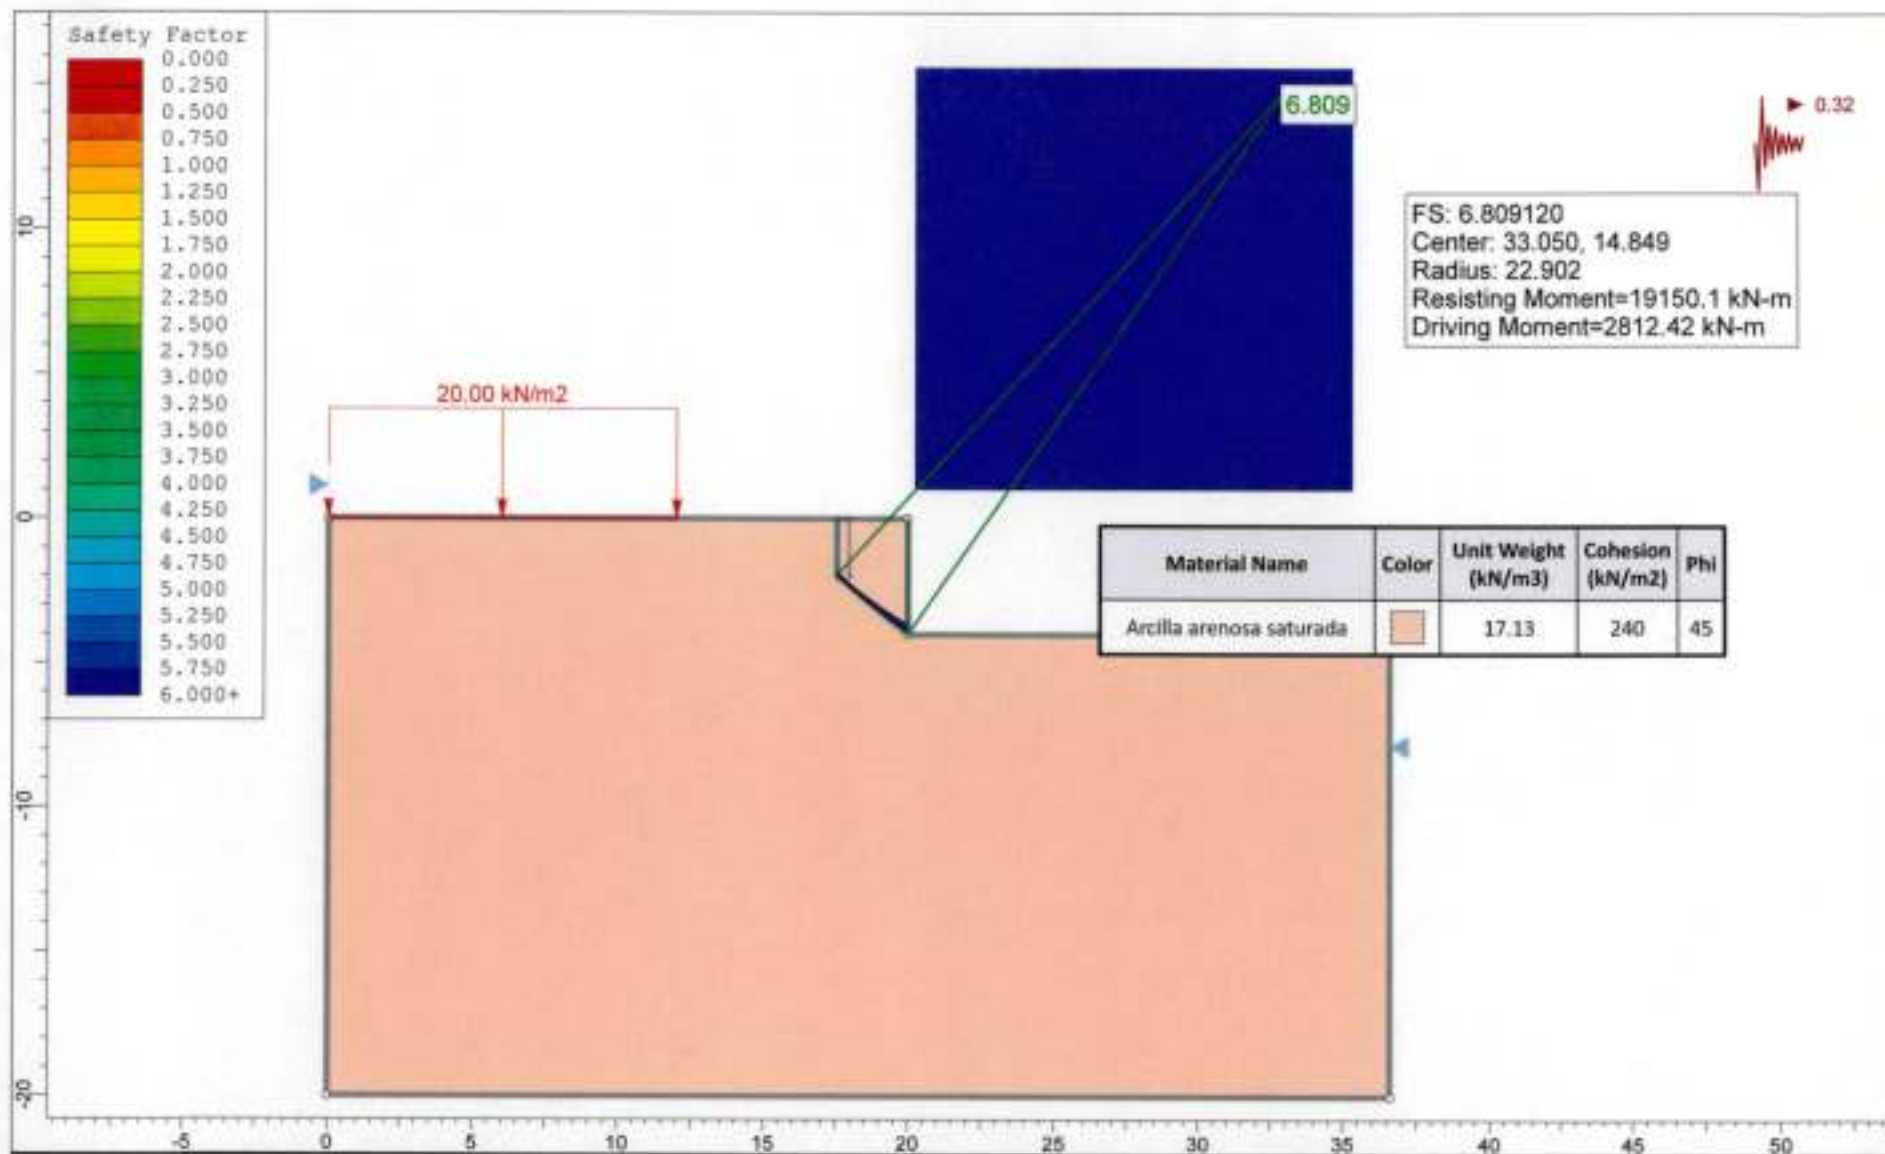

	Project			
	Excavación Estacionamiento Cineteca IV Sección			
	Analysis Description			
	Corte vertical 4 m y sismo en material saturado			
	Drawn By	Geotecnum	Scale	1:250
	Date	19/10/2021, 08:37:42 a. m.	Company	Geotecnum
File Name			Cineteca_Corte vertical_saturado 3m.slim	

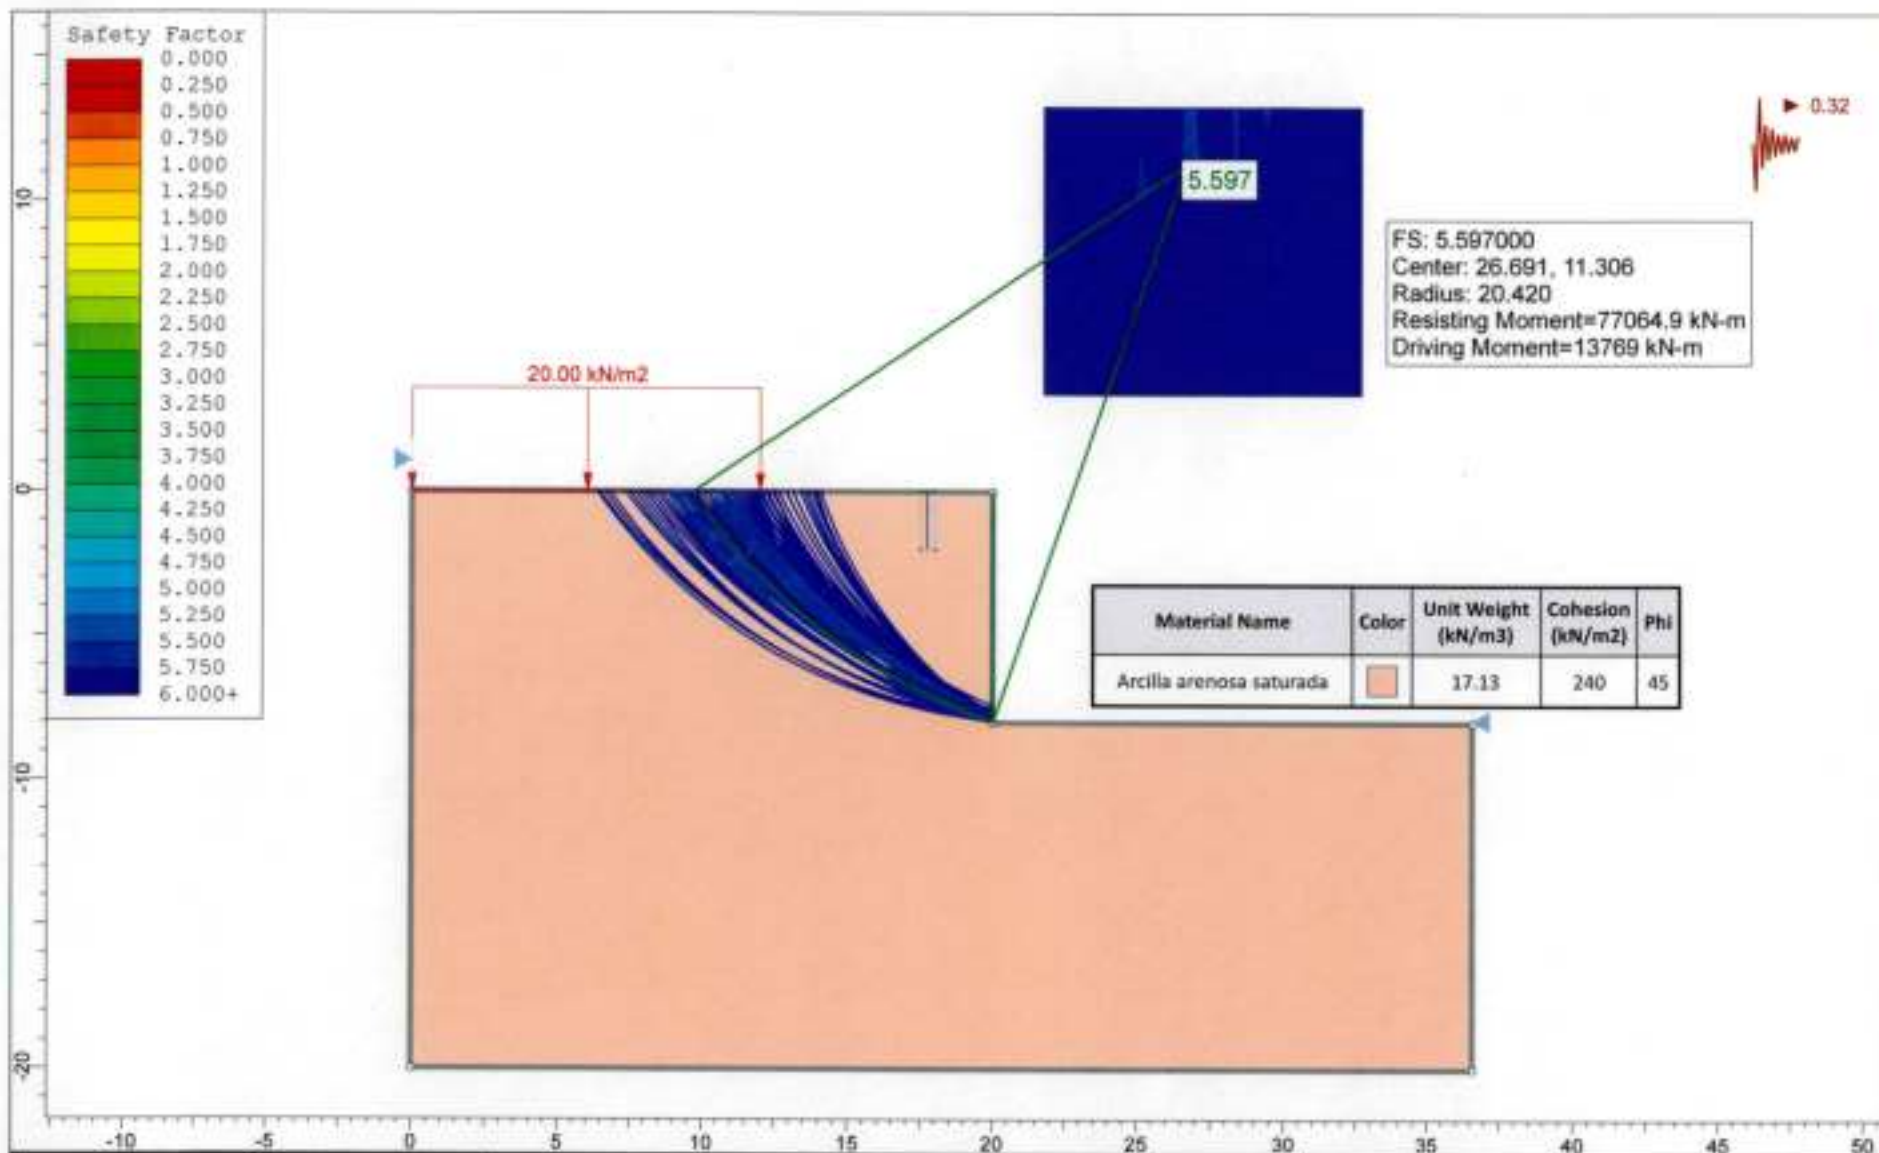

	Project			
	Excavodyn Estacionamiento Cineteca IV Secciy			
	Analysis Description			
	Corte vertical 8 m y sismo en material saturado			
	Drawn By	Geotecnum	Scale	1:250
Date		19/10/2021, 08:37:42 a. m.		Company
				Geotecnum
			File Name	Cineteca_Corte vertical_saturado 8 m.slim

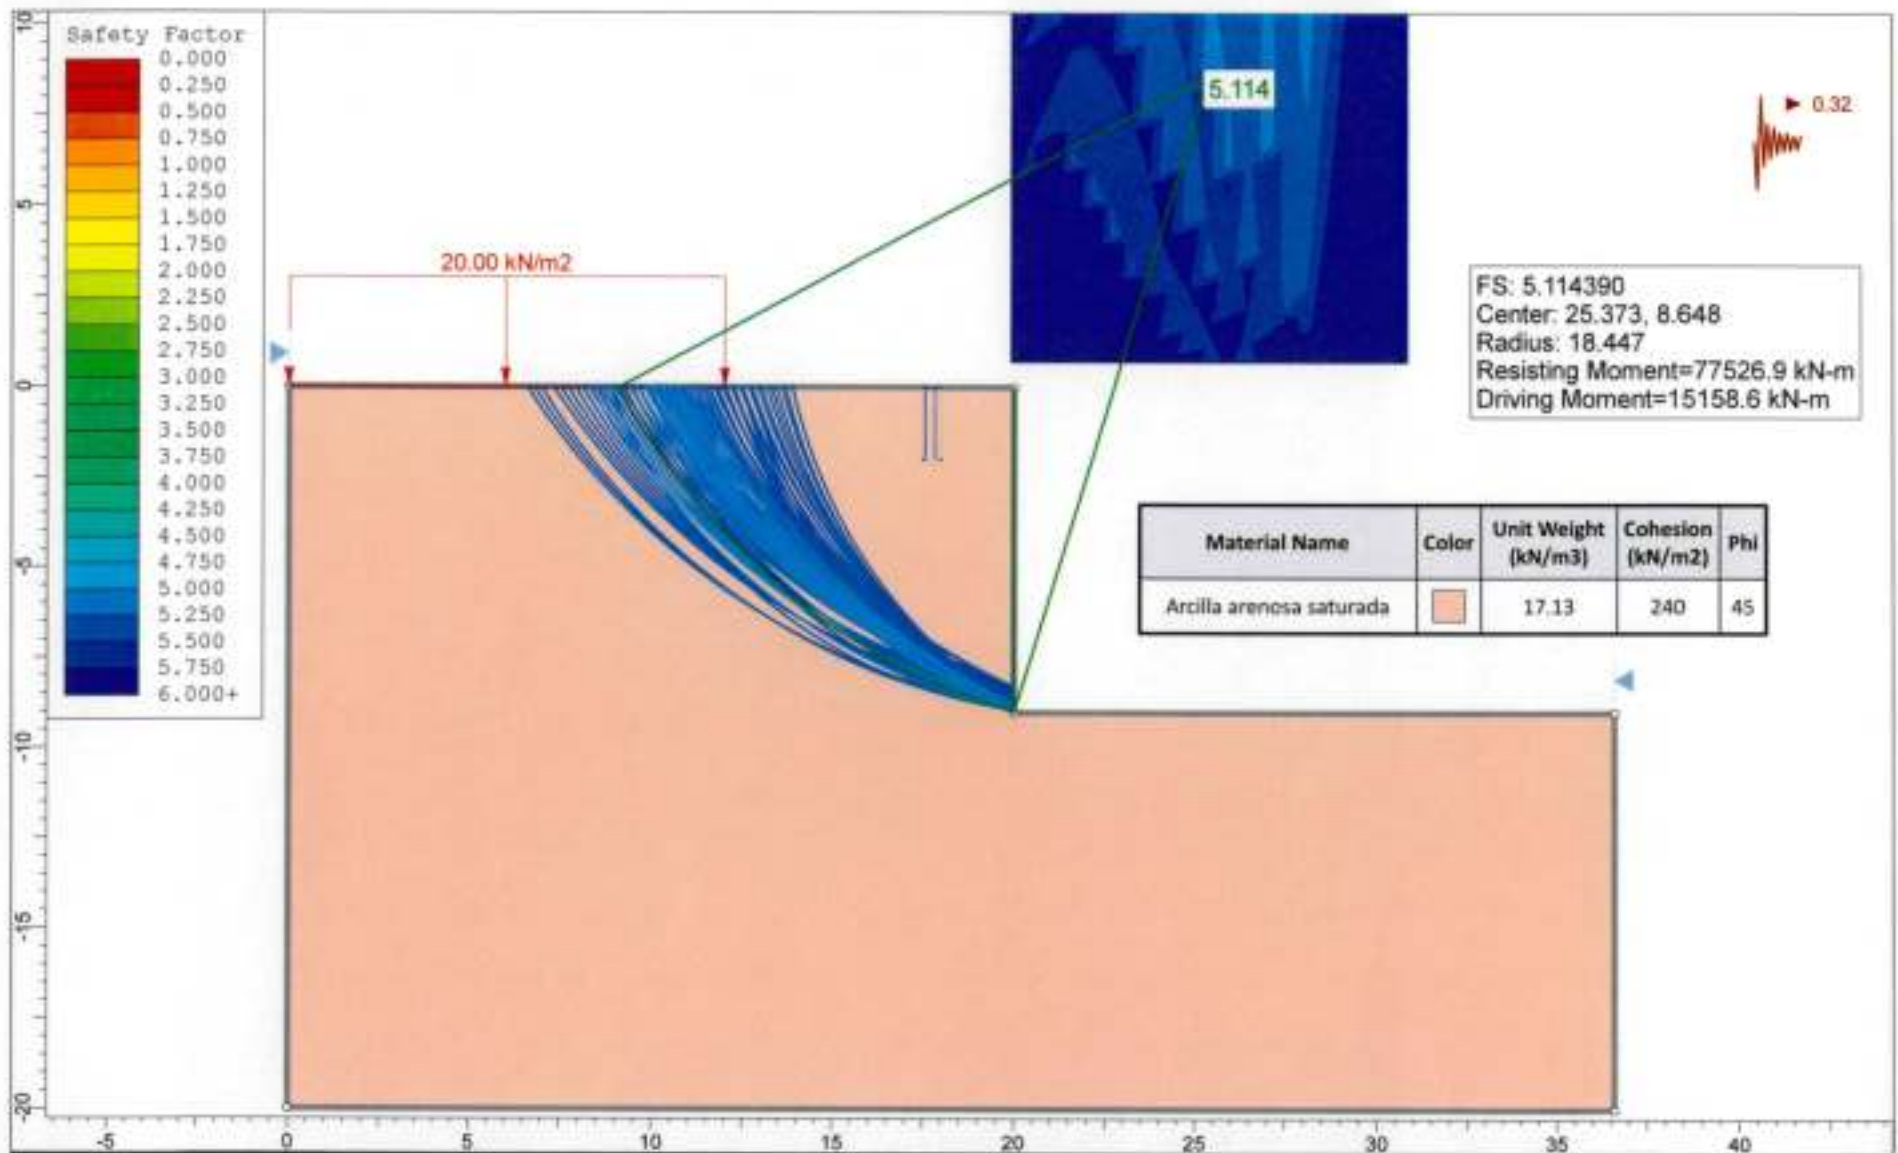

TOC science

SLIDEINTERPRET 6.000

Project				
Excavaci3n Estacionamiento Cineteca IV Secci3n				
Analysis Description				
Corte vertical 9 m y sismo en material saturado				
Drawn By	Geotecnum	Scale	1:200	Company
				Geotecnum
Date	19/10/2021, 08:37:42 a. m.			File Name
				Cineteca_Corte vertical_saturado 9 m.slim

ESTADIONAMIENTO CINETECA IV SECCION CHAPULTEPEC

Revisión de las FS con anclajes y alumo. Taled vertical de 5 m de altura

Fig. 5.52? (Continued)

Circuitos de Auto

Row	Burn (m)	Incl (°)	F (T)	Sep h (m)	F/in (T/m)	Pv (T)	H _v (m)	M _b (m)	T- (T- m)	M _a (m)	T- (T- m)	H _a (m)	T- (T- m)	F ₀
1	10.38	19	21.26	4	5.32	0.02	5.24	95.09						
2	13.38	19	21.26	4	5.32	0.02	5.24	71.08						
							SRAM	126.14		1402.57		7085.75		5.987

Revisión de las FB con anclajes y sismo. Talud vertical de 9 m de altura

Fig. 5. T14 Derivatives

Cheng et al.

Weld	Drum (in)	Insul (")	F (°F)	Sep k (in)	Flow (lb/hr)	P ₁ (PSI)	P ₂ (PSI)	Mo (in)	Mo (in)	Mo (in)	Mo (in)	Mo (in)	Mo (in)
1	9.307	10	21.28	4	5.32	0.82	0.24	44.21					
2	11.307	10	21.28	4	5.32	0.82	0.24	46.18					
3	14.307	10	21.28	5	4.28	0.74	4.19	46.82					
							51.868	105.31	1545.22	7002.84	5.121		

Andas de varilla de acero

fy = 4200 kg/cm²

$$F_{95} = 0.5$$


Diarm. Nºm	Diarm. Meior (m)	Diarm. Meior (cm)	Área (cm ²)	Resistência à tração (T)	Seperação horizontal (mm)	F/esp (T/m)	h (m)	F _h (T/m)	F _h (T/m)
2°	0,8446	2,15	3,63	9,15	4	2,29	10	0,40	2,25
1 1/4"	1,0725	2,72	5,81	14,64	4	3,68	10	0,54	3,60
1 1/2"	1,2931	3,28	8,45	21,29	4	5,32	10	0,92	5,24

ANEXO 3.

PLANOS.



ALZADO TALUD PONIENTE - TALUD 8 m




ALZADO TALUD ORIENTE - TALUD 4 m




ALZADO TALUD SUR - TALUD 8 m



ALZADO TALUD NORTE - TALUD 8 m



TALUD 8 m



TALUD 4 m



CUNETA

Especificaciones




Protección del talud mediante una pantalla de concreto lanzado $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10.


Anclas de fricción de varilla de acero de 1 1/2" diam. en barrenos de 4" diam. dispuestas con una pendiente descendente de 10° respecto a la horizontal.
 Mezcla de inyección cemento-agua-floculante de 250 kg/cm^2 .
 Abragues de concreto $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ armado con $\text{va} \# 3 @ 15 \text{ cm}$ en ambos sentidos.
 Presión de inyección 5 kg/cm^2 .
 Placa de reacción de 25 x 25 cm $\text{e} \times 1/2"$.
 Separación horizontal: 4 m Separación vertical: 3 m

Dren de penetración transversal de PVC hidráulico oed. 40 de 2" diam. en barrenos de 3" diam. dispuesto con una pendiente ascendente de 15° respecto a la horizontal.
 Separación horizontal: 4 m

Dren capa de 1 m de largo de tubería de 1" de PVC hidráulico oed. 40, en barrenos de 1 1/2" de diam. dispuesto con una pendiente ascendente de 15° respecto a la horizontal.
 Separación horizontal: 4 m

Se deberá colocar una cuneta al pie del talud y una contra cuneta en la corona del talud para recolectar y dar salida al agua pluvial.







ALZADO TALUD SUR - TALUD N



ALZADO TALUD NORTE - TALUD S



ALZADO TALUD OESTE - TALUD E




ALZADO TALUD OESTE - TALUD E

1
2
3
4
5
6
7
8
9


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Fecha:



Ubicación del Proyecto



Plan de la Obra



NOTA GENERAL:
Este documento es propiedad de la Secretaría de Obras Públicas y Transportes del Estado de México. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado.

APROBADO:
El Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano
El Jefe de la Oficina de Ingeniería y Diseño
El Jefe de la Oficina de Construcción y Mantenimiento

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Secretaría de Obras Públicas y Transportes
Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano














PROYECTO: Construcción de la Carretera de la Zona Industrial de la Ciudad de México.
SECTOR: Obras Públicas y Transportes.
FECHA: 10/01/2010.
HOJA: 1 de 1.





ESCALA: 1:500




EX-CO-PAR-08

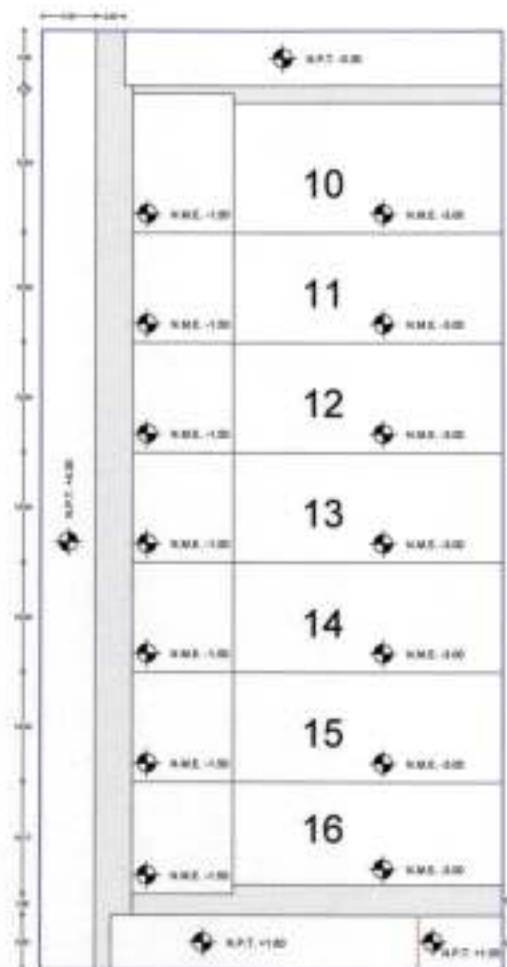

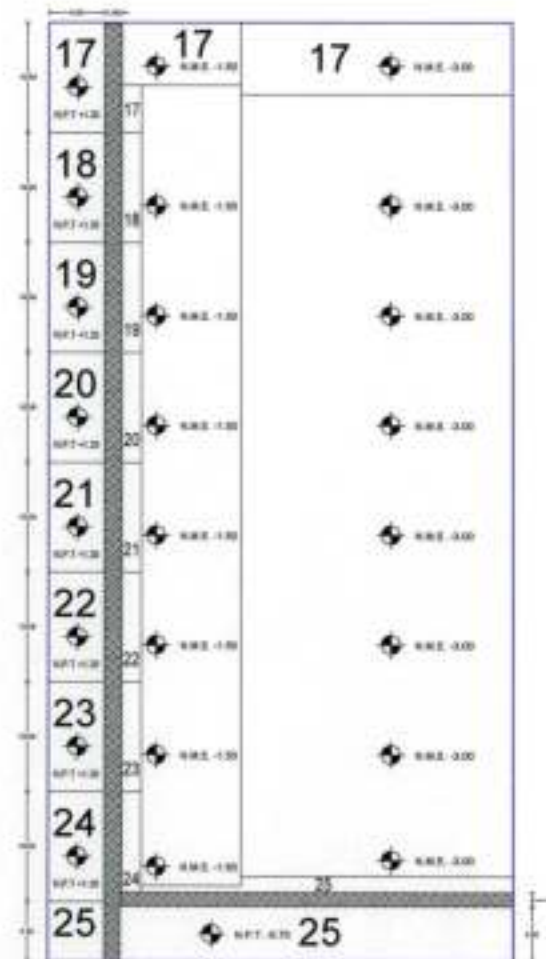



26	W.M.E. -1.00	W.M.E. -0.00
27	W.M.E. -1.00	W.M.E. -0.00
28	W.M.E. -1.00	W.M.E. -0.00
29	W.M.E. -1.00	W.M.E. -0.00
30	W.M.E. -1.00	W.M.E. -0.00
31	W.M.E. -1.00	W.M.E. -0.00
32	W.M.E. -1.00	W.M.E. -0.00
33	W.M.E. -1.00	W.M.E. -0.00
34	34	34



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
EN EL CARRILLO DE LA CALLE DE LA PAZ
