

- 1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
- 2. Aprobación del Orden del Día
- 3. Protocolo
 - 3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección de Construcción de Obras Públicas
 - 3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité
- 4. Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con la Misma
- 5. Propuesta de Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2019
- 6. Aprobación de las Actas de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria y Segunda Extraordinaria de 2018
- 7. Seguimiento de Acuerdos
- 8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 8.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 8.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 8.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 8.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 8.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 8.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 8.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 8.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 8.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
- 9. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"
 - 9.1 Listado de Casos número DCOP" B" /01/2019
- 10. Asuntos Generales



1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



2. Aprobación del Orden del Día



3. Protocolo

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2019



3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
SUPLENTE	ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
SECRETARIO TÉCNICO	ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" VOCAL TITULAR	ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
VOCAL SUPLENTE	ING. RAÚL MARQUEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" VOCAL TITULAR	ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
VOCAL SUPLENTE	ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNANDEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" VOCAL TITULAR	ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
VOCAL SUPLENTE	ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" VOCAL TITULAR	M. en I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE	ARQ. LEOPOLDO JORGE RAMOS SAN MARTÍN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	Dr. en D. ROBERTO BERISTAÍN SALMERÓN
VOCAL SUPLENTE	ING. SALVADOR FONSECA LARIOS



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN GENRAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA	LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ
RGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASESOR	MTRO. VICTOR EDGAR ARENAS
SUPLENTE	ARQ. ÁNGEL LUZ VELÁZQUEZ
DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SOBSE INVITADA	C.P. LORENA ISABEL VILLARRUEL SALAZAR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SOS INVITADA	LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA EN LA SOS INVITADO	LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCOP INVITADA	LIC. DANIELA ROJAS ALCÁNTARA
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIO ASESOR	ING. ANTONIO PATIÑO VÁSQUEZ



4. Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Servicios Relacionadas con la Misma

Obra 1	Autorizada para Pública de pesos)	Monto Máximo Total de cada Obra Pública que podrá adjudicar mediant invitación restringida a cuando meno tres concursantes (Miles de pesos)			
Mayor de	hasta				
-	21,210	268	2,071		
21,211	42,300	319	2,545		
42,301	70,490	371	2,998		
70,491	140,980	464	3,442		
140,981	211,480	536	4,297		
211,481	352,470	598	4,905		
352,471	493,460	711	5,698		
493,461	634,440	804	6,502		
634,441	845,930	896	7,429		
845,931	1,057,400	1,020	8,398		
1,057,401	1.409,890	1,123	9,490		
1,409,891	2,819,730	1,247	10,593		
2,819,731	-	1,607	11,747		

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía. Los montos de actuación deberán ajustarse al presupuesto autorizado por el Congreso.

CAPÍTULO IV DE LAS TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

- **Artículo 37.** Las erogaciones por concepto de transferencias y aportaciones con cargo al Decreto, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, en la Ley de Presupuesto y demás normatividad aplicable, apegándose a los siguientes criterios:
- I. Las destinadas a cubrir desequilibrios financieros de operación de las Entidades, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
- II. Se orientarán preferentemente hacia sus actividades primordiales a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
- III. Las Entidades beneficiarias de aportaciones deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr en el mediano plazo, mayor autosuficiencia financiera y la disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales;
- IV. Sólo se otorgarán cuando se precisen claramente los programas, destino y objetivos de las mismas, y
- V. En caso de que los ingresos propios de las Entidades rebasen la estimación original anual, se cancelen actividades institucionales y metas o se generen economías, la Secretaría podrá reducir el monto de las aportaciones y transferencias originalmente previstas.





CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios

Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	200	686
15,000	30,000	228	988
30,000	50,000	257	1,286
50,000	100,000	287	1,587
100,000	150,000	314	1,892
150,000	250,000	357	2,285
250,000	350,000	386	2,573
350,000	450,000	416	2,731
450,000	600,000	443	3,028
600,000	750,000	457	3,187
750,000	1,000,000	501	3,486
1,000,000	•	528	3,643

			s Públicas y Servicios Relac		T		
autorizado para total de c realizar obras obra púb públicas y servicios que pod relacionados con las adjudica mismas directame Mayor de Hasta		realizar obras úblicas y servicios lacionados con las mismas Obra pública que podrá adjudicarse directamente Cada serv relacionado o pública que adjudicarse dir		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obr pública que podrá adjudicars mediante invitación a cuando menos tres personas		
				Dependencias y Entidades			
	15,000 318		158	2,840	2,205		
15,000	30,000	394	200	3,151	2,363		
30,000	50,000	474	237	3,626	2,840		
50,000	100,000	549	273	4,414	3,306		
100,000	150,000	631	318	5,201	3,939		
150,000			356	5,990	4,725		
250,000			432	6,940	5,201		
350,000	450,000	943	474	7,565	5,658		
450,000	600,000	1,107	549	8,993	6,775		
600,000	750,000	1,262	631	10,239	7,726		
750,000	1,000,000	1,413	712	11,503	8,665		
1,000,000		1,500	789	12,912	9,763		

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.

ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		88,606,172,769
04 Gobernación		22,693,644



5. Propuesta de Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2019



Gobierno de la Ciudad de México

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SUBCOMITÉ DE OBRAS

CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2019

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
OLOIGIA	WILS	DIA	пока
1 ^a	FEBRERO	13	13:00
2 ^a	FEBRERO	28	13:00
3ª	MARZO	28	13:00
4 ^a	ABRIL	25	13:00
5ª	MAYO	30	13:00
6ª	JUNIO	27	13:00
7ª	JULIO	25	13:00
8ª	AGOSTO	29	13:00
9ª	SEPTIEMBRE	26	13:00
10ª	OCTUBRE	31	13:00
11ª	NOVIEMBRE	28	13:00
12ª	DICIEMBRE	11	13:00




6. Aprobación de las Actas de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria de 2018

ACTA DE LA 12º SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día 13 de diciembre del año 2018. en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---Preside el acto Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D": Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Reyo Filorio; Como suplente: Ing. Marina Ortega González. Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "C3"; Como Asesor: Arg. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitados: Lic. Gabriela del Olmo Albarrán, Directora General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Emmanuel García Hernández, Representante de la Dirección General de Asuntos 2. Verificación y Declaratoria de Quórum. ------El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. El Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes. ------3. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2018. ----------El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018, cede la palabra al Ing. Joaquín El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "recibimos posteriormente a la recepción de la carpeta de la Sesión, por separado una corrección, en que consiste la corrección por

favor." ------





El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "En el folio 35 en lo que respecta, es el segundo" renglón es para el Tribunal de Justicia, ya había una conciliación del control de avance físico y financiero y en este ejercicio 2014, se tenía un anticipo del 26 punto y algo porciento, ahora esta del 30, 31 porciento; ya tenían desde la Carpeta de la Sesión pasada una conciliación de esos valores, que, por dos años nunca cuadraron y al final, bueno, tuvieron que corregirlo, hacer congruente los pagos, el avance financiero, el avance físico, las estimaciones y hoy nuevamente hay otro ajuste, eh, caray de por sí ya era un problema grave el hecho que no se pagara la constructora en tiempo y forma para que hubiera avance de la obra, ha estos días está poco más del 50% de la obra, el no haber pagado a tiempo a la constructora, obligo a extender en tiempo y monto el contrato de la supervisión ya por 18 millones de pesos, todavía se nos pide un voto de confianza para ampliar más, más el contrato de la supervisión, que está pasando con el control de avance físico y financiero, tanto de supervisión y construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes, que está pasando, llegamos ya a unos números que cuadraban en carpetas anteriores y ahora vuelven a mover el anticipo dejando nuevamente la duda, se pagó o no se pagó, si se pagó hoy el avance no va más del 50% tanto Físico y Financiero, entonces que es lo realmente se ha pagado a la constructora para que siga avanzando. Por ahí nos deben una visita a la obra para constatar con lo que se tenga de números generadores, etcétera, si en realidad está haciendo su trabajo la supervisión, porque la supervisión reporta ya prácticamente el 100% de avance, del 50% de construcción. Caray que desafortunado que en cada Carpeta estén presentando valores diferentes y que en cada Sesión, les tenga que pedir por favor sigan una coherencia en avances físico y financiero, sé perfectamente que es difícil cuando hay tantos convenios modificatorios, pero el hecho que la Secretaría de Finanzas no pagara a la constructora, ya nos costó un pago extra de 18 millones de pesos a la supervisión, si son tan amables tómense su tiempo, tal vez es un error, tal vez están llevando dos contabilidades como alguna vez se los demostré, pero sean claros en sus cuentas, no podemos arrastrar de una a otra administración algo así, gracias".-----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz. ------El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz responde, ya se había aclarado este punto de manera precisa, el Area de Finanzas tarda en realizar los pagos hasta seis meses, igualmente revisaremos. El anticipo sigue siendo lo mismo, este reduce conforme se hacen las estimaciones. ------Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra


el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos
continua con el Orden del Día.
5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte
al 30 de noviembre de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra
el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos
continúa con el siguiente punto.
5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018
presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2018, señala que
en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta
si existen comentarios o preguntas, al no haberlos continúa con el siguiente punto.
6. Asuntos Generales.
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores si en este momento alguien quiere hacer uso
de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, cede la palabra a la
C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo.
La C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo comenta, a partir de la 5a Sesión
Ordinaria, solicité la actualización de las Actas de las reuniones de este Subcomité, a
fin de realizar el reporte que la Contraloría Ciudadana nos requiere, no sé el motivo por el cual no he recibido dicha información; reitero la solicitud esperando contar con la
información, por medio de correo electrónico o impreso
Se paga por una supervisión, pero quien supervisa a los supervisores, básicamente
observo en los informes de las sesiones, obras que quedan inconclusas o ma
terminadas, se cobra o se paga a la empresa una remuneración sin que se lleve a
efecto la supervisión adecuada de la obra, como en el caso de los módulos de
participación ciudadana que en su momento ya mencioné, a la fecha trabajan sin luz
dando servicio a diversos programas, la Secretaría de Obras es simplemente
Administrativa o se le pagan salarios para que hagan labores operativas es una duda
que tengo, debido a que si contratan empresas que hacen supervisión entonces la
Secretaría de Obras y Servicios que hace.
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores menciona, respecto a las Actas se tiene un
atraso de dos Sesiones, debido a que se ponen a consideración y aprobación del Pleno
en las Sesiones Ordinarias del Subcomité; le haremos llegar las Actas que ya se
encuentren debidamente requisitadas, por medio de correo electrónico, igualmente se
subirán al portal de la Secretaría de Obras y Servicios para ser consultadas. Cede la
palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio
El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta, "no esté, desde el momento en que tenemos
voz y voto amparados bajo la Ley de Participación Ciudadana, están obligados a
presentarnos impreso el documento en donde nosotros plasmamos nuestras rubricas y
firmas, no es excusa, si no van a hacernos caso usaremos al área Jurídica de la
Contraloría General para que les vengan a leer el reglamento, leyes y todo el marco
jurídico, que les obliga, a Transparencia, a facilitarnos esos documentos firmados; yo
sé que tienen mucho trabajo, no para dirigir obra si no para contratar esté, construcción
de obra porque no dirigen nada, pero háganse su tiempo por favor la Ley está de
nuestro lado y por todo un año no he recibido, ni tampoco Patricia ha recibido copia

impresa con nuestras firmas en esos documentos, es nuestro derecho estamosparticipando y tenemos voz y voto, gracias". -----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores cede la palabra al Arq. Ángel luz Velázquez. ---El Arq. Ángel luz Velázquez menciona, nos han hecho llegar una serie de convenios que no están reflejados en el informe presentado para este mes, afectando monto de contratos, como periodo de termino, por lo cual el informe no cuenta con la credibilidad necesaria para su análisis; realizamos una compulsa y no están asentados todos los convenios que últimamente nos han hecho llegar. ------El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores cede la palabra al Lic. Israel Benítez Hernández. -----El Lic. Israel Benítez Hernández responde la parte de los reportes enviados a la Contraloría Interna en la Secretearía de Obras y Servicios, son los convenios que han solicitado cada una de las áreas operativas. Aprovecho el espacio para invitar a las propias áreas, actualicen sus reportes de cada uno de los contratos de acuerdo a los convenios que se han formalizado, para estar en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la Contraloría. -----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta nuevamente si existen más comentarios, cede la palabra a El Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----El Ing. Joaquín Reyo Filorio "voy a retomar el tema de la cuestión peatonal en el área de Pantitlán. Caray caray, caray habíamos llegado a la conclusión de que los puentes peatonales tradicionales debido al comportamiento del suelo en esa zona de la Ciudad. ya no eran útiles, inclusive las modificaciones de urbanización en la zona, dejaban fuera de funcionalidad algunos puentes; se les pidió algunas alternativas, se les propuso otras, la única solución que tenemos para acceder a la estación del metro Pantitlán la Línea 5, es la construcción de una banqueta en la vialidad Alberto Branif, hablamos largo y tendido se trajo fotografías, firmas de los vecinos solicitando atención al problema, ya todos convencidos que los puentes prácticamente estaban desalineados y desnivelados, he, pues solamente se dedicaron a pintarlos, a barrerlos y colocar un poquito de cemento, hablamos de una falla estructural en el único puente que es funcional para los vecinos entre dos colonias, Aviación Civil y Pantitlán, tiene un retén que es estructura porque es varilla de acero embebida en concreto, es estructural, que está rota por movimientos sísmicos, estas retiene el apoyo de las escaleras del lado de Aviación Civil y que prácticamente las escaleras se convirtieron en un resorte, tienen resonancia, eso lo sabemos qué es lo que sucede cuándo hay resonancia en una estructura y el efecto que tiene en el concreto, que es un material frágil, la plasticidad se la da el acero, bueno es estructura, porque si durante dos años estamos comentando el mismo problema, mandan a pintar y a poner unas pistas para que puedan subir sus bicicletas por escaleras que están desalineadas y desniveladas, caray. He, quedaron de hacer un recorrido de la Contratación de Construcción de, ah. perdón de la Dirección de Construcción de Obra, para, para respaldar que ya no era solución esos puentes y que se tenía que buscarse otras viabilidades, inclusive el ancho de los pasillos de puente, ya no cumplen con la demanda que solicitan los vecinos, no hace falta más que estar una hora por la tarde para darse cuenta que dos personas no caben, una en cada sentido sobre el pasillo del puente, porque no hay

sensibilidad, he, les hemos pedido el apoyo, es que si es SEDUVI, que si es Dios o el jefe de Gobierno, caray son dos años en los cuales se pudo haber construido una banqueta simple de 150 metros, si se ha demolido banquetas en buen estado para construirlas sobre Zaragoza, que costaba, que costaba construir esta pequeña banqueta, ninguno, lo que pasa es que no tienen sensibilidad; venimos a traerles la demanda ciudadana porque gastaron todas instancias, la administración que sale se caracteriza porque no nos escuchaban, les dieron vueltas, hay oficios a como para tapizar esta habitación, con fechas de hace seis años y todavía les traigo el caso con fotografías, explicaciones y siguen en esa actitud, caray, caray este, ya ni siguiera me, mejor no me dirijo a la Contratación de Construcción de Obra, perdón a la Dirección de Construcción de Obra, mejor me dirijo al nuevo Director General de Obras Públicas. Es sensibilidad hay casos inclusive que ya se consideran como Discriminación Social. Para Santa Fe su edificio que construyeron, eh algunos estúpidos en una barranca, hubo un contrato multimillonario y multianual, y para una simple banqueta para la gente que está sosteniendo a la ciudad con su trabajo en la zona de Pantitlán, hay oídos sordos eh, de acuerdo a lo que dice Andrés Manuel, que es nuestro presidente, al que lo vemos con tanta familiaridad porque está hablando de todos nuestros problemas. nada más queremos sensibilidad y atención, no son obras costosas; alguna vez hasta me burle del ingeniero Soto, que quieres que yo desarrolle el sofisticado proyecto de ingeniería para resolver una banqueta, que hay espacio para colocarla, que quieres que yo me aviente el cálculo, el catálogo de conceptos o que, pues yo veo que no dirige nada, van a contratar a una supervisión o a una empresa para que haga el trabajo del proyecto, luego a una supervisión par que alguien la construya. Caray es, no estamos para estar desperdiciando los pocos recursos que nos dejaron, Juan Carlos en su calidad de Director General de Obras Públicas, simple sensibilidad con los vecinos. con nuestros conciudadanos, es únicamente lo que pedimos; es más me arrepiento de haber participado, no quiero una respuesta hablada, de forma verbal ni escrita porque me canse de meter oficios exigiéndoles que hicieran su trabajo, nada más acérquense, ya se le describió el problema aquí en dos años, se les trajo firmas, y vo creo que lo que opine la ciudadanía pues les tiene sin cuidado, total, mientras haya presupuesto para pagar nomina yo creo que es suficiente, espero algún día volver a llamarles Directores de Construcción de Obra y no Contratadores de Construcción de Obra, por favor señor Director, gracias." -----

En el caso de los convenios entregados a la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios, regularizaremos la Información de dichos convenios. Yo les pediría que se adicionen otras columnas una de contratos y otra de convenios para informar de lo que se está haciendo. ------Respecto a la solicitud del Ing. Joaquín Reyo Filorio, Contralor Ciudadano, me estoy incorporando, ayer vi la propuesta de la sesión, vi su caso y lo vamos a atender a la brevedad posible, tal vez no corresponda o competa a la Dirección General de Obras Públicas la construcción de esa parte de las banquetas, pero buscaremos dialogar con la instancia correspondiente para que realicen una revisión y valoración; si así se considera pertinente se construirá la banqueta. ------En el caso del puente peatonal revisamos que es lo que esta pasando estructuralmente y damos una solución. La idea de este Gobierno es apoyar a la ciudadanía y en ese sentido vamos a estarlos apoyando, estaremos al pendiente de cualquier cosa. ------El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores cede la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yañez. El Lic. Alfredo Garduño Yañez comenta el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta mensualmente el informe de Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad. Una de las consultas por parte del Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, Ing. Francisco Reves Rico, es conocer porque seguimos teniendo información de ejercicios 2007 y 2008 en estos supuestos. Los casos tienen vigencia y necesitamos que actualicen su información: dejo la relación marcada para pronta referencia, y tengan elementos para realizar una búsqueda en sus expedientes, para conocer la situación que guarda el impedimento o la solicitud que hacen las Empresas a las Dependencias ya que se encuentran los expedientes en la Contraloría General en donde está incluida la Dirección General de Obras Públicas. Como referencia tenemos a la Empresa Darvio Construcciones S.A. de C.V. la cual convoca a la Dirección General de Obras Públicas, con la resolución 05707, el expediente de la Contraloría General es CG/DRI/RI-57/2007; así un total de 10 casos en distintos Ejercicios. La encomienda por parte del Comité Central es retirar estos informes y que ustedes estén en el entendido de que han hecho bien su trabajo, darles salida a todos porque estamos hablando de Dependencias que están desapareciendo, Delegaciones que cambian de nombre por Alcaldías; es por eso que pedimos su apoyo. Si fuera posible contar con la información antes de la Sesión del Comité Central, que se realizará el próximo 19 de diciembre de 2018 y tuvieran los elementos requeridos para poder exponer los motivos, se los voy agradecer. Nada más me resta decirles que hay una Ley de Procedimiento Administrativo en donde señala que son tres días. ------Él Ing. Edgar Fernando Murillo Flores cede la palabra al Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, ------El Ing. Juan Francisco Martínez Vargas comenta en el caso particular de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" son contratos heredados de Administraciones pasadas y no con eso es justificar, pero si me gustaría resaltar. Están en procedimiento jurídico por falta de respuesta, hemos realizado oficios al área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios, para que se pronuncien al respecto; me gustaría que tomara nota el representante del área jurídica, porque lo que







este caso. -----

ACTA DE LA 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día 18 de diciembre del año 2018. en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----1.- Lista de Asistencia. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.----Preside el acto Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Reyo Filorio; Como suplente: Ing. Marina Ortega González, Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "C3"; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitados: Lic. C.P. Lorena Villarruel Salazar, Directora de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Emmanuel García Hernández, Representante de la Dirección General de Asuntos 2. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A". ------2.1. Caso No. DCOP "A" /04/2018. ------El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el caso, referente al Convenio Especial de plazo al Contrato de Obra Pública, Número DGPE-LPN-1-014-16. adjudicado a la empresa Grupo Corporativo Amodher, S.A. de C.V., relativo a los trabajos de "Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa". Con un monto estimado \$492'949,831.93 (Cuatrocientos noventa y dos millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y un pesos 93/100 M.N.); IVA incluido; Mediante el procedimiento de Licitación Pública, con fundamentado en el artículo 56 párrafo primero y sexto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y la Sección 10.1 de las

Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Pública. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, para la exposición de



El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz expone, solicitando un nuevo convenio modificatorio adicional en plazo, para la "Construcción del Museo Interactivo Infantil", Iztapalapa", con un plazo de ejecución del 29 de diciembre de 2016 al 7 de mayo de 2019; existen los elementos que lo justifican, derivado del estudio de la museografía a implementarse, ocasionados de la adecuación del proyecto ejecutivo por la existencia del ducto de PEMEX, ubicado en lado sur-poniente, lo que conllevo a modificar áreas y cambiar el desplante del edificio. -----Cabe mencionar que en el Dictamen de Técnico que se les envió, se adjunta el programa de ejecución modificado en período, donde se desglosa los conceptos ordinarios de concurso, los conceptos extraordinarios y adicionales identificados a consecuencia de la adecuación del proyecto, así como la información que complementa nuestra solicitud. -----El Ing. Joaquín Reyo Filorio pregunta, "parte de esta obra quedo sobre el derecho de vía de Pemex". ------El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz responde, de ninguna manera, todo el Derecho de Vía es respetado, de tal manera, que cuando se proyectó topográficamente el Área se observó que invadía el mencionado Derecho, no estaba sobre el tubo, pero el Derecho de Vía cuenta con un área determinada que se tiene que respetar, por lo que se tuvo que mover todo el edificio y realizar una sección en uno de sus costados para que este Derecho fuera respetado. -----La C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo pregunta, al iniciar el proyecto en la planificación del mismo no se observa, ya que en todos los terrenos donde PEMEX. tiene tuberías se observa unas columnas de concreto, que dice prohibido construir, cuando se planeó el proyecto y la construcción del Museo, no se observaron estas situaciones, para que no tuvieran que cambiar el proyecto y como en este caso tener un retraso en el mencionado proyecto, gracias. -----El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz responde, en el caso que nos ocupa del Museo, fue entregado por otra Área, y se debió considerar estas circunstancias: nosotros al tomar al tomar este proyecto lo consideramos y avisamos a PEMEX, como es procedente, e hicimos la identificación formal, estricta y real, donde se encuentra el ducto para poder realizar el trazo. ------El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta, si existen más comentarios al respecto, cede la palabra a la C.P. Lorena Isabel Villarruel Salazar. ------La C.P. Lorena Isabel Villarruel Salazar precisa, respecto a la modificación del plazo, aún no está autorizado por la Secretaría de Finanzas, se están realizando las gestiones para que se le dé la celeridad que amerita, pero comento al Pleno del Subcomité, para que quede condicionado, por si lo van a someter a su consideración, hasta que quede aprobado la modificación del plazo. ------El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio.---El Ing. Joaquín Reyo Filorio pregunta, "observando las características de esta obra la Construcción y la Supervisión fueron licitaciones públicas nacionales y la gerencia de proyecto que también es otro contrato fue por invitación restringida, de alguna manera hay confianza en la transparencia de esos procesos que se presentaron programas de actividades por parte del constructor, el constructor es una persona con mucha experiencia sabe de todos los trámites lo demuestra por su participación en una

Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas



Licitación pública de la cual fue elegido, no es como una adjudicación directa no se sabe con certeza de la viabilidad de quien es escogido como asignado del contrato, you digo que hay confianza no hay oportunidad a duda los avances tanto físico como financiero de os tres contratos, aunque hay ciertas cuestiones de congruencia de avance de construcción con los avances que se llevan de supervisión y gerencia son confiables no va a ver un incremento de los costos de ninguno de los tres contratos según he escuchado; creo que no hay nada que lo detenga es razonable que nos den esa autorización ampliación de plazo, gracias".

El **Ing.** Joaquín Reyo Filorio comenta "para la Primera Sesión del próximo año, podemos contar con una copia de ese oficio, escrito en el cual se da la suficiencia

Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas



7. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01/2019	"APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2018"	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			Х	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.



- 8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
- 8.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto





PROGRAMA DE OBRAS 2018 EJERCICIO 2018 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

											INVERSION AUTORIZADA:				\$188,932,628.06	
r	A		В		С		D		E		F	T	G		н	
AREA OPERATIVA	LICITACIÓN PUBLIC	:A	CONVENIOS DE LICITAC PUBLICAS	IONES	INVITACION A CUANDO M TRES PERSONAS, ART. 41 I 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A C MENOS TRES PERSONAS A LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTA 62 LOPDF 43 LOPSRM	AS ART.	CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECT ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM	Α.	ADJUDICACIONES DIRE ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM	SW-505020	TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"					\$ 7,452,076.02				\$ 446,383.01			\$	106,400,212.65		114,298,671.68	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"					\$ 35,990,742.38				\$ 1,535,053.19			\$	29,430,514.81		66,956,310.38	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"	\$ 271,264,001.63				\$ 18,213,562.74				\$ 3,041,623.00			\$	58,404,246.18		350,923,433.55	0.00
SUBDIRECCION DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			COMPANY NO.	=		198 8	H H H H	4	\$ 2,938,000.39			\$	31,985,463.02		34,923,463.41	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D"	:				\$ 33,016,674.90				\$ 14,606,149.44			\$	2,496,113.96		50,118,938.30	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS						П									0.00	0.00
REVALIDACIÓN													adds.	- 11	0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	271,264,001.63	0.00		0.00	94,673,056.04	0.00	0.00	0.00	22,567,209.03	0.00	0.0	0	228,716,550.62	0.00	617,220,817.32	0.00
PORCENTAJES:	\$271,264,001.63 \$617,220,817.32	43.95%	\$0.00 \$617,220,817.32	%00'0	\$94,673,056.04 \$617,220,817.32	15.34%	\$0.00 \$617,220,817.32	0.00%	\$22,567,209.03 \$617,220,817.32	3.66%	\$0.00 \$617,220,817.32		\$228,716,550.62 \$617,220,817.32	37.06%	\$617,220,817.32 \$617,220,817.32	%i0:001
C		CUANDO	LUDICACION DIRECTA DIMENOS 3 PERSONAS RT, 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LO	DPSRM)			CONTRATADO C	ONTRA	AUTORIZADO			one-Macoustic		0		1
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.	C+D+E+F+G	-	\$345,956,815.69 \$617,220,817.32		56.05%	,	A+B+C+D+E+F+G GASTO DE INVERSIÓN		\$617,220,817.32 \$617,220,817.32		100.00%					

ING. CALVADOR FONSEGA LARIOS SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO	NO AD	ORDA SERVICIO MONTO		EMPDECA	TIPO		FECHA	
CONTRATO	NO, AD OBRA/SERVICIO MOI		MONTO	NIO		SERVICIO	INICIO	TERMINO
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	大大型 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	操作。在2000年			A STATE OF	
			¥1					
						t type		14
11 - 4	NO HU	Printer						
					1			
								100
	CONTRATO	NOHU	NO HUBO CONTR	NO HUBO CONTRATACI	NO HUBO CONTRATACIONES	NO, AD OBRA/SERVICIO MONTO EMPRESA OBRA NO HUBO CONTRATACIONES	NO, AD OBRA/SERVICIO MONTO EMPRESA OBRA SERVICIO NO HUBO CO:NTRATACIONES	CONTRATO NO, AD OBRA/SERVICIO MONTO EMPRESA OBRA SERVICIO INICIO

SUMA = \$ -

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

		TII	EMPRESA	MONTO	OBRA/SERVICIO	NO. DE INVITACIÓN	CONTRATO	ing. Courner	
INICIO	SERVICIO	OBRA	ENTRESA	MONTO	OBRA/SERVICIO	NO. DE INVITACION	AREA CONTRATO		
(a) (b) (c) (c) (c)	4 9 2 2 5 444.5		Text to a strike						
					5.6				
			NIC	ATACIO	DO CONTE	NIO IIIII			
	:		JINE2	KATACI	RO CONTR	INO HO			
				179					
+			ONES	RATACIO	BO CONTF	NO HUE			

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE ÓBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 POR LICITACIÓN PÚBLICA

			TOREICHACIO	11 ODLICA	A company of the control of the cont				7.1	
		NO DE LIGHT CHÁN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	1000000	TIPO		FECHA	
ÁREA	CONTRATO	NO. DE LICITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	ENTRESA	OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO	
10000000000000000000000000000000000000			en e							
		10. Tago 100 (0.00 17) 4 - 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
			JBO CONT	DATAC	IONES	-			3	
	*	NOTIO	JBO CONT	NATAC	IONES				la ,	
					•					
									- 5-	
		1								
			=3	60.00						

SUMA = \$0.00

....0000 032



8.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2018

8				SITUACION ACTUAL									
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEP	CIONADOS	CON LIQUIDACIÓ	EN						
			NESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO					
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	1*	4	1	0	5	0					
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5					
TOTAL	8	2	1	4	6	0	10	5					

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓ	EN PROCEDIMIENTO	
i i			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	1 *	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	1 *	4	1	0	5	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras

Públicas "A3"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de diciembre de 2018

		TT		T																			
	NÚMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE	E EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	os	CONVE	/ENIO (PERIODO) - MONTO)	ESTIMA	ACIÓN	AVANCE %		OBSERVACIONES				
CASO	CONTRATO	Ш				INICIO	TERMINO	EJERCICIO 2008				INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)					
					to Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. ducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel			\$1,273,221.86	\$0.00		4			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00							
1	V07 01 3 0042/REV	66	IR		Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221 86		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-		\$0.00	\$1,265,034 24	\$0.00	100 00%	99 36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDA DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTR PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.				
					en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en niztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00		7.00			\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00							
										ANTICIPO	\$1,421,515.27				-			1 1	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALD DEL ANTICIPO E INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000 00 MEDIANT CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE D				
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$677,161.65	-	-	\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	\$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUD \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES POSIBLE COMPENSACIÓN D ADEUDOS CON CONTRATOS INOBIRL.2 028, INOB AD L.2 416 Y INOB AD L.2 366				
\perp					SUBTOTAL	_		8,401,745.56		POR AMORTIZAR	\$744,353.62				3,420,035,96				SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.				
=		=													3,420,035.55			لي	1				
					lel Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Rio Mixcoac - Av. Insurgentes ción Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje r.			\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40							
					Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el	1	1			ANTICIPO	\$404,952.82												OBBA TERMINADA OFFICE 2000 DENDIENTE DE L'AUGUST DE L'
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de		25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	AMORTIZADO	\$404,952.82			\$0.00	\$2,735,362.40	35,362.40 \$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESOE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORT DE \$1,314,185,82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09.				
+		++								POR AMORTIZAR	\$0.00						14		132131011130122 73030.				
	EP08.AD L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior,	1 21/11/2009	31/12/2008	\$8,279,915,58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.56	1						:	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE (
	EF GO.AD.C.1.242		^ '		Delegación Benito Juárez.	01/11/2000	31/12/2008	\$8,2/9,813.36	9 22 55	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$827,991.56 \$0.00	-	-	\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%		\$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.				
+		+					_			ANTICIPO		-					\vdash						
				Ingenieria y Desarrollos de	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin- Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes	2010012000	70407000	15.000.000.10	!	<u> </u>	\$504,860.65								OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QU				
	ED09 ID 1 102	1 00 1				30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	AMORTIZADO	\$504,860.65		1 - 1	\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.				
3	EP08.IR.L.1.192	00	ir I		zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José Maria Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	,	1	1	` .			1	1	1			1 1		RECEPCIONADA EL 24-07-09.				
5	EP08.IR.L.1.192	00	iR .		Gob. José Maria Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.					POR AMORTIZAR	\$0.00								RECEPCIONADA EL 24-07-09.				
	EP08.IR.L.1.192	00	IR .					\$17,378,050.26 25,779,795.82	\$0.00	2000 000 000 000 000	\$0.00			\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			RECEPCIONADA EL 24-07-09.				

NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS					
		ANTICIPO	\$3,159,320.30				
25,779,795.82	-	AMORTIZADO	\$2,414,966.68				
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62				

TOTAL DE ESTIMACIONES					
EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1,063,377.40					
	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE FÍSICO			

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2018.

				S	ITUACIÓ	N ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA		REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCI	ONADOS	CON LIQUID	DACIÓN Y/O LUITO	EN PROCEDIMIENTO
		77		EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
		7 21			1			
				,				
						The state of the s		
8.0						, a		
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5









INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

	NUMERO					PERÍODO D	E EJECUCIÓN	монто			- F	CONVE	NIO (PERÍOD	OTNOM - C	ESTI	MACIÓN	AVA	NCE %				
ASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	CIPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES			
IODI	JLOS																					
					CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE					ANTICIPO	2,465,863.43								OBRA CON TERMINACION ANTICIPAD EL ÁREA JURIDÍCA ENVIO A			
,	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	OBRAS Y	SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,69,62,64,65	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		AMORTIZADO	0.00				0.00	0.00	0.00%	30.00%	SECRETARÍA DE FINANZAS EL CAS CON EL OFICIO			
					Y 71					POR AMORTIZAR	2,465,863.43			7 - 1		100			GDF/SOS/DG0P/0039/2010, DEL 15/01/10			
7				ALFA						ANTICIPO	592,151.26								OBRA CON TERMINACION ANTICIPAD EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITE			
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	PROVEEDORES Y	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		AMORTIZADO	0.00		*		0.00	0.00	0.00%	0.00%	PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA D ANTICIPO.			
- 1				S.A. DE C.V.	COYOACAN					POR AMORTIZAR	592,151.26				4,-1			- 4				
\neg				MEXICANA DE	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y					ANTICIPO	535,014.31						-10		SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA			
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE		17/10/2008	19/12/2008			AMORTIZADO	73,109.18				86,010.80 0.00	0.00	100.00%	8.04%	DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO I SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DE			
				C.V.	TLAHUAC						POR AMORTIZAR	461,905.13							P. Lands	13/04/10		
				MEXICANA DE					1,070,028.63	1,070.028.63	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31						W. D.		SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓ DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA L
4	ED08,AD.L.2.0219		A.D.	OBRAS Y	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN	17/10/2008	19/12/2008					1,070,028.63	1,070,028.63		AMORTIZADO	414,577.78				848,328.55	0.00	100.00%
				SERVICIOS, S.A DE C.V.	TLAHUAC					POR AMORTIZAR	120,436.53								29/04/10			
ERM	INACIÓN DEL PR	ROYECTO	EJECUTIVO	DEL PARQUE IZ	TAPALAPA.														EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UN			
					-					ANTICIPO	1,510,082.40			1.5			110	The same	TERMINACION ANTICIPADA POR FALT			
5	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CORPORATIVO DE	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		AMORTIZADO	799,481.10				0.00	826,058.62	1,37%	16.41%	DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 200 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCES			
				CONSTRUCCION	ILIAFALAFA	21/11/2008 31/12/2008 5,033,807.	3,000,007.89		POR AMORTIZAR	710,601.30								DE DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO.ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIO EN ADEFAS				

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIÓ DÁVID MUÑOZ CALDERÓN SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ª. SESION ORDINARIA 2019

8.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

	20.00		SITUACIÓN ACTUAL									
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	Y/O	RECEPCIONADOS		CON LIQUII FINIC	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO					
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURIDICO				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1				
TOTAL	0	, 1	0	1	0	0	1	1				

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raul Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras

Públicas "A3"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		DO DE UCIÓN	MONTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	A	ITICIPOS	CONV	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		A	VANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2011				INICIO	TÈRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	obolitinoinilo
				Construcción del Distri Centenario	buldor Vial Anilio Periférico-Arco Norte y Av.															
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP		Construcción del Distribuídor Vial Anillo Periférico- Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero		30/01/2011	172,370,342,35	7,427,106.73	D.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAF	0.4	0		6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.1 DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITOR AOPETIOS/10 DE LA COMHALDE PARA C.P. 2010 Y EN PROCES DE REVISION LA AUDITORIA AOPETIOS/11 DE LA COMHALDE PAI C.P. 2011 PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHO Y OBUGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
					7.5				5 /		1					11811				NE NO NE NE NO NE NE NE
				TOTALES				172,370,342.35	7,427,106.73	0.00					6,585,981,21	7,408,159.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIC	CIPOS
		ANTICIPO	0.00
172,370,342.35	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE EST	IMACIONES	AVANCE GENERAL AI PERIODO						
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
7,408,159.04	0.00		7					

Ing. Raúl Márquez Martinez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

. 0000 041



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ª. SESION ORDINARIA 2019

8.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA **AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012**

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

			SITUACIÓN ACTUAL									
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPCIONADOS		CON LIQUID	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO					
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JUNIDICO				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0				
TOTAL	0	2	1*	; o	2	0	2	0				

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ang. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz. Director de Construcción de Obras Públicas "A"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		DDO DE UCIÓN	MONTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	2000	CONVE	NIO (PERÍODO	- MONTO)	ESTIM	IACIÓN	A	VANCE %	0.000
CASO	CONTRATO	r.r.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2012	ECONOMIA	ANTIC	iros	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del Distr	Ibuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,558,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			
								×			ANTICIPO	7,964,948.77								PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS AUDITORÍA POR LA CMHALDE AUDITORIA AOPENS
1	IN08.LP.F 2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los limites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyoti, en el Estado de México	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.96	0 00	AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718 40	0.00	100.00%	48.80%	CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBL 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATI POR \$3,346,600.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN
											POR AMORTIZAR	1,501,867 17								ANTICIPO PEMDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO COSTO INDIRECTO
51			B 521	٥							ANTICIPO	0.00			7		×			CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TC DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERC 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIEN
2	IN08.IR.F.3.316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimaltuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóvott, en el Estado de	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITCA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUE PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJU DE COSTOS Y SERVICOS REALIZADOS, SE CUENTA (
					,						POR AMORTIZAR	0.00								UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPO APROXIMADO DE \$989,552.40. SE CUENTA CON ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE \$521,280.55.
_			L	TOTALES				295,145,110,08	50,556,754,93	0,00					0.00	25.887.919.52	1 0.00	1		<u> </u>

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	7,964,948.77
295,145,110.08	0.00	AMORTIZADO	6,463,081.60
		POR AMORTIZAR	1,501,867.17

TOTAL DE EST	IMACIONES		GENERAL AL ERÍODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ª. SESION ORDINARIA 2019

8.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2018

,			SITUACION ACTUAL									
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEP	CIONADOS	CON LIQUIDACIO	EN					
			REGUINDIDGS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO				
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0 -	0	2	0	2	0				
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	21	3	21 -	3	0				
TOTAL	21	5	0	21	5	21	5	0				

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

	,			4	SITUACIO	N ACTUAL					
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPC	IONADOS	CON LIQUII	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO				
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURIDICO			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0			
TOTAL	2	o ;	0	0	2	0	2	0			

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón. Subdirector de Construcción de Obras

Públicas "A1"

Ing. José Alejarídro Cano Neria. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EJEC	ODO DE CUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	· ANTI	ICIPOS	CON	/ENIO (PERIODO	o - MONTO)	ESTIMA	ACIÓN	AVA	NCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2014				INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					estructura Urbana-Mantenimiento de Puentes es Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00		*			0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes pesdonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00		-	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepciona de liquidar, la cual se considera en la modalidad ADEFAS.
				Construcción del Tribu	nal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00					437,582,464.24	0.00	0.00			
					Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México						ANTICIPO	149,799,999,99								Se otorgó el 28.27% de anticipo, no se regi avance físico, en virtud de que los trabaios inicia
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	,	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	0.00	0.00	0.00%	34.23%	hasta el 16 de abril de 2015. El avance fisic financiero (incluye anticipo) corresponde al ejerc que se reporta del contrato multianual y se aju en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación
											POR AMORTIZAR	149,799,999.99							Tia	fecha de terminación al 14 de noviembre de 201
				TOTALES				570,348,112.80	208,394.16	0.00					437,582,464.24	197,106.04	0.00			_

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS				
		ANTICIPO	149,799,999.99			
570,348,112.80	0.00	AMORTIZADO	0.00			
		POR AMORTIZAR	149,799,999.99			

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL PERIODO
PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO

197,106.04 0.00

ling. Arq. Isid o Tovar Mondragón. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1 Ing. 305é Aléjandro Carlo Neria.

SECRETARÍA DE CERAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2014

	9		Çe î e		SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN		CANCELADOS O		ONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
	365 36	e en oraș i fi	RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	21 ;	3	21	3	0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARCINEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS °C2°

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2014

	NÚMERO	FF	MODALIDA	O EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIO EJEC	IDO DE IJCIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	os	co	WENIO (PÉRIOC	(CT/CM-O	ESTIM	IACIÓN	AV	ANCE		OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO				NA	CIDINI	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2014				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
											ANTICIPOS	N/A									
				1	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE						AMORTIZADO	N/A		1							
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	AD	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S A DE C V	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,016.24	\$1,439,015.24	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,841.DB	\$0.00	100.00%	97.12%		CONCLUIDOS, EN DE LIQUIDACIÓN Y
		ĸ			TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA						ANTICIPOS	N/A									
2	DGOP-LPN-1-015-14	LOCALES	į.P	NY ANALISIS DE OBRAS	DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO O PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014 "(PACUETE 3), INTEGRADO POC LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA NO. 23 "MARIANO VÁZOUEZ RORRÍSUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAJUNTEMOC Y EL JARDÍN DE NÍXOS "ESTADO DE	8-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0.00	AMORTIZADO	N/A	6-ocl-14	31-dic-14	\$1,579,480.37	\$14,188,179.40	\$0.00	100.00%	89.90%		CONCLUIDOS, EN DE LIQUIDACIÓN Y
					GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.						POR AMORTIZAR	N/A									
				1							ANTICIPOS	N/A									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	DE INGENIERÍA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014 "(PAQUETE 9), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51,	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,248.78	100.00%	37.21%	PROCESO D	CONCLUIDOS, EN DE LIQUIDACIÓN Y
				APLICADA, SA DECV	SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA		2				POR AMORTIZAR	N/A				15			42	FINIQUITO.	

DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENOAN ESTIMACIONES EN ADEFAS.
DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDIO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANI	ICIPOS
# _P REF:	0 00	ANTICIPOS	0 00
,		AMORTIZADO	0 00
		POR AMORTIZAR	0 00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS EN TRÂMITE # REFI # REFI		AVANCE GENERAL AL PERIODO					
PAGADAS	EN TRÂMITE	FISICO	FINANCIERO				
#IREFI	#IREFI	#IREF1	#IREF1				



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ª. SESION ORDINARIA 2019

8.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2018

			SITUACION ACTUAL										
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN					
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO					
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0					
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0					
TOTAL	40	1	0	38	3	30	11	0					

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Dirección General de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

		T .		1 5 2		N ACTUA		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPC	IONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	; 2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria. Subdirector de Construcción de Obras

Públicas "A2"

. 0000 053

Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	P DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA		ICIPOS	CONV	ENIO (PERÍO	DO - MONTO)	ESTIMA	ACIÓN	AV	ANCE %	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2015	ECONOMIA	ANI	ICIPOS	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
		,			entes Peatonales y juntas constructivas de rimera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
		FONDO DE APORTACIONES		4	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y					-	ANTICIPO	0 00					l l			,
1	DGOP-IR-F-1-055-15	PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES	IR	MARTÍNEZ GREY, S.A.	distribuidores viales en la Delegaciones. Azcapotzalco, Venustiano Carranza. Iztapalapa, (Tialpan, Gustavo A Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0 00	AMORTIZADO	0.00		-	0 00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos.Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.
		FEDERATIVAS			or bistillo todorar.						POR AMORTIZAR	0.00								1
				Construcción del Tribu	nal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					437,582,464.24	19,349,732.64	0.00		- 1 24	
		CRÉDITO Y RAMO 23			Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de						ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V		28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	AMORTIZADO	5,083,999.24	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	19,349,732.64	0.00	4.84%	3.26%	ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de
	7								11		POR AMORTIZAR	144,716,000.75								terminación al 14 de noviembre de 2018.
				Mantenimiento a Puen Distrito Federal.	tes Peatonales en Vialidades Primarias del			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
				HVAC	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de Mêxico, derivado de						ANTICIPO	0.00								Testales associate Daniel A. J. Linda M.
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	, IR	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DEC.V.	revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	2	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%		Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtid de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS.
				DEG.V.	Atención 072						POR AMORTIZAR	0.00				2 1				Recepcionado el 31-01-2017.
				TOTALES				587,314,711.31	50,773,452,97	0.00					437,582,464.24	32,663,717.32	0.00	1		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	0.00
587,314,711.31	0.00	AMORTIZADO	5,083,999.24
		POR AMORTIZAR	144,716,000,75

TOTAL DE EST	IMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO							
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO						
32,663,717.32	0.00								

Ing. José Alejandro Capio Neria. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

1 -

Dirección General de Obras Públicas



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2015

					SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN		CANCELADOS O	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	ÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
		* 14	RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"		0	0	36	2	30	8	0

SECRETARÍA DE DREAS : SETANDOS DIRECTOS SANDTES AS OBTAS ATRIBICAS DIRECTOS ES CONSTRUCTOS AS OBTAS ATRIBICAS (C)


CDMX

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2015

	NÚMERO .	E E	MODALI	DAD E	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIO EJEC	DO DE	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIP	os	coi	WENIO (PÉRIODO	O-MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	ANCE	T	OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO			_			INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2015	LOCKOMIK	ATTICAL	03	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FISICO	FINANCIERO	+	OBSERVACIONES	
			1									ANTICIPOS	N/A					1					***************************************
1	DGOP-IR-F-4-008-15	FEDERAL	ES IR		A UITECTURA DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "XNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	18-jun-15	31-dic-15	\$12,545,385.48	\$12,545,385.48	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$174,000.01	100.00%	98.61%		RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN	
				+								ANTICIPOS	N/A							ļ			
		1				Dr.						AMORTIZADO	N/A	1									
2	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALE	5 LP			TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,497.20	\$64,351,497.20	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$64,023,848.68	\$0,00	100.00%	99.49%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO.	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN	EN Y
												ANTICIPOS	N/A							-	-		
												AMORTIZADO .	N/A	1									- 1
3	DGOP-(R-F-2-015-15	FEDERALE	S IR		UITECTOS.	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,993.30	\$4,984,893.30	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,952,620.06	\$32,373.24	100.00%	99.35%		RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN	
												ANTICIPOS	N/A								-		
						5						AMORTIZADO	N/A										Ne
4	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IR	ASS	VIERIA SA	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.88	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO.	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN	EN
					:							ANTICIPOS	N/A										-
				PRO	VECTOS Y						- 1	AMORTIZADO	N/A		1							<i>:</i>	
5	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALE	S IR	ENI	NISTRACIÓN NGENERÍA SADECV	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,925.59	\$11,805,825.58	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	99.49%		RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN	
												ANTICIPOS	N/A										
					GH	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA	Ī			1		AMORTIZADO	N/A					8					
5	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	i R	CONS	TRUCONSU ES S A DE C V		6-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	· N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	- 100.00% -	99.41%	TRABAJOS PROCESO FINIQUITO.	CONCLUIDOS, E DE LIQUIDACIÓN	EN Y
	,											ANTICIPOS	N/A										
					BRAJA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y						AMORTIZADO	N/A									4	
7	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	AD	CONST	TRUCTORE I		18-ago-15	31-dic-15	\$12,898,069.11	\$12,898,069.11	0.00	POR AMORTIZAR	NA	N/A	N/A	N/A	\$12,911,069.13	\$0.00	100.00%	99.33%	TRABAJOS PROCESO FINIQUITO.	CONCLUIDOS, E DE LIQUIDACIÓN	EN Y









SECRETARÍA DE DORAS, VISETOTOROS Chacción caneral de Obras Públicas Cisacción ex Constitución de Ostas Públicas (C)

NÚMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIO EJEC	DDO DE CUCIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	òs .	cc	INVENIO (PÉRIODO)-MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	NCE	OBSERVACIONES
SO CONTRATO					INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2015				INICIO	TÉRMINO	CTNON	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
			1							ANTICIPOS	N/A								
										AMORTIZADO	N/A								
DGOP-IR-L-4-054-	5 LOCALES	IR.	ARQUITECTOS S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,995,354.20	\$3,995,354.20	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	· N/A	N/A	N/A	\$3,935,264.79	\$60,089 44	100.00%		CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2015

1	CONTRATADO	ECONOMIAS	TOTAL DE AN	TICIPOS
-				
г	400 0 . 0 . 0 0 0			

123,D4D,165.29	0 00	AMORTIZADO	0 00
		POR AMORTIZAR	0 00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL
TOTAL DE LOTAMACIONES	AL PERIODO

122,202,300.15	266,462.69	100.00%	99.08%
----------------	------------	---------	--------

05



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ª. SESION ORDINARIA 2019

8.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2018

					SITUACION			N or de diciembre de 2
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEP	CIONADOS	CON LIQUIDACIO	ÓN Y/O FINIQUITO	EN
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	22	2	0	17	7	0	24	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	0	0	0	4	2	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	7	15	7	15	0
TOTAL	48	2	0	24	26	9	41	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 22 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 22 ESTÁN CONCLUIDOS Y 2 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA **AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

1.5					SITUACIO	N ACTUA	L'allerie	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPC	ONADOS	CON LIQUID	DACIÓN Y/O RUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	22	2	0	17	7	0	24	; 0
TOTAL	22	2	0	17	7	0	24	0

IOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTIDÓS SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO DJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTIDÓS ESTÁN CONCLUIDOS Y DOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón. Subdirector de Construcción de Obras

Públicas "A1"

Ing. Jose Afejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"





Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN IACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTI	CIPOS	CONVE	NIO (PERÍO	DO - MONTO)	ESTI	MACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	1,1.	MODALIDAD	LIIITKESA	DESCRIPTION DEL CONTINUE	INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016	LOCHOMIA		J. 55	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
	300 300 300 300			Construcción del Tribun	nal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	156,786,223.10	0.00					476,487,074.98	71,467,303.38	0.00			
		CRÉDITO Y RAMO 23			Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de			*	8		ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero (incluye anticipo
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C V.		28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	AMORTIZADO	28,530,506.64	29/09/2016	14/11/2016	437,582,464.24	62,474,941.28	0.00	10.72%	7.76%	corresponde al ejercicio que se reporta del contra: multianual y se ajusta en base al Convenio c Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación co
											POR AMORTIZAR	116,185,494 11			-					fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018.
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de					3	ANTICIPO	0.00								
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A	Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	8,992,362.10	0.00	26.39%	23.11%	El avance físico y financiero corresponde ejercicio que se reporta del contrato multianual. E base al Convenio de ampliación en importe y plaz
	9 ,,			DE C.V	Juárez, en la Ciudad de México						POR AMORTIZAR	0.00								al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción de Páneles	s Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,950.21	0.00			
					Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de						ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C V.	energia en los edificios de Oficialia Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	15/12/2018	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	misma que se pagará en la modalidad o ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
											POR AMORTIZAR	0.00								,
				Distrito Federal.	tes Peatonales en Vialidades Primarias del			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00					0.00	7,861,869.88	0.00			
					Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de			19			ANTICIPO	0.00							-	Trabajos concluidos Pendiente de liquidació
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	Y CONSTRUCCIÓN, S.A DEC.V.	revisiones programadas paticiones ciudadapas	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	D.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	misma que se realizará en la modalidad d ADEFAS, en virtud de que se encuentra e proceso de auditoría por parte de la CISOS
					Atencion 0/2					(40)	POR AMORTIZAR	0.00								Recepcionado el 31-01-2017.
				DISEÑO Y	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente						ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	SUMINISTROS ESPECIALES PARA	peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tialpan. Colonia Santa Úrsula Coapa.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	AMORTIZADO	0.00	- 1	-	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
				PUENTES, S.A. DE C.V.	Delegación Coyoacán, Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00								Recepcionado el 3-oct-17.
					estructura Urbana-Mantenimiento de Puentes es Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00	1		
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros	***************************************				9	ANTICIPO	0.00								
6	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO	de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
4.1		FISCALES		INTEGRAL, S.A. DE C.V.	San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00						-		Recepcionado el 3-oct-17.
u i					un carril reversible en el Puente Vehicular			4 200 440 00	4 200 440 00	0.00	PORAMORTIZAR	0.00			0.00	1,300,862.61	0.00	-		
		•		Avenida Veracruz	Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00					0.00	1,300,862.61	0.00	ļ		
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado						ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación
7	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V	en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P.	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					01080, Ciudad de México						POR AMORTIZAR	0.00								receptionado el 3-oct-17.

for A



Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	IPOS	CON	VENIO (PERÍOI	OO - MONTO)	ESTI	MACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016		Auto	00	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Remodelación y conser Antiguo Palacio del Ayu	vación de salas de prensa en el primer piso del intamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00			ĺ		0.00	5,869,691.95	0.00			
				PROYECTOS Y	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de			47		9	ANTICIPO	C	0.00							Trabajos concluidos, Pendiente de Liquida
8	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR		la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	AMORTIZADO		- 00 -	-	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	misma que se pagará en la modalidad ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
				Ampliación de una sec Leones.	ción y tramo de la avenida Desierto de los			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	POR AMORTIZAR		0.00		0.00	7,457,920.65	0.00			
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección						ANTICIPO	r	0.00	+				<u> </u>		
	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS	IR	IRKON HOLDINGS, S.A.	y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Ángel Inn, C.P. 01760,								-		5		10			Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidac
	DGOP-IR-L-4-034-16	FISCALES	I IK	DE C.V.	Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	AMORTIZADO		0.00 -	-	0.00	7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	misma que se pagará en la modalidad ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
						*****					POR AMORTIZAR	0	.00							
			ame	vialidad José Azueta A Calzada de la Virgen.	o poniente y ampliación del lado oriente en la bad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00					0.00	14,999,118.64	0.00			
		**			Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la						ANTICIPO	0	.00						14/11	
10	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	AMORTIZADO	0	.00 -	-	0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	En proceso de Acta Entrega-Recepción, mis que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											POR AMORTIZAR	0	.00							
				CORPORATIVO DE	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación,	3.5					ANTICIPO	0.	.00							
11	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad. Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	AMORTIZADO	0.	.00 -	-	0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	En proceso de Acta Entrega-Recepción, mis que se pagará en la modalidad de ADEFAS
				J. 1.	de México.						POR AMORTIZAR	0.	.00				_		- 1 - 7	7
				Aplicación de pintura en Social	n 100 módulos de la Secretaria de Desarrollo			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00			1	+	0.00	19,996,939.56	0.00			
		e e			Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública el las Delegaciones, Gustavo A. Madero con 9						ANTICIPO	0.	00							
12	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos,	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	AMORTIZADO	0.	00 -	-	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidaci misma que se pagará en la modalidad ADEFAS
					Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.	00		4					Recepcionado el 3-oct-17.
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las						ANTICIPO	0.	00							Trabales espekides Parties de la
3	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	AMORTIZADO	0.	- 00	-	0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidacionisma que se pagará en la modalidad ADEFAS.
					Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.		=				POR AMORTIZAR	0.1	00							Recepcionado el 3-oct-17.

9 Inn



Corte al 31 de diciembre de 2018

	Property		_																	_
	NUMERO .	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANT	ICIPOS	CONVE	NIO (PERÍOD	o - MONTO)	ESTI	MACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO			Moude 2000001-0000-0		INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016				INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo em Módulos de Participación Ciudadana y Segundad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos,						ANTICIPO	0.00		-						Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación
14	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	AMORTIZADO	0.00			0,00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	misma que se pagará en la modalidad d ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											POR AMORTIZAR	0.00								
		ř			Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Segundad Pública ubicados en las Delegaciones: Talipan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tábhuac con 4 Módulos, Iztapalaga con 10 Módulos, Tábhuac 100 de 100 de				9		ANTICIPO	0.00				N				
15	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A., DE C.V.		27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluídos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modelidad d ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					A modulos a intervenir centro dei perimetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tempo determinado.						POR AMORTIZAR	0.00								
	•		-	Rehabilitación a Escu	uelas de Educación Básica de la Cludad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00	,				0.00	49,297,290.24	0.00			
We					"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por. Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria						ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación
16	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR ,	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	ł		0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	misma que se pagará jen la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
7					Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz						ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación
17	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	iR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	de Dominguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila Garcia, Primaria Valentin Vázquez Nava, Primaria Antonio Solis López,	21/12/2018	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena						POR AMORTIZAR	0.00								Recepcionaud er 3-oct-17.
					Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), Integrado por Escuela Primaria General Feligio Angeles, Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mitro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabaladores de Hierro,						ANTICIPO	0.00				*	8			
18	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria Nº 50 "Lázero Cárdenas". Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	AMORTIZADO	0.00		1 0	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
			¥		Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.501, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Míguel Hidalgo y Azcapotzako; en la Cludad de México, A precio unitair o tiempo determinado.			ы			POR AMORTIZAR	0.00					8			

9 Jan

. 0000 063



Corte al 31 de diciembre de 2018

~	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO D CONTR	E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	Egonow':			CONV	ENIO (PERÍOI	00 - MONTO)	ESTIN	MACIÓN	AV	ANCE %	
CASO	CONTRATO	r.r.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTIC	CIPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
					Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por. Escuela Prim Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarria y Ferarria, Kinder Lic Alejandro Quijano, Prim. Tiacoquemecati Prima Centro Urbano Presidente Miguel						ANTICIPO	0 00		2						Trabajos concluidos. Pendiente de Liguidaci
19	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Alemán, Primana Carlos A. Carillo, Primana Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0 00	AMORTIZADO	0.00	-		0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	misma que se pagará en la modalidad ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
					Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.						POR AMORTIZAR	0.00								
					Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primana Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic Miguel				×		ANTICIPO	0.00	-							
20	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR .	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10	22/12/2016	31/12/2015	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	٠	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidac misma que se pagará en la modalidad ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					"Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.						POR AMORTIZAR	0.00								
		*			Supervisión Tecnica y Administrativa de los contratos referentos a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, sal como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6). Primarias, María Epigmenia Arraga Salgado. Coyokauhqui, Dr., Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semilonovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la lazado y tiempo determinado, ubicados en la						ANTICIPO	0.00								
21	, DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, SA DE C.V.	Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7); Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massiew, Por. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Májera Jiménez y Secundaria	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Técnica No. 29, Kiutecuhtii, A precio atzado y tempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoscán e Iztapalaga, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), integrado por: Escuelas Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentin Vagueze Nava, Primaria Antonio Solls López, Secundaria Teo. 60 Francisco Javier Cantenscriae, ao las Abaceages Maediatoses.						POR AMORTIZAR	0.00				, ,			-	
				Construcción del Museo	Interactivo Infantii iztapalapa			527,185,523.79	3,042,932.91	0.00					0.00	3,042,929.96	0.00	-		
in d				202.000.000	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	٠					ANTICIPO	0.00								tow the w
22	DGPE-LPN-2-012-18	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	AMORTIZADO . POR AMORTIZAR	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual.
				INGENIERÍA INTEGRAL	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.						ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos.
23	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16		AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual.

1 m

4

...0000 064



Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE CONTRA		MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (I	PERÍODO -	- MONTO)	ESTIM	IACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016		Airnoire	"	IICIO TÉ	RMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
24	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO			Construcción del Museo Interactivo Infanti Iztapalapa	29/12/2016	30/03/2018	492,949,831.93	195,014.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 D1/0	18/1	2/2018	0 00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde ejercicio que se reporta del contrato multianual base al Convenio con fecha de termino al 18-19 NOTA: Se encuentra trámite de autorización Convenio de Especial de Ampliacion, con recide término al 7 de mayo de 2019.
				TOTALES				1,278,809,968.95	286,805,223.92	0.00				47	76,487,074.98	198,917,197.57	0.00	†		Anna de la companya della companya della companya della companya de la companya della companya d

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
	 	ANTICIPO	0.00
1,278,809,968.95	0.00	AMORTIZADO	28,530,506.64
		POR AMORTIZAR	116,185,494.11

TOTAL DE ES	TIMACIONES		GENERAL AL RÍODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
198,917,197.57	0.00		

Ing. Arq. Isid o Tovar Mondragen.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Aleita de Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA **AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2018.

				S	ITUACIÓ	N ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	0	0	0	4	2	2	0
1	. 1				#			
					ž 1, s	, an		
,				,				
TOTAL	4	0	0	0	4	2	2	0





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2016 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

	DIRECCION DE COMO	moccion oc	CONTROL TOUCHER				
							Al 31 de diciembre de 2018
NÓI	MONTO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)	ESTIMACIÓN	AVANCE %	
							OBSERVACIONES

	NUMERO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DI	E EJECUCIÓN	MONTO	ECONOMÍA	ANTICIP	000	CONV	ENIO (PERÍODO -	MONTO)	ESTIMA	ACIÓN	AV	NCE %	
CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIP		INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
			Т							т т									year I have been a second
					Rehabilitación a Escuelas de Educación					ANTICIPO	0.00							V	
1	DGOP-IR-L-1-035-16		IR	Ingenieria y Estructuras Mucar S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Norte)	01-Nov-18	31-Dic-16	10,115,997.78		AMORTIZADO	0 00	NA	NA	NA	9,884,313.60	231,684.18	100%	100.00%	Proceso de liquidación
J.					,					POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00						1.15		
2	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tiahuac y Milpa Alta	01-Nov-16	31-Dic-16	9,846,009.88		AMORTIZADO	0.00	NA.	NA	NA	8,586,721.25	10,893.04	100%	100,00%	En proceso de recepción
					Accidinated, Handac y mispa Alia					POR AMORTIZAR	0.00								
XI.					Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No.					ANTICIPO	0.00								
3	DGOP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	51 "Profesor Carlos Benitez Delorme", ubicada en Calle Niños Heroés de	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06		AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.80%	En proceso de recepción
					Chapuitepec No. 101 Col. Postal Delegación Bénito Juárez C.P. 03410.					POR AMORTIZAR	0.00			1					
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano			• •		ANTICIPO	0.00								
4	DGOP-IR-L-1-041-16		IR	Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	"Mexico Olimpico" y "Vicente Guerrero" y	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,526.95		AMORTIZADO	0.00	NA	NA .	NA NA	11,846,098.54	0.00	90.00%	100.00%	En proceso de liquidación y finiqui
				J.V.	las Primarias Abel Gámez Olivas y Felipe Angeles.					POR AMORTIZAR	0.00			100					1 2 61

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE ECONOMIAS TOTAL DE ANTICIPOS 0.00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL PERÍODO PAGADAS FÍSICO 37,017,654.16 99.20%

ING JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVÍD MUÑOZ CALDERÓN SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

Oirección General de Obras Públicas



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2016

				201500117001	SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	l e	CANCELADOS C		IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
		a A sales	RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"		0	0	7	15	7	15	0







SECRETARÍA DE DORAS Y ESTANDIOS Cinación Galerei sa Ceras Ficilidas Cinación de Constitución de Coros Ficilidas IC

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2016

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	NÚMERO	FF	MODALIDAE	DAD EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIC EJF	RIODO DE IECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	A ANTICIPO	os.	CO.	ONVENIO (PÉRIODO	JO-MONTO)	EST	FIMACIÓN	A ⁱ	AVANCE	OBSERVACIONES
so	CONTRATO	1				manufacture and the second	TERMINO		EJERCICIO 2018	-			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBJERTACIONES
	í '										ANTICIPOS	N/A	1	,						1
1	DGOP-AD-L-1-005-16	LOCALES	s AD	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S A DE C V	Y HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE	13-ago-18	3 11-sep-16	\$558,185.12	\$558,185.12	D.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	· N/A	N/A	N/A	N/A	\$198,484.07	\$0.00	100.00%	6 35.33%	
_	,					1						<u>'</u>	'							(
1	,	,			TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTRURAL, DISEÑO	1	,				ANTICIPOS	N/A	4 '	1		-				1
2	DGOP-AD-L-5-011-18	LOCALES	AD .	ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUELAS		, 28-ago-16	5 29-dic-18	\$1,298,142.81	\$1,298,142.81	0.00	POR AMORTIZAR	N/A N/A	N/A ·	N/A	N/A	\$1,253,591.12	\$0.00	100.00%	6 96.72%	
+		+	+	+			+'				ANTICIPOS	N/A		+	+		+	-	++	
	į ,	1 '			TRABAJOS DE SUPERVISÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE			1		4	AMORTIZADO	N/A	1	1		/				
3	DGOP-AD-L-5-013-16	LOCALES	A D	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S A DE C V	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN		31-dic-18	\$1,683,894.48	\$1,583,894.48	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,993.88	\$0.00	100.00%	6 99.41%	
1	,	100			THE AD MEDICADODA DE IMPTALACIONES ELÉCTRICAS DE		-		+	+	ANTICIPOS	N/A				+'		+	+	
	, ,	1			UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA		1				AMORTIZADO	N/A	()	1	1	,	1	/		
4	DGOP-AD-L-5-014-16	LOCALES	A D	ING PEDRO ALVARADO VILLAFUERTE	ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO.	9-sep-15	31-dic-18	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$114,553.03	\$0.00	100.00%	87.15%	ė
				2 2 2	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTRURAL, DISEÑO	1				7	ANTICIPOS	N/A .				1				7
5	, DGOP-AD-L-5-015-18	LOCALES	AD	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, S A DE C V	URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN	10-sep-16	28-dic-18	\$474,978.30	\$474,97B.30	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A	N/A	N/A	NIA	\$485,801.98	\$0.00	100.00%	98.03%	page 1
T					ı ı	1				<u> </u>	ANTICIPOS	N/A	1		1	+				
	. F	1		INGENIERÍA	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA	1 ,	1	1 '	1 '	1	AMORTIZADO	N/A	1	1	1	1		1	1	
5	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR	INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S A DE C V	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", JE UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-16	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,360,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
	,				* *	1					ANTICIPOS	N/A	,—	$\overline{}$	1			 		-
	J	1 1	1	IRKON	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA	4	(J	1	1	1 1	AMORTIZADO	N/A	(I		1		1 '	1		
7	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	LPN	HOLDINGS, S A DE C V	ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 'JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ', UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$62,348,323.82	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
	,				TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA	1		1			ANTICIPOS	N/A	, — —	1	(4 *				THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
		1	1/	GRUPO KOPIL,	ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III.	(1	1	1	4	1	AMORTIZADO	N/A	, 1	()	("		1	1	1	
8	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	LPN	SADECV	UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-16	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	







SECRETARIA DE OBRAS Y SETANDIOS Chacción Sanarai sa Obras Proficis Chacción as Canahucción de Carda Poblicua (C

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2016

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	NÚMERO	F =	MODALIDA	D EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERI: EJEI	ODO DE CUCIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO COATATAOO	ECONOMÍA	ANTICIE	os	co	NVENIO (PĒRIODO	(CTNOM-C	ESTIMA	CIÓN	AV	ANCE	OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2018				INICIO	TÉRMINO	СТИСМ	PAGADA	EN TRÂMITE	FISICO	FINANCIERO	
- 1	8	1									ANTICIPOS	N/A								
			1	1	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL						AMORTIZADO	N/A	1							
Э	DGOP-LPN-L-5-030-16	LOCALES	LPN	ARQUIPO, S.C.	HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE SIN, ESCUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,786,520.33	\$5,237,086.56	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,987,07	\$0.00	86.44%	81.46%	
1											ANTICIPOS	9,821,520 31							-	
		1			DROVECTO INTEGRAL DADA LA CONSTRUCCIÓN DE						AMORTIZADO	9,821,520 31								
10	DGOP-LPN-L-4-031-16	LOCALES	LPN	CODAD, S A DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-16	30-dic-16	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	FOR AMORTIZAR	0 00	N/A	N/A	N/A	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%	
1											ANTICIPOS	N/A						1	<u></u>	
					UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA						AMORTIZADO	N/A								1
1	DGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-18	\$296,224.14	\$296,224.14	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,667.52	\$0.00	100.00%	81.87%	er .
1											ANTICIPOS	N/A				1			 	
- 1					SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA					,	AMORTIZADO	N/A								
12	DGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	ΑD	ARQUINTEG, S A DE C V	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$280,187.35	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.98	\$0.00	71.36%	31.41%	
											ANTICIPOS	N/A								
				CONSULTORIA	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA	,					AMORTIZADO	N/A								1
	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	IR	INTEGRAL EN INGENIERÍA S A DE C V	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$11,512,671.79	\$570,761.77	0.00	POR AMORTIZAR	NA	N/A	N/A	N/A	\$8,218,299.64	\$0.00	59.98%	54.00%	
					2						ANTICIPOS	N/A	1	-						
				ING RAFAEL	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA						AMORTIZADO	N/A								
	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	AD .	JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$996,188.84	\$56,387.60	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$56,387.60	\$0.00	68.40%	5.86%	
+										7	ANTICIPOS	N/A								
1				100000000000000000000000000000000000000	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO						AMORTIZADO	N/A								
-	DGOP-LPN-F-2-059-16	FEDERALES	LPN	RA MEXICANA	LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-dic-16	31-dic-17	\$287,634,458.75	\$1,956,183.95	0.00			N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.61	\$0.00	15.88%		ESTA OBRA TUVO UNA TERMINAI ANTICIPADA
				SA DEC.V.	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO						POR AMORTIZAR	N/A	140							ATTIOIFADA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE AM	ITICIPOS
139,140,773.16	0.00	ANTICIPOS	9,821,520 31
		AMORTIZADO	9,821,520 31
		POR AMORTIZAR	0 00

TOTAL DE EST	TIMACIONES		GENERAL ERIODO
PAGADAS	EN TRÂMITE	FISICO	FINANCIERO
152,762,137.24	51,833.44	86.80%	88.04%



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ª. SESION ORDINARIA 2019

8.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2018

					SITUACION			Voluc diciembre de 2
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPO	CIONADOS	CON LIQUIDACIÓ	ÓN Y/O FINIQUITO	EN
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	7	0	2	7	0	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	1	0	0	3	0	3	0
TOTAL	4	8	0	2	10	0	12	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, DOS SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, CINCO CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESODE EJECUCIÓN,4 CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

					SITUACIO	N ACTUA	L	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPC	IONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	7	0	2	; 7	0	9	0
TOTAL	2	7	0	2	7	0	9	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, DOS SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, CINCO CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CUATRO CONCLUIDOS.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1" Ing. José Alejándro Cano Neria. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2" Ing. Raúl Márquez Martínez. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Corte al 31 de diciembre de 201

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANT	ricipos	cc	ONVENIO (PERÍC	DO - MONTO)	ESTIN	MACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2017				INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribun	al de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	176,509,711.69	0.00					476,487,074.98	120,939,255.64	0.00			
		CREDITO Y RAMO 23 PROVISIONES			Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de Máxico					2	ANTICIPO	0.00			•			-		El avance físico y financiero (incluye anti corresponde al ejercicio que se reporta contrato multianual y se ajusta en bas
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTO EJA, S A, DE C V.	R.	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	AMORTIZADO	41,078,179 76	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	106,232,989.08	0.00	14.61%	14.89%	Convenio de Reducción de Monto, Avances conforme a nueva reprogramación fecha de terminación al 14 de noviembro 2018.
):		POR AMORTIZAR	75,107,314.35	i							2018.
				INGENIERÍA MAS	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal,						ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero correspond
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	ARQUITECTURA, S.A DE C.V.	ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	14,706,266.56	D.00	AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,706,266.56	0.00	37.80%	37.80%	ejercicio que se reporta del contrato multianu. En base al Convenio de ampliación en impo
		1			Juarez, en la Ciudad						POR AMORTIZAR	0.00							- 111	plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción del cuerpo vialidad José Azueta A Calzada de la Virgen.	o poniente y ampliación del lado oriente en la bad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00					0.00	23,655,249.07	0.00			
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la						ANTICIPO	0.00								
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	SERVICIOS	vialidad José Azueta Abad, Tramo; Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	18/12/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	64.95%	53.92%	En proceso de Acta Entrega-Recepció Liquidación
	142										POR AMORTIZAR	0.00								
		-			Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio						ANTICIPO	0.00								
	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR		alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación c del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	;92.43%	33.81%	En proceso de Acta Entrega-Recepció Liquidación
				C.V.	Traile. Avenue oural de las						POR AMORTIZAR	0.00							,	
				Construcción del Museo	Interactivo Infantii iztapalapa			527,185,523.79	97,878,694.79	0.00		_			0.00	74,506,364.62	0.00		1	
7					Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.				4		ANTICIPO	0.00								
,	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde
	*		ar haaranna n	************	a a u						POR AMORTIZAR	0.00			7	89.8				ejercicio que se reporta del contrato multianua
1				¥	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.						ANTICIPO	0 00								
6	DGPE-IR-2-013-16/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL		26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde
				MÉXICO, S.A. DE C.V				,			POR AMORTIZAR	0.00				5,555,555.77				ejercicio que se reporta del contrato multianua
1					Construcción del Museo Interactivo Infantil															T
,	DODE LDN 1 014 16/05/4	CRÉDITO	LDN	GRUPO CORPORATIVO		00/40/004 =		400 040 004 65	a		ANTICIPO	0,00	100 4 140°C%							Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde ejercicio que se reporta del contrato multian en base al Convenio con fecha de término al
'	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	AMODHER, S.A. DE C.V.		29/12/2016	30/03/2018	492,949,831.93	84,408,973.28	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/04/2018	18/12/2018	0.00	61,036,643.11	0.00	12.63%	12.38%	dic-18 NOTA: Se encuentra trámite de autorizaci
											POR AMORTIZAR	0.00						_	**	el Convenio de Especial de Ampliacion, o fecha de término al 7 de mayo de 2019.

9 mari

1



Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTI	CIPOS	со	NVENIO (PERÍC	DO - MONTO)	ESTIN	MACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2017				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	Fisico	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Mantenimiento a Puent Distrito Federal.	es Peatonales en Vialidades Primarias del			1,799,622.03	1,799,622.03	0.00					0.00	1,796,640.01	0.00		**********	
				DISEÑO Y	Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por						ANTICIPO	0.00								
8	DGOP-AD-L-2-030-17	RECURSOS FISCALES	AD	SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del D72 y	15/11/2017	31/12/2017	1,799,622.03	1,799,622.03	0.00	AMORTIZADO	0 00	٠,		0.00	1,796,640.01	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
				POENTES, SA DE CV	Dependencias Oficiales						POR AMORTIZAR	0.00								Recepcionado el 13-nov-18
	e			Construcción de la Fábri	ca de Árte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.65	0.00					0.00	0.00	0.00			
		Á		5 A	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, númmero 14, Colonia Tlaxpana,						ANTICIPO	0.00								
9	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciiudad de Mèxico.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345 65	0.00	AMORTIZADO	0 00			0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corección de detalles. Pendiente de Liquidar.
											POR AMORTIZAR	0.00			at ,					Recepcionado el 30-nov-18
				TOTALES				1,181,787,993.51	299,863,623.23	0.00					476,487,074.98	220,897,509.34	0.00	h		L

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	0.00
1,181,787,993.51	0.00	AMORTIZADO	41,078,179.76
		POR AMORTIZAR	75,107,314,35

TOTAL DE EST	TIMACIONES		GENERAL AL ERÍODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
220,897,509.34	0.00		

Ing. Raúl Márquez Martínez. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA **AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2018.

u y yn 994 24	v .		0.0 0 20		ITUACIÓI	ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2 :	1	0	0	3	0	,3	0
					37 7 , - 1			
					-		9- A, 3	
						. (.		
TOTAL	2	1	0	0	3	0	3	0





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA **EJERCICIO 2017** DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

	NUMERO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO D	E EJECUCIÓN	MONTO	ECONOMÍA		CIPOS	COI	VENIO (PERIODO	- MONTO)	ESTIMA	ACIÓN	AVA	NCE %	
CASO	CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO	ECONOMA	ANTIC	CIPUS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Mc Ginnis						ANTICIPO	5,938,347 81					=			
	1			Empresarios, S A, en	"Restauración y Rehabilitación de Crujia		1			AMORTIZADO	5,938,347.81								
1	0GOP-LPN-F-1-077- 16	5	LPN	participación conjunta con Ingeniería y Construcción Peneruba Company, S. A. de C. V.	Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México*	ra la 23 de 16 35 jul 17 20 601 730 05		POR AMORTIZAR	0.00	23-dic-16	20-dic-17	6,000,000.00	35,691,739.05	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionada		
				Dr. Ann Director do	Mantenimiento de Ciclovia Reforma, en ambos					ANTICIPO	0.00								
2	DGOP-LPN-L-1-034- 17	1	LPN	Espacios, S. A. de C	sentidos en el tramo comprendido rntre Ricardo Flores Magón y Lieja, Delegación Cuauhtémoc.	19-Dic-17	31-Dic-17	29,429,981.82		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	29,429,981.82	100.00%	99.90%	En proceso de Liquidació recepción y finiquito
4-11					Trives magon y cicja, belegación oudamentos.					POR AMORTIZAR	0.00						w		
				Contacto	"Trabajos de remodelación y/o readecuación de					ANTICIPO	0.00							15 +	ATT COLUMN
3	DGOP-AD-L-1-036- 17	5	AD	Construcciones S.A de C.V		27-Dic-17	31-Dic-17	3,980,000.00		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,980,000.00	0.00	100.00%	100.00%	Finiquitada y Recepcionada
	1			J., V	radiona Superior de la Ciduad de Mexico		1			POR AMORTIZAR	0.00							19 19	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	5,938,347.8
63,101,720.87	0.00	AMORTIZADO	5,938,347.8
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO FINANCIERO 29,429,981.82

Ing. José Luis Pichardo Hernández Subdirector de Construcción de Obras Públicas "Bl"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio Dayad Muñoz Calderón Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ª. SESION ORDINARIA 2019

8.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2018

9					SITUACION			N 31 de diciembre de 2
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPO	CIONADOS	CON LIQUIDACI	ÓN Y/O FINIQUITO	EN
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	11	6	0	0	17	0	17	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	4	0	1	12	1	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	16	0	0	4	12	2	14	0
TOTAL	52	10	0	17	45	15	47	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 11DE 2018, 6 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN YONCE CONLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

				v	SITUACIÓ	N ACTUA	L	1.1
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPC	IONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURIDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	11	6	0	0	17	0	17	0
TOTAL	11	6 ;	0	0	17	0	17	. 0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y ONCE EN EL 2018, SEIS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ONCE CONCLUIDOS.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1" Ing. José Figandro Cano Neria. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2" Ing. Raúl Márquez Martínez. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANT	TICIPOS	со	NVENIO (PERÍO	DO - MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	/ANCE %	
aso	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2018		A.	icir os	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del Tribun	al de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	234,611,026.80	0.00					476,487,074.98	54,845,530.80	4,476,821.64			
	4	CRÉDITO Y RAMO 23		*	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 75, Colonia Vertiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México				*		ANTICIPO	0.00								En conciliación el avance físico. El avance fís
١	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA. S.A. DE C.V.	NEACO	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,975,243.56	0 00	AMORTIZADO	15,611,341 46	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	44,603,832.80	0.00	34.99%	6.63%	financiero (incluye anticipo) correspondi ejercicio que se reporta del contrato multian se ajusta en base al Convenio de Reducció Monto. Avances conforme a nueva reprogramación
	r										POR AMORTIZAR	59,495,972.89					# * 11			fecha de terminación al 14 de noviembre de 20
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal						ANTICIPO	0.00								
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte,	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	10,241,698.00	4,476,821.64	35.81%	26.33%	El avance físico y financiero corresponde ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en impor
1				520.0	Delegación Benito Juárez, en la Ciudad					-	POR AMORTIZAR	0 00				8 8 8 88 8 1		62 - 31	8 845 8	plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción del Museo	interactivo infantii iztapalapa			527,185,523.79	426,263,896.09	0.00					0.00	51,498,656.70	3,424,075.98			
					Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.						ANTICIPO	0.00								
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V		23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	4,616,129.89	3,239,246.22	60.62%	21.00%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde
						:					POR AMORTIZAR	0.00								ejercicio que se reporta del contrato multianual.
T					Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.						ANTICIPO	0.00				•				
	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL		26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	321,318.84	184.829.76	37.48%	2.62%	Servicios concluidos
1				MÉXICO, S.A. DE C.V.					•		POR AMORTIZAR	0.00				021,010.04	104,023.70	37.46%	2.02%	El avance fisico y financiero corresponde ejercicio que se reporta del contrato multianual.
+					Construcción del Museo Interactivo infantil						T GIVILII GIVID IIV	0.00								
					iztapalapa.						ANTICIPO	0.00					0			Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde
	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.		29/12/2016	30/03/2018	492,949,831.93	408,345,843.83	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/04/2018	18/12/2018	0.00	46,561,207.97	0.00	21.31%	9.45%	ejercicio que se reporta del contrato multianual base al Convenio con fecha de término al 18-o 18
				-		#/					POR AMORTIZAR	0.00								NOTA: Se encuentra trámite de autorización Convenio de Especial de Ampliacion, o fecha de término al 7 de mayo de 2019.
	***			Construcción de la Fábri	ica de Árie y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,934,363.42	0.00					0.00	16,921,782.46	0.00			
1					Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada						ANTICIPO	0.00								
	DGOP-LPN-F-2-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mèxico-Tacuba, númmero 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciiudad de Mèxico.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	AMORTIZADO	0.00		- 1	0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles.
1				DE C.V.							POR AMORTIZAR	0.00						100.00% 99.8		Recepcionado el 30-nov-2018

9 <u>Jan</u>

1



Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANT	TICIPOS	cc	NVENIO (PERÍOI	DO - MONTO)	ESTIN	MACIÓN	A	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2018	380			INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	- OBSERVACIONES
				Demolición y retiro de Miravalle 913	e material de los inmuebles de Balsas 18 y			412,867.00	412,867.00	0.00					0.00	406,517.84	0.00			
				COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y	Dalam No. 10 Manualla No. 012						ANTICIPO	0.1	00							Servicios concluidos.
7	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	ARQUITECTURA	Miravalie C P. 03580. Delegación Benito Juárez, Ciudad de México A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	AMORTIZADO	0.1	-	٠	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	En proceso de realizar el cierre administrativo pendiente de Recepcionar y liquidar.
					Sistilo del 18 de Septientore de 2017						POR AMORTIZAR	0,0	00							
				Demolición y retiro de n	naterial de inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00					0.00	9,739,528.65	20,390.25			
				PROCESOS DE	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación						ANTICIPO	0.0	10	7						
В	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México A consecuencia del sismo del 19 de septiembre	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	AMORTIZADO	0.0	-		0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos En proceso de realizar el cierre administrativo,
1					de 2017						POR AMORTIZAR	. 00	10							pendiente de Recepcionar y liquidar.
					Supervisión Tecnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo						ANTICIPO	0.0	0			i E	a of s			
- 9	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la- Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	AMORTIZADO	0.0	0 -		0.00	443,604.58	20,390.25	100.00%	95.40%	Servicios concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo pendiente de Recepcionar y liquidar.
					de 2017			2		,	POR AMORTIZAR	0.0	0							periore ne de Necepcional y aquidal.
				Mantenimiento a Puent Distrito Federal (2018).	tes Peatonales en Vialidades Primarias del			19,549,486.92	19,549,486.92	0.00					0.00	1,105,899.92	12,796,999.36			
	•	FONDO DE APORTACIONES PARA			Mantenimiento preventivo y correctivo a 12 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado						ANTICIPO	0.0	0					:		
10	DGOP-AD-L-1-032-18	EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES	AD	SIGMA GDS, S.A. DE C.V.	de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,031,568.50	3,031,568.50	0.00	AMORTIZADO	0.0	-	-	0.00	0.00	2,553,509.16	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.
	- 6	FEDERATIVAS.									POR AMORTIZAR	0.0	0				9			
		FONDO DE APORTACIONES PARA			Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado						ANTICIPO	0.0	0							
11:	DGOP-AD-L-1-033-18	EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	AMORTIZADO	0.0	-	-	0.00	0.00	394,425.52	95.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
		FEDERATIVAS.			revisiones programadas.						POR AMORTIZAR	0.0								1 7/4
		FONDO DE			Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas				***		ANTICIPO	0.0								
12	DGOP-AD-L-1-034-18	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA	Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	AMORTIZADO	0.0	-	-	0.00	856,229.64	4,141,280.04	100.00%	15.93%	Trabajos Concluidos.
		DE ENTIDADES FEDERATIVAS			revisiones programadas.				S 105		POR AMORTIZAR	0.0								
\dashv		FOUND DE			Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas						ANTICIPO	0.0						-		
13	DGOP-IR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A	Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes,	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	AMORTIZADO	0.0	-		0.00	0.00	2.754.600.00	00.000	0.000	
	3-5 5-1-050-10	FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	.15	INMUEBLES, S.A. DE C.V	reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.		30,52010	4,000,002.70	4,000,002.70	0.00			-	-	0.00	0.00	3,751,698.68	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución
			L					L			POR AMORTIZAR	0.0	1							

1 Im

A



Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO ECONOMÍA EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2018	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		RACTUAL			ECONOMÍA	ANTIC	'IPOS	CON	IVENIO (PERÌ	ово - монто)	ESTIM	MACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO	.,	MODALIDAD	Limited.	SZESIM SISK SZESSKIJSKIS	INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2018	LOOKOMA			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
		FONDO DE APORTACIONES PARA		BK DISERIO V	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de						ANTICIPO	0.00								
14	DGOP-IR-L-1-036-18	FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES	IR	CONSTRUCCION, SA	México, derivado de paticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	AMORTIZADO	0.00	-		0.00	249,670.28	1,408,933.68	98.00%	8.05%	Trabajos en proceso de ejecución
		FEDERATIVAS									POR AMORTIZAR	0.00								
		FONDO DE APORTACIONES PARA	ē		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de			=		ı ı	ANTICIPO	0 00								
15	DGOP-AD-L-5-037-18	EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES	AD		solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la	6.000.000.000.000.000.000.000	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	0.00	547,152.28	100.00%	0.00%	Servicios Concluidos.
		FEDERATIVAS.			Ciudad de México						POR AMORTIZAR	0.00			4					
				Reconstrucción del pr Tulyehualco.	rimer tramo de la Carretera Xochimilco-			72,877,493.14	72,877,493.14	0.00					0.00	333,154.74	31,294,660.95			
					Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle						ANTICIPO	20.903,248.84						-		
16	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,493.14	69,677,493.14	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0 00	0.00	29,764,670.66	85.00%	30.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	20.903,248.84								
				COORDINACIÓN	Supervisión Tecnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconstrucción del primer tramo de la Carretera						ANTICIPO	320,000.00				in a				
17	DGOP-AD-L-3-053-18	RECURSOS FISCALES	AD	TÉCNICO	Pueblo Santa María Nativitas, Delegación	24/09/2018	31/12/2018	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	AMORTIZADO	33,315.47	-		0.00	333,154.74	1,529,990.29	100.00%	19.37%	Servicios Concluidos.
					Xochimilco.						POR AMORTIZAR	286,684,53				The broken			1. 4	
				TOTALES				1,237,741,008.28	780,414,133.37	0.00					476,487,074.98	134,851,071.11	52,012,948.18			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	21,223,248.8
1,237,741,008.28	0.00	AMORTIZADO	15,644,656.9
		POR AMORTIZAR	80,685,906.2

Ing. Arq. Isi ro Tovar Mondragón. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Altjandro Gano Nerla. abdirector de Construcción de Toras Públicas A2 Ing. Raúl Márquez Martínez. Subdirector de Construcción de Obras Públicas *A3*

* *



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO D	E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTI	CIPOS	со	NVENIO (PERÍO	DDO - MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	ANCE %	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del Tribun	al de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	0.00					476,487,074.98	266,601,822.46	4,476,821.64			
		CRÉDITO Y RAMO 23			Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76. Colonia Vértz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Cludad de México					ANTICIPO	149,799,999.99					2			Avance físico en conciliación El avance físico
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V		28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	AMORTIZADO	90,304,027.10	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	232,661,495.80	0.00	65.16%	66.77%	financiero (incluye anticipo) corresponde ejercicio que se reporta del contrato multianua se ajusta en base al Convenio de Reducción Monto Avances conforme a nueva reprogramación o
	а					Ð				POR AMORTIZAR	59,495,972 89			* -					fecha de terminación al 14 de noviembre de 201
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal				*	ANTICIPO	0 00								Avance físico en conciliación El avance físico
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V	de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	33,940,326.66	4,476,821.64	100.00%	87.24%	financiero (incluye anticipo) corresponde ejercicio que se reporta del contrato multienual se ajusta en base al Convenio de Reducción Monto.
								à s		POR AMORTIZAR	0.00								Avances conforme al Convenio de ampliación e importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción del Museo	interactivo infantii iztapalapa			527,185,523.79	0.00					0.00	129,047,951.28	3,424,075.98			1
					Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa					ANTICIPO	0.00								
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V	r	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	r 0.00	13,272,885.89	3.239.246.22	100.00%	60.38%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde
										POR AMORTIZAR	0.00			•					ejercicio que se reporta del contrato multianual.
					Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.					ANTICIPO	0.00								
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL	C A-4	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	7,982,202.44	184,829,76	100.00%	65.14%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde :
				MÉXICO, S.A. DE C.V.						POR AMORTIZAR	0.00				,				ejercicio que se reporta del contrato multianual.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.					ANTICIPO	0,00								Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde a
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.		29/12/2016	30/03/2018	492,949,831.93	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/04/2018	18/12/2018	0.00	107,792,862.95	0.00	33.98%	21.87%	ejercicio que se reporta del contrato multianual e base al Convenio con fecha de término al 18-dic 18. NOTA: Se encuentra trámite de autorización e
				n		a				POR AMORTIZAR	, 0.00			-					Convenio de Especial de Ampliacion, col fecha de término al 7 de mayo de 2019.

Ing Arq. Isidro Tovar Mondragón. Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejano o Co Subdirector de Constracción del

000 - 08





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA **AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2018.

				S	ITUACIÓI	N ACTUAL	<u> </u>	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	ONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚB _L ICAS "B"	9	4	0	1	12	1	12	0
91								
							4	
				a B		3-		
		,					=	
TOTAL	9	4	0	1	12	1	12	0







INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de diciembre de 2018

	NUMERO			EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE	EEJECUCIÓN	MONTO	ECONOMIA	ANTICIPO	ns	CON	VENIO (PERIODO	O-MONTO)	ESTIMA			NCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	INICIO	TERMINO	CONTRATADO	CONTONIA			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
				Operadora y	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral					ANTICIPO AMORTIZADO	0.00				- 2				Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el
1	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		POR AMORTIZAR	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	716,024,389.61	0.00	100.00%	73.06%	2018, el monto programado a ejecer financieramente es de \$980,090,544,00 considerados S/IVA e Inflación.
2	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el a equimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Dóra Pública; revisión de preciso unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Clines Metrobios, segunda etapa, en el ejie 3 oriente en el tramo de San Lizaro a la Giorieta de Vaquerios de la conicio de de vial para el Transporte público Clines fortentos en el tramo de San Lizaro a la Giorieta de Vaquerios.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	13,950,154.47	14,824,442.24	76.93%	76.62%	Convenio modificatorio en monto plazo, defivado de reconocimiento de suspensión total y temporal di servicio.
3	DGPE-SBCC-2-015- 16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Linea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	52,076,385.59	4,567,547.46	63.89%	49.42%	Convenio modificatorio en monto plazo, derivado de reconocimient de suspensión total y temporal de servicio
4	DGOP-LPI-F-1-009- 17	2	LPI	Gami Ingenieria e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público linea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Giorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	223,464,490.99	102,542,297.88	22.80%	11.12%	En proceso de obra
5	DGOP-(R-L-1-019-18	25	IR	Multinacionales Martinez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares con juntas especiales tipo transflex"	26-Jun-18	23-Oct-18	8,021,866.67		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	6,681,215.00	257,992.71	100.00%	96,61%	Proceso de recepción
6	DGOP-IR-L-1-020-18	25	IR	Multiservicios Integrales de América, S.A. de C.V.	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México"	27-Jun-18	24-Oct-18	13,581,061.56		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	13,534,874.17	0.00	100.00%	99.62%	Proceso de recepción
7	DGOP-IR-L-1-021-18	25	IR	Multinacionales Martinez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México zona sur"	27-Jun-18	24-Oct-18	12,013,524.07		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	12,013,408.05	0.00	100.00%	100.00%	Liquidada y Recepcionada
8	DGOP-OPIR-L-1-044- 18	25	IR	Impulsora de Desarrollo Integral, S A. de C. V.	"Estudios y reparación de la loza y arleros de trabes en la gaza Sur-Oriente del puente vehicular deportivo Oceania y reparación en la gaza Sur Oriente del puente vehicular Heberto Castillo"	04-Sep-18	02-Nov-18	2,368,290.08		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	2,368,290.08	0.00	100.00%	100.00%	Proceso de recepción
9	DGOP-AD-L-1-045- 18	25	AD	Ingenieria Experimental, S.A de C.V.	"Trabajos emergentes de mantenimiento mayor en estructura de acero que sirve de soporte a la canalización que cruza por paso deprimido en zona cubierta de Av. Toluca al cruce con Periférico Oriente"	04-Sep-18	02-Oct-18	755,120.18		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	534,907.32	100.00%	0.00%	Proceso de recepción liquidación
10	DGOP-AD-L-2-046- 18	25	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	"Trabajos emergentes a precio alzado para la reparación del alero del puente vehicular ubicado en Av. periferico Oriente y Av. Ermita Iztapalapa"	16-Ago-18	14-Sep-18	1,437,912.79		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,437,912.79	100.00%	0.00%	En proceso de Recepción
11	DGOP-AD-L-5-047- 18	25	AD	Euro Estudios S.A. de C.V.	Estudios de inspección detallada, nivelación topográfica y revisión de la capacidad de carga para el distribudar vial entre calzada ermita iztapalapa, y periferico Oriente, en la delegación Iztapalapa*	04-Sep-18	31-Dic-18	1,305,000.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,305,000.00	100.00%	0.00%	En proceso de recepción
12	DGOP-AD-L-2-061- 18	25	AD	Proyectos Civiles Internacionales S.A. de C.V	"Trabajos a precio alzado de reparación del estribo Norte del puente vialidad México Toluca, Col. Santa Martha Acalitla Alcaldía Iztapalapa y fabricación de escalones en canal de Tezontle, Col. Los Picos Iztacalco de la Ciudad de México	14-Nov-18	14-Dic-18	510,410.69		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	NIA	N/A	0.00	510,410.68	100.00%	0.00%	En proceso de recepción
13	DGOP-AD-L-1-039-	11	AD	REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V.	Instalación de la red hidraúlica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuaticas Ciudad de México)	01-08-18	19-09-18	5,438,717.88		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	3,622,828.28	0.00	66.61%	66.61%	Se enuentra pendiente la liberación del cruce de pista por parte de INDEPORTE y OCESA.

 TOTAL DE ESTMACIONES
 AVANCE GENERAL AL PERIODO

 PAGADAS
 EN TRAMITE
 FISICO
 FINANCIERO

 1,043,736,036,24
 125,980,511,08
 0.87
 0.52

ng. José Luis Pichardo Hernández abdirector de Construcción de Obras Públicas "B1" Ing. Eusebio David Muñoz Calderón Subdirector de Construçción de Obras Públicas "B3"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas



CONTRATOS EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	oft .		,		SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	CANCELADOS O	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"		0	0	12	4	12	4	4



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CECAD DE MÉXICO De cadendo luntos



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018

	NÚMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERM EJE	DDG DE CUCIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	os ·	cc	INVENIO (PĒRIODO	-MONTO)	EST	rimación	AV	ANCE	OBSERVACIONES
CZA	CONTRATO			1	0. 1.5000 1.600 1.900 1.000 1.	CIDINI	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2018				INICIO	TERMINO	ОТИОМ	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	Control of the Control
											ANTICIPOS	N/A						1	T	
		i	į.	PLANEACIÓN	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO		i		1		CCASITROMA	N/A	1	1 1			i	1		
	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	iR	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S A	PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	26-dic-18	\$4,526,327.88	\$4,526,327.88	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,052,587.05	71,82%	0.00%**	SUSPENSIÓN TOTAL POR MANDAT JUDICIAL. *
t				-			 			-	ANTICIPOS	N/A	 							
1			1		TRABAJOS DE GESTORIAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR		1		1		AMORTIZADO	N/A	1	1		1			-	
	DGOP-IR-L-3-D48-18	LOÇALES	IR	HDOS CONSTRUCCION ES, S A DE C V	RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA IB DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	\$3,984,810.89	\$1,998,788.72	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$718,222.32	25.16%	0.00%**	SUSPENSION TOTAL POR MANDAT
T											ANTICIPOS	N/A				-				
l		l									AMORTIZADO	N/A	1	1 1						
	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	IR	INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S A DE	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	\$11,468,192.36	\$2,239,221.88	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$288,080.99	5.66%	0.00%**	SUSPENSIÓN TOTAL POR MANDATO
T				IMPULSORA DE							ANTICIPOS	N/A			Management of the Control of the Control					
1				DESARROLLO INTEGRAL S A	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO			1			AMORTIZADO	N/A]	1 1				-	1	9 7 8 8 8
	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES		de C V en participación conjunta con GAMi	LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOSEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-поv-1В	22-dic-19	\$271,284,001.63	\$34,315,054.99	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	በ በበዓራ ቸቸ	SUSPENSIÓN TOTAL POR MANDATO

* 1 Mediante d'icro SCDMX/SOBSE/GGAJ/DAC/825/2018, notificado e' de 13 de noviembre de 2018, e Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jundicios en la Secretaria de Obras y Sevicios de la Cudad de México, refere el Julico de Ampiero 1132/2018, promovido por Bernar Rodoto Floras Querero y Habitantes de la Comunidad Indigena, denominado originalmente "Nepopusco", noy "El Contadero" tramitado ante el Juzgado Pictura de Districto en Máteria Administrativa del Primer Circuito e informa que el Juzgado Federa estema de mayo reference concedera el auspensión provisiona atale la posible afectación que se recierar de Ro Tacubiya, por lo que la Dirección Genera de Obras Públicas deberá abstenais de continuar con la Construcción de Hospita Cudimaga, nasta en tanto se resueva en definitiva el incidencia

*
 Mediente d'Ico CDM/SGBS/DGAJ/SG315/2018, not/icado el de 28 de novembre de 2018, el Súndirector de lo Contaceso de la Dirección General de Asuntos Jundicos en la Secretaria de Obras y Servicios de la Cudad de México, refrire si Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodoto Flores Guerrar y Habitantes de la Comunidad Indigena, denominado organalmente "Nepopuaico", hoy" El Contadero", tramitado arte el Juzgado Primero de Distrito en Materia

Administrativa de Primer Circuito, en ración de lo antenor se hace de conocimiento que enfecha verinduno del mes de novembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente.

1	TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANI	TICIPOS
Ī	43,077,393.48	0 00	ANTICIPOS	NA
. [AMORTIZADO ,	NA
1			POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE E	STIMACIONES		GENERAL ERIODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO
0.00	4,058,890.36	26.11%	0.00%

L.]
En las révistades condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilibid dei derecho que estima la parte promovente le asiste, si se rebine el requisito previsto en la fracción il del aniculo 128
de la Ley de la materia, respecto del afecto y consecuencia para el cuar lo solicitó consistence en que las coses se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por fanto se concede la
suspensión definible para el afecto indicado.

* 3 Mediante cricio CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP*C*/SCOP*C2*/12 11 18/03, se remitió a la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la poligonal a travez del cual se aprecia que el proyecto "Construcción del Hospital General Cualimarpa" no se encuentra dentro de la zona faderal y no afecta el cauce o superficie del no Tacubaya

** El porcentaje de avance financiero se reporta sin valor, debido a que esta área operativa reportará su respectivo avance financiero una vez reciba la Cuenta Liquida Certificada que emite la Dirección de Recursos Financieros.

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTINEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "C2"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

			4,20,00		SITUACIÓ	N ACTUA	L	North Anna Carlo Anna Call Maria
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCI	ONADOS		DACIÓN Y/O NUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	<i>;</i> 16	0	0	4	12	2	14	0
TOTAL	16	0	0	4	12	2	14	0

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

ENLACE

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"



			T	T		Т.		T		T	T									<i>(</i> ,)		
	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA ·	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTIC	POS	CON	/ENIO (PERÍODO	- MONTO)	ESTIMAC	CIÓN	Α	VANCE %	FECHA DE ENTREGA-	CON ACT	GA-
ASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2017				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	RECEPCIÓN	SI	NO
				Construcción del corredor para el servicio complemen	vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones stario	:		1,098,911,032.65	0.00	0.00						1,093,721,032.64	4,367,996.59					
		RECURSOS FEDERALES- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- FONDO DE		S.A. de C.V. en conjunto con	Construcción del corredor vial de la Linea 7 de Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las						ANTICIPO 2016 2017	64'897,171.59 193'823,337.89			0							OBRA TERMINADA EN PROCES ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDAC FINIQUITO.
1 00	GPE-LPN-F-1-007-16	CAPITALIDAD RECURSOS DE FIONANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V., Desarrollo ECO Industrial	Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.		15/10/2017	1,098,911,032.65	969,116,689.46	0.00	AMORTIZADO 2016 2017	64'897,171.59 193'823,337.89	*		0.00	\$ 1,093,721,032.64	4,367,996.59	100 00%	99.53%	10-dic-18	x	LA LIQUIDACIÓN SERÁ CON CARO MULTIANUALIDAD AUTORIZADA P EJERCICIO 2018.
		RECURSOS FISCALES		Mexicano, S.A. de C.V.							POR AMORTIZAR	0.00					1					SE INGRESARON LAS ESTIMACIONI 18 PARA TRAMITE DE PAGO.
			,		ninistrativa y Financiera, para los trabajos de la vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones stario			38,221,877.43	0.00	0.00						37,705,772.95	0.00					
		RECURSOS DE			Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Linea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre						ANTICIPO	0,00										SERVICIOS TERMINADOS, EN PR DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDA FINIQUITO.
2 00	GPE-LPN-2-004-16	FIONANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA) RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S. A de C. V.	Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, co- influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y		30/10/2017	38,221,877.43	34,270,949.53	0.00	AMORTIZADO	0.00	-		0.00	\$ 37,705,772.95	0.00	100.00%	98.65%	10-dic-18	x	LA LÍQUIDACIÓN SERÁ CON CARG MULTIANUALIDAD AUTORIZADA PA EJERCICIO 2018.
		FISCALES			Cuajimalpa.						POR AMORTIZAR	0.00										LA EMPRESA ADEUDA I NFORM PARA EL TRAMITE DE LIQUIDAC FINIQUITO DEL CONTRATO.
		*		Supervisión Técnica, Adr mantenimiento a la carpeta	ministrativa y Financiera para los trabajos de asfáltica			1,606,989.79 -	0.00							1,606,989.79	0.00					
	2 ×		:		Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Linea 7 de Metrobus, en el						ANTICIPO	0.00										:
3 DG	PE-AD-2-004-16	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	Karsemka Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	tramo comprendido entre Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Vasco da Culroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en la Delegación Cuajimalpa.	25/01/2017	20/07/2017	1,606,989.79	1,606,989.79	0.00	AMORTIZADO	0.00	*			\$ 1,606,989.79	0.00	100.00%	100.00%	19-nov-18	x	SERVICIOS TERMINADOS, CON- LIQUIDADO, EN PROCESO DE ENT RECEPCIÓN Y FINIQUITO.
											POR AMORTIZAR	0.00	11									
				Construcción del Centro A Uribe	cuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio			29,662,643.16	29,662,643.16	0.00						20,658,655.20	0.00					
	990	RECURSOS FEDERALES- PROVISIONES	AD III DICACIÓ	CARULI Construcciones, S.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgillo Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.						ANTICIPO 2018	8,898,792.95										
DG	OP-AD-F-1-038-17	SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	N DIRECTA	C.		28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	29,662,643.16	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	6,197,596,56 2,701,196,39	-	-	0.00	\$ 20,658,655.20	0.00	94.00%	69.65%			OBRA EN PROCESO
	•			Rehabilitación de área de U	Jsos Multiples para la adecuación de un Gimnasio				•		FOR AMORTIZAR	2,701,196.39										
_		RECURSOS		en la Pista de Remo y Cano	taje "Virgilio Uribe". Rehabilitación de área de Usos Multiples para la			24,717,462.62	24,717,462.62	0.00						5,475,776.88	0.00					
DG	OP-AD-F-1-039-17	FEDERALES- PROVISIONES SALAPIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	CARULI Construcciones, S.	adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	24,717,462.62	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO	7,415,223.79 1,642,733.06	-	-	0.00	\$ 5,475,776.88	0.00	57.00%	22.15%	2		OBRA EN PROCESO
		REGIONALES II		Servicios de coordinación t afectados por el sismo de poblaciones de la Delegació	lecnica-administrativa y de campo a los inmuebles el 19 de septiembre de 2017 en las colonias y in Xochimilco		. ^.	14,399,209.84	0.00	0.00	POR AMORTIZAR	5,772,490.73				14,399,209.84	0.00					
					Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19						ANTICIPO	0.00									_	SERVICIOS EN PROCESO DE CIE
so	DBSE/DGA/DRMYS G/061-18	RECURSOS FISCALES		PRATS SUÂREZ Supervisión y Construcción S. A. de C. V.	de septiembre de 2017 on las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco de esta Ciudad de México	01/11/2017	31/05/2018	14,399,209,84	14,399,209.84		AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00			0.00	14,399,209.84	0.00	100.00%	100.00%			ADMINISTRATIVO PARA LA ENTE RECEPCIÓN. CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE Ú

Jul

	0	
	0 // 0	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXIC
Contract of the Contract of th	4 /43	

		1		T	T	Т :			1									1				DE MEXICO
1 1000	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONT	DE EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTIC	IPOS	CON	IVENIO (PERÍODO	- MONTO)	ESTIMA	ACIÓN	,	AVANCE %	FECHA DE ENTREGA-	CON ACTA ENTREG RECEPCI	A-
CASO	CONTRATO	0				INICIO	TÉRMINO	TOTAL EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017				INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO RECEPCI	RECEPCIÓN	SI	NO OBSERVACIONES
					ecnica-administrativa y de campo a los inmuebles el 19 de septiembre de 2017 en las colonias y in Tláhuac			21,598,814.73	0.00	0.00		-				21,598,814.73	0.00					
7	SOBSE/DGA/DRMYS G/062-18	RECURSOS FISCALES		BLOC-KE.CUATRO, S. A. de C. V.	Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 15 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tláhuac de esta Ciudad de México		31/05/2018	21,598,814.73	21,598,814.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00		-	0.00	21,598,814.73	0.00	100.00%	100.00%			SERVICIOS EN PROCESO DE CIE ADMINISTRATIVO. CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE ÚI
			7	los puentes peatonales dañ ubicados en Anillo Perifer Coapa y Anillo Periferico, e	Le de Desmontaje, Demolición y retiro de material de siados por el sismo del 19 de seotiembre de 2017, rico esquina calle Cañavereles, Colonia Granjas squina calle Canal Naciona, Colonia de Hueso en y Xochimilco, a Precio Alzado y Tiempo			1,473,736.20	0.00	0.00			8			1,461,272.69	0.00				^	Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
					Trabajos para la ejecución de Desmontaje. Demolición y retiro de material de los puentes peatonales dañados por el sismo del 19 de			-			ANTICIPO	0.00										
8	DGOP-AD-L-2-040-18	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	SIGMA GDS S. A. de C. V.	seotiembre de 2017, ubicados en Anillo Periferico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa Anillo Periferico, esquina calle Canal Naciona, Colonia de Hueso en las Delegaciones Tlalpan y	01/08/2018	31/08/2018	1,473,736.20	0.00	0.00	AMORTIZADO		-		E	1,461,272.69	0.00	100.00%	100.00%	30-nov-18	x	TRABAJOS CONCLUIDOS EN PROCES ENTREGA RECEPCIÓN
	-		-		Xochimilco, a Precio Alzado y Tiempo Determinado.						POR AMORTIZAR	0.00					41 11			1.7		
12.5				del Proyecto Ejecutivo y Co a consecuencia del sismo Periférico esquina Av. Cana	Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración instrucción del Puente Peatonal, el cual fue dañado del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo il Nacional y Antiguo Canal de Cuemanco, Colonia fueso Periférico en las Delegaciones Tialpan y co.	· l	z	11,271,196.96	0.00	0.00						10,944,890.44	0.00					
9	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA		Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puerte Peatonal, el cual fue dahado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuemanco, Colonia Unidad Habiacional del Husso Cuemanco, Colonia Unidad Habiacional del Husso	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00		:	0.00	10,944,890.44	0.00	99.50%	97.10%			Montaja de columnas metalicas en obra. En proceso de terminación de fabricació estructura en taller, pruebas de calida
					Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00										soldadura para la aplicación de pi protectiva.
				del Proyecto Ejecutivo y Cor a consecuencia del sismo	Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración nstrucción del Puente Peatonal, el cual fue dañado del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anitio Cañaverales, Colonía Granjas Coapa, en las nimilco, Ciudad de México.	ı		9,027,777.50	0.00	0.00					H	8,656,027.13	0.00					ž.
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dafado a consecuencia del sismo del 19 de						ANTICIPO	0.00										Colado de columnas, instalación de cabe, para conexión de pasarelas de estru
10	DGOP-OPIR-L-4-042- 18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAMI Ingenieria e Instalaciones, S. A. de C. V.	septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, Colonia Granjas Coapa, en las Delegaciones Tialpan y Xochimilco, Ciudad de México.	28/08/2018	10/11/2017	9,027,777.50	0.00	0.00	AMORTIZADO					8,656,027.13	0.00	99.50%	95.58%			metálica En proceso de terminación de fabricación o estructura metálica en taller; pruebas de cal
				Proyectos Integrales para la a consecuencia del sismo	control administrativo y financiero para los construcción de los puentes peatonales dañados 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo			1,022,377.76	0.00		POR AMORTIZAR	0.00										de soldadura para la aplicación de pir protectiva.
				esquina Av canal Nacional. Xochimilco, Ciudad de Méxic				1,022,377.76	0.00	0.00						913,780.72	0.00					
11	DGOP-AD-L-5-043-18	FINANCIAMIENTOS	ADJUDICACIÓ	Construcciones I CAR, S. A.	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle	18/08/2018	30/11/2017	1,022,377.76	0.00		ANTICIPO	0.00										Se continua con la supervisión de los trab de fabricación de estructura metálica en talle
11 DGOP		INTERNOS	N DIRECTA	de C, V.	Cañaverales, colonia Granja Coapa y Anillo Periferico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	700012010	30/11/2017	1,022,311.10	0.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00				913,780.72	0.00	90.00%	89.38%			Se documenta la estimación número 01 para tramite.
				Elaboración del Proyecto Eje de San Juan Ixtayopan	ecutivo para la Rehabilitación del mercado público			4,503,636.62	0.00	0.00						0.00	4,245,324.93					
12	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales	s INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	,06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4 245 224 02	100.00%	0.00%			En proceso de entrega del proyecto ejecutivo
	2 3 333 10	(FOHADEN-CDMX)- 2016	A								POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	4,245,324.93	100.00%	0.00%			finiquito de contrato



	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	MODALIDAD	MODALIDAD	MODALIDAD	MODALIDAD	MODALIDAD	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN ACTUAL	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPI	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		VANCE %	FECHA DE ENTREGA-	CON ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2017				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	RECEPCIÓN	SI NO							
				Elaboración del Proyecto Ej Santa Cecilia	jecutivo para la Rehabilitación del mercado público			2,336,313.98	0.00	0.00						0.00	2,215,151.08					v						
	31	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos			Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia						ANTICIPO	0.00																
13	DGOP-IR-L-5-057-18	Públicos-Atención a los Desastres Naturales	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Irkon Holdings, S. A. de C. V.	c. v.	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	AMORTIZADO			- 0.00	0.00	0.00	2,215,151.08	100.00%	0.00%			En proceso de entrega del proyecto ejecutivo finiquito de contrtato						
		(FONADEN-CDMX)- 2016									POR AMORTIZAR	0.00																
		'		Elaboración del Proyecto Ej de artesanias y curiosidade:	ecutivo para la Rehabilitación del mercado público s de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00						0.00	3,871,027.88											
		Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos			Elaboración del Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación del mercado público de artesanlas curiosidades de San Juan				77,749.84 0.00	0.00	ANTICIPO	0.00						3 100.00%										
14	DGOP-IR-L-5-058-18	Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.		13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84			AMORTIZADO				0.00	0.00 _ 3,871,02	3,871,027.88		0.00%			En proceso de entrega del proyecto ejecutivo finiquito de contrtato						
		2016									POR AMORTIZAR	0.00				Less	2.5					I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						
			8 3468	San Juan Ixtayopan y el ec	e los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, dificio de Administración y Áreas de Servicios del ilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00					, .'	0.00	10,414,722.10											
		No Etiquetado			Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el						ANTICIPO	0.00	-					-										
15	DGOP-AD-L-2-060-18		ADJUDICACIÓ N DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	edificio de Administración y Áreas de Servicios de mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado	15/11/2018	19/12/2018	18 10,430,642.34	0.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%			En proceso de Liquidación y Finiquito						
		Original Treansferido para fines específico			Tiempo Determinado.						POR AMORTIZAR	0.00						100.0070	0.00%			En proceso de Liquidación y Finiquito						
				Elaboración del Proyecto Ej San Gregorio Atlapulco	l jecutivo para la Rehabilitación del mercado público			4,175,507.10	0.00	0.00						0.00	2,137,533.64											
		Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos			Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio						ANTICIPO	0.00																
16	DGOP-AD-L-5-065-18	Públicos-Atención a los Desastres Naturales	ADJUDICACIÓ N DIRECTA	Servicios de Ingenieria, S. A.	GEONICA Proyectos y Atlanutco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	AMORTIZADO			-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%			En proceso de entrega del proyecto ejecutivo						
		(FONADEN-CDMX)- 2016		de C. V.							POR AMORTIZAR	0.00										finiquito de contrtato						
				TOTALES				1.279,236,968.52	54,380,105.78	0.00						1,217,142,223,01	27,251,756.22											

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	275,034,526.21
1,279,236,968.52	0.00	AMORTIZADO	266,560,839.10
		POR AMORTIZAR	8,473,687.11

TOTAL DE ESTIMACIONES

AVANCE GENERAL AL PERDOO

PAGADAS

EN RÁMITE

FÍSICO

FINANCIERO

1,217,142,223.01

27,251,756.22

M. EN I FFRAÎN ALVAREZ MARTÎNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" SOBJE

Secretaria de Obras y Servicios
rección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas D'

Av. Francisco del Paro y Tronciro No. 358 Los, riagioneras hipoteca, L. v. glibboli olarza, di. potenio Tel: 5794 - 1416 — Ext. 251



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ª. SESION ORDINARIA 2019

9. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

9.1 Listado de Casos número DCOP" B" /01/2019

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Sesión : 1a. Ordina Ordinaria : (X Fecha : 13 de febr)		extraordinaria :	()		DIRECCIÓN SOLICITANTE Dirección de Cons PROCEDIMIENTO SOLICITADO CONTRATACIÓN DE OB CONTRATACIÓN DE SU CONTRATACIÓN DE SEI	trucción de Obras Públicas "B" : ADJUDICACIÓN DIRECTA RA (X) PERVISIÓN ()	PROGRAMA: MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES PARTIDA PRESUPUESTAL: 6151 OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: CDMX/SOS/DGAF/0047/2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO: 200,000,000.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE: 200,000,000.00
CASO N úm.	CANTID	UNIDAD DE MEDIDA	DESCR	IPCIÓN DE LA C	BRA O SERVICIO	MONTO ESTIMADO	FUNDAMENTO LEGAL	DICTAMEN DEL SUBCOMITÉ
DCOP"B"/01/2019	4	Km	largo de la interseccion Crisóstomo	Calzada General Ig nes con Rojo Góm Bonilla (Guelatao)	rantados, ubicados a lo inacio Zaragoza, en sus ez, Canal de San Juan , y Republica Federal, en i Ciudad de México.	Subtotal \$27,400,085.65 I.V.A. \$ 4,384,013.70 Total \$31,784,099.35 Sin Antipicipo de Obra	Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo: 3, Inciso A, Fracción I; 5; 23; 24, Incisos II, VII y XIII y 64 Bis, Incisos I y II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y los Artículos 1; 75, Incisos I, II, III y IV y 75-B, Incisos I, II, III y IV de su Reglamento, asi como la Sección 6.1 y 6,1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.	
Ing. Edg S <u>ubdirector de d</u>	jar Fernai	RUEBA ndo Murillo Flo écnica de Obra	res as Públicas	PRE	IDENTE	CONTRALOR CIUDANO	CONTRALOR CIUDADAN	O VOCAL
Ing. Euset Director de Cons				Inj. Eusebio Cal	alrios Fuentes Orrala onstrucción de Obras Públicas CAL xto Madariaga Soto Construcción de Públicas "B"	VOCAL Ing. Carlos Arceo Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"		nstrucción de Dirección de Ingeniería de Costes y



Ciudad de México, a 7 de febrero de 2019

C.P. 15850

JUSTIFICACIÓN DEL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DEL "MANTENIMIENTO DE PUENTES ANTIRANTADOS UBICADOS A LO LARGO DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, EN SUS INTERSECCIONES CON ROJO GOMEZ, CANAL DE SAN JUAN, CRISÓSTOMO BONILLA (GUELATAO) Y REPÚBLICA FEDERAL, EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

1.- ANTECEDENTES:

En las obras de este tipo de puentes vehiculares atirantados, con el paso del tiempo y la falta de un proceso de mantenimiento en general, van acumulando una disminución física en sus propiedades de estabilidad y/o funcionabilidad, tanto de tipo estructural como constructivo, esto debido principalmente a la insuficiencia de los recursos presupuestales que se autoriza anualmente, condicionando la realización del mantenimiento correspondiente a los remanentes presupuestales que conlleve a la realización de un mantenimiento mínimo necesario de acuerdo al manual elaborado por el área técnica de la empresa Ingeniería Experimental, S.A. DE C.V., quien realizo el diseño estructural de dichos Puentes Atirantados, haciéndose prioritaria la necesidad de su realización debido a las condiciones de emergencia provocadas por sismos de alta intensidad que ocasionaron daños en las estructura de algunos de estos puentes, como lo fue el caso del Puente Vehicular República Federal que en el año 2012 se sustituyó el tablero Central.

Algunas otras intervenciones se originaron por las condiciones de comportamiento irregular, que afectaron las condiciones de seguridad en los puentes, entre los casos que se pueden mencionar es la reducción de la junta constructiva de 42 a 2 cm en la zona de bielas en el tablero central del puente de Amador Salazar; caso contrario a lo anterior en el puente de Av. Telecomunicaciones las juntas constructivas que delimitan el tablero central se quedaron sin holgura originando una afectación en vigas principales y secundaria por lo que se realizó el recorte del tablero central y la reparación de la estructura de acero.

Debido a la falta de la realización del mantenimiento correspondiente con la frecuencia recomendada, a la fecha se tiene la necesidad de realizar una evaluación de las condiciones de seguridad y servicio en cada puente atirantado para estar en posibilidades de establecer un programa de mantenimiento acorde con las necesidades en cada puente, lo que se deriva después de realizar la inspección física y los levantamientos topográficos correspondientes.

2.- UBICACIÓN DEL INMUEBLE.

Los puentes atirantados, se ubican a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza en el tramo comprendido del el Eje 5 Oriente (Javier Rojo Gómez) hasta la Av. Amador Salazar, como a continuación se indica:

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuci Alcaldia Venustiano Carranza, Ciudad de México Tel. 57-64-14-15 Ext. 280



- ROJO GOMEZ.- 19.405341, 99.070823
- CANAL DE SAN JUAN.- 19.398129, 99.05833
- GUELATAO.- 19.385980, 99.036989
- REPÚBLICA FEDERAL.- 19.372246, 99.015470

3.- SITUACIÓN ACTUAL.

Cada puente atirantado, de manera particular tiene características especiales, sin embargo, de manera general se determinan acciones de ajuste y nivelación estructural derivado de los hundimientos diferenciales del subsuelo, así como a las contracciones lineales del mismo, lo que en un solo caso genera empotramientos de la estructura, para los cuales se describen las condiciones que prevalecen en cada uno de estos y las recomendaciones y/o propuestas de atención y/o corrección a realizar con el objetivo de eliminar los riesgos estructurales y de funcionalidad correspondiente.

Puente Vehicular J. Rojo Gómez

Las intervenciones autorizadas en administraciones anteriores para dar el Mantenimiento a los puentes atirantados, en el ejercicio se contempló básicamente la determinación de las condiciones de seguridad y servicio de la estructura del puente, el calzado en el apoyo principal sur y en el apoyo articulado localizado en el extremo sur del puente, así como la verificación de las condiciones de carga en la totalidad de los tensores, así como la realización de una etapa de retensado en algunos de los tensores que nos ayudó a corregir un desnivel importante que se tenía en la articulación, donde se localizan las bielas, desnivel con una magnitud de 26 cm, que obstaculizaba el funcionamiento del puente. Otro de los problemas que se corrigió en esta etapa, fue la recolocación de una de las tuercas de la articulación fija del tablero central, que por fortuna cayo en el patín inferior de una de las vigas principales.

Puente Vehicular Canal de San Juan.

Se ha recibido poca atención en las anteriores administraciones, lo que tiene relación de alguna manera con un comportamiento no muy irregular en términos generales, pero cabe hacer mención que en la Etapa de Mantenimiento realizada en el ejercicio 2017 derivada de la inspección física realizada en la estructura metálica se encontró un degollamiento de una de las anclas de la articulación norte orientada hacia el poniente, lo que requiere una pronta atención; al igual que una viga secundaria que se localiza en la proximidad del apoyo principal sur (mástil sur), la que presenta una fisura.

El área técnica identifica un problema en el puente vehicular, que tiene relación con el cruce de un ramal del Drenaje Profundo que se localiza en la distancia media entre el mástil sur y



el apoyo articulado localizado en el extremo sur, en la intervención realizada en el ejercicio 2017 se realizaron algunos calzados, por lo que se tiene contemplado para esta Etapa de Intervención la realización de una corrección geométrica a lo largo del puente, esto será determinado oportunamente por el área técnica.

Una actividad de suma importancia al programarse alguna etapa de mantenimiento en el puente es la verificación de las condiciones de carga en el sistema de atirantado y en su caso el ajuste de las cargas de acuerdo con los requerimientos marcados por el área del proyecto estructural.

Puente Vehicular Crisóstomo Bonilla (GUELATAO).

Podemos identificar este puente como una de las estructuras con poca atención en anteriores administraciones, igualmente tiene relación con un comportamiento no muy irregular en términos generales, en este caso en los trabajos de mantenimiento realizados en el ejercicio 2017 se identificó un problema en los puentes en la articulación sur del puente que tiene relación con un abocardamiento en la conexión de los pernos con las vigas de acero principales.

Un problema que aqueja a este puente es la influencia por la presencia de un ramal del drenaje profundo que se localiza en la distancia media entre el apoyo principal sur y el apoyo articulado, que se manifiesta en asentamientos diferenciales importantes en los apoyos localizados en el extremo sur del puente, lo que fué resuelto parcialmente en la etapa de Intervención realizada en el ejercicio del 2017.

Se tiene contemplado en esta etapa una nueva intervención para concluir con la corrección geométrica en esta zona del puente para evitar que se incrementen los desplazamientos medidos en cada uno de los apoyos.

En los puentes de Canal de San Juan como en Crisóstomo Bonilla, es necesario el habilitado de accesos para permitir el ingreso hacia al interior de los aireplenes, ya que desde su construcción no sea realizado ninguna inspección física visual para determinar el estado de conservación de la estructura de concreto armado, así como el apoyo de las vigas de acero con conectan y apoyan con el aireplen.

Puente Vehicular Republica Federal.

En marzo del 2012 se presentó en la Ciudad de México un sismo de alta intensidad, que termino por dañar la estructura del tablero central que tuvo que cerrarse de inmediato para realizar su reparación, trabajos consistentes en el retiro del tablero existente y la fabricación como la colocación de un nuevo tablero dejando una holgura suficiente para permitir no tener problemas con el tablero central no menos de 6 años, están por cumplirse 7 años de que el puente fue intervenido conservando por el momento una holgura suficiente.

El mal comportamiento del puente se relaciona con un efecto geológico que afecta el extremo sur del puente, ocasionando que el puente presente un desplazamiento de sur a norte, esto



justifica la afectación sufrida en la estructura del tablero central, una clara manifestación de este problema se pudo observar en la intervención realizada en el 2012, se presentó una deformación importante en las vigas principales coincidentes con el apoyo articulado del lado sur, lo que amerito una intervención complementaria para realizar los trabajos de reparación en la estructura de acero.

El mal comportamiento observado en el puente en el extremo sur, derivo en la necesidad de realizar un cambio de neoprenos, así como la realización de una corrección geométrica en el ejercicio 2012, con la obtención del diagnóstico actualizado se revisará la necesidad de realizar una nueva etapa de calzado en todos los apoyos del extremo sur del puente.

Uno de los aspectos a cuidar en la etapa que se tiene prevista realizar este año es la inspección y la evaluación de la estructura de concreto armado, tanto a nivel de cimentación en los apoyos principales norte y sur (celdas de cimentación), como en los aireplenes que desde su construcción no han sido inspeccionados. Como se comentó en los demás puentes, el realizar la inspección física visual nos ayudara a determinar el estado de conservación o de deterioro, definiendo también las condiciones del apoyo de las vigas principales de acero que conectan y apoyan con la estructura del aireplen.

Este puente por su histórica mala tendencia de comportamiento amerita una definición técnica del tipo estructural para su aplicación a corto plazo para no permitir que se presente una nueva afectación en el tablero central, solución que puede estar orientada a un recorte del tablero central que nos permita generar una nueva holgura.

4.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

Como resultado a las múltiples inspecciones que se han realizado a cada uno de los puentes atirantados en comento y en virtud del frecuente desplazamiento estructural vertical y horizontal, se obtiene la necesidad de implementar un programa de mantenimiento correctivo y preventivo de manera continua por lo cual se considera de forma inicial.

- Realizar un estudio de geotecnia para determinar la estratigrafía del subsuelo.
- Realizar un levantamiento topográfico que nos describa la posición actual de las zapatas de apoyo, los desplomes o desviaciones de columnas, comportamiento y situación actual de los tirantes.
- Alternativa de refuerzo de cimentación a base de pilas para dar solución total.
- Toma de radiografías y revisión de tiempo de vida de tensores.
- Estado mecánico de las juntas constructivas entre elementos estructurales del puente, la ejecución de los trabajos de cambio de tirantes, torones, juntas constructivas y juntas de dilatación.
- Cambio de los apoyos de neopreno de la estructura metálica, pintura de elementos metálicos y su tratamiento contra la corrosión.
- Verificación e implementación de rangos de seguridad y servicio.

Revisiones de celdas de cimentación y su limpieza.

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 15850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico Tel. 57-64-14-15 Ext. 280



 Rehabilitado del pavimento de la superficie de rodamiento en las entradas o salidas, para mejorar las condiciones de operación en cada uno de ellos.

Cabe hacer mención que estos trabajos por la importancia del paso vehicular y en apego a las normas viales, se programarán jornadas nocturnas para reducir el impacto social que conlleva el cerrar estas vialidades en horario diurno.

A fin de incrementar la visualización del programa de mantenimiento de los Puentes Atirantados de referencia, se incluye una presentación de su comportamiento. (Anexo 1)

5.-SITUACIÓN FINANCIERA.

Para la realización de los trabajos se cuenta con la Autorización de Recursos dispuestos por la Lic. Gabriela Del Olmo Albarrán, Directora General de Administración y Finanzas para el ejercicio fiscal 2019, manifestado mediante oficio No. CDMX/SOS/DGAF/0047/2019 de fecha 14 de enero de 2019 en el cual refiere al oficio SAF/SE/0083/2019, donde el Congreso Local decreta el presupuesto de egresos de la Ciudad de México. (Anexo 2)

6.- CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN.

Las razones que fundamentan la contratación de los trabajos en mención, se enuncian a continuación:

Se recurre al procedimiento Adjudicación Directa, para lograr obtener el beneficio de economía, rapidez, eficacia y eficiencia, seleccionando a la empresa contratista idónea que cuente con la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera, con la disponibilidad de respuesta inmediata para el inicio de los trabajos, así como la disminución de los tiempos requeridos en un proceso de Licitación Pública.

- Economía: Se opta por llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, debido a que mediante éste se obtiene el mismo nivel de calidad requerido y esperado en su ejecución comparado con una Licitación Pública, con un menor costo para el Gobierno del Distrito Federal en la ejecución de los trabajos que se pretenden realizar.
- Eficacia: Se optó por llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, debido a que mediante éste se atiende con mayor rapidez el objetivo en lugar de la Licitación Pública, evitándose problemas de interrupciones y retrasos en el inicio de los trabajos por posibles inconformidades. Así mismo la contratista seleccionada tiene la experiencia requerida por la Dependencia en cuanto a trabajos similares, capacidad



técnica, económica y administrativa, así como contar con los recursos para iniciar de inmediato los trabajos.

Por otra parte, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una Adjudicación Directa, lo que redundaría en ejecutar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, cualquier retraso y problemas a la población, atendiendo de inmediato a la necesidad de ejecutar los trabajos.

- Eficiencia: De lo anterior se concluye llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa, debido a que la empresa deberá contar con la capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, y humanos que garanticen el iniciar y llevar a cabo los trabajos que se le asignen con la calidad requerida y en el periodo estipulado de acuerdo a las necesidades y, bajo las condiciones que se presenten durante el desarrollo de los mismos.
- Transparencia: La contratación de la obra será conforme a lo establecido en La Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, dado las condiciones de urgencia de atención a la ciudadanía, para evitar, en lo posible algún accidente de gravedad a los habitantes colindantes y transeúntes.

7.- CONCLUSIÓN.

Como consecuencia del alto flujo vehicular que transita sobre cada uno de los puentes atirantados de la Calzada Ignacio Zaragoza, y los movimientos diferenciales del subsuelo de la ciudad de México donde se encuentran ubicados estos puentes, se observan los diferentes desniveles generados, que obstaculizan el libre tránsito y ponen en riesgo la seguridad de las personas que circulan sobre y bajo estos puentes, es de vital importancia la inversión para el mantenimiento de los puentes, que dará plusvalía a la inversión del instrumento urbano.

8.- FUNDAMENTO LEGAL.

Por lo antes expuesto, la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos de demolición mediante la modalidad de Servicios bajo el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución de Política de Los Estados Unidos Mexicanos, Artículos: 3, inciso A Fracción I; 5; 23; 24, Inciso C; 61, Párrafos 1 y 2; 63, Incisos II, VII y XIII, y 64 Bis, Incisos I y II, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; los Artículos: 1, 75, Incisos I, II, III y IV y 75-B, Incisos I, II, III y IV, de su Reglamento, así como la Sección 6, Incisos; 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.



CONSTITUCIÓN DE POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

A. La Obra dentro de la cual podrán estar:

I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles;

Artículo 5.- Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.

Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.

Artículo 24.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar Obra Pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

C.- Adjudicación Directa.

Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62, y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de Licitación Pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de Licitación Pública y celebrar contratos de Obra Pública, a través de optar por un procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes o de Adjudicación Directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la Contraloría para su intervención.





Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar Obra Pública a través de optar por un procedimiento de Invitación Cuando Menos a Tres Participantes o de Adjudicación Directa, cuando la Licitación Pública no sea idónea, y siempre que.

- Peligre la integridad física de las personas o se altere el orden social, la 11. economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal.
- VII. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservación, restauración, demolición o reparación de bienes inmuebles, incluyendo los de infraestructura urbana en los que no sea posible precisar previamente su alcance, establecer conceptos. catálogos y cantidades de trabajo, especificaciones correspondientes, o elaborar el programa de ejecución;
- XIII. Se trate de obra pública o servicios relacionados con la misma, cuya ejecuci¾n deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales;

Artículo 64 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:

- 1. Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;
- 11. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas:

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior.

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuça, C.P. 15850

Alcaldia Venustiano Carranza, Ciudad de México Tel. 57-64-14-15 Ext. 280



REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 1.- El objeto del presente Reglamento es el regular las disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal con respecto a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública, los servicios relacionados con la misma y los proyectos integrales que lleven a cabo las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo 75.- Para efectos de la fracción XVI del artículo 63 de la Ley, las obras de emergencia se adjudicarán directamente, sin la aprobación del comité o subcomité respectivo, conforme siguiente procedimiento:

- I. Se contratará al contratista que cuente con la disponibilidad inmediata en cuanto a requerimiento de los insumos necesarios y que pueda proceder enseguida a la ejecución de los trabajos según la emergencia de que se trate;
- II. Las formalidades administrativas inherentes a la obra de que se trate se irán instrumentando conforme lo permitan el desarrollo de los trabajos y la emergencia;
- III. Se llevará el registro de los recursos invertidos por el contratista en el proceso de ejecución de los trabajos de emergencia, información que servirá para la integración de los precios; y
- IV. Una vez concluidos los trabajos, se deben determinar los conceptos de trabajo, cantidades de obra desarrolladas y precios correspondientes, así como los importes por cada concepto según su cantidad de obra ejecutada y el monto total, para proceder a formular el convenio modificatorio o especial para pago ajustado a la realidad de cantidades de obras y precios.

Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 15850, Alcaldia Venustiano Carranza, Ciudad de México Tel. 57-64-14-15 Ext. 280



Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;

- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

SECCIÓN 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, basados en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno del Distrito Federal.

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.

Por lo anterior, para este caso particular, se recomienda adjudicar los trabajos de mantenimiento a puentes atirantados a la empresa contratista "Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.", mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, tal como está previsto

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdelena Mixhuca, C.P. 15850 Alcaldia Venustiano Carranza, Ciudad de México Tel. 57-64-14-15 Ext. 280



en el Artículo 24, inciso C, de La Ley de Obras Púbicas del Distrito Federal, en la modalidad de **Precios Unitarios** y **Tiempo Determinado**, con un periodo de ejecución de **ocho meses** (**245 días naturales**), **no se otorga anticipo** para el inicio de los trabajos, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por ministraciones que se establecerán en el contrato, en función de avances o actividades terminadas. Las propuestas que presente el contratista en este caso, tanto en los aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosados por "partidas" y/o actividades principales.

La supervisión de los trabajos se realizará internamente por parte del personal técnico a cargo de esta Unidad Administrativa.

Es importante señalar que previo al inicio de los trabajos de mantenimiento a puentes atirantados, es indispensable contar con un "Levantamiento, Evaluación y Procedimiento" detallado y acorde a las necesidades del lugar; así como de la instalación de los tapiales y señalamientos que permita evitar daños a las personas que transiten sobre y por debajo de los puentes, realizar los cierres y desvíos vehiculares a fin de evitar congestionamiento vial y garantizar la agilidad de la ejecución de los trabajos en el tiempo determinado.

La presente justificación se elabora en la Ciudad de México a los 7 días del mes de febrero de 2019, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

ELABORÓ

Ing. Eusebio Dávid Muñoz Calderón Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3". Vo. Bo.

Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto Director de Construcción de Obras Públicas "B"

ANEXO 1



RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PUENTES VEHICULARES ATIRANTADOS, UBICADOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO


FEBRERO DE 2019



INDICE

- 1. METODOLOGIA PARA DEFINIR CRITERIOS Y PRIORIDADES DE INTERVENCION.
- 2. RESUMEN DE INTERVENCION ANTERIORES EN PUENTES ATIRANTADOS.
- 3. COMPORTAMIENTO DE PUENTES:
- ROJO GOMEZ
- CANAL DE SAN JUAN
- CRISOSTOMO BONILLA
- REPUBLICA FEDERAL
- 4. RESUMEN DE INTERVENCIONES POR DESARROLLAR
- 5. COSTOS DE LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN




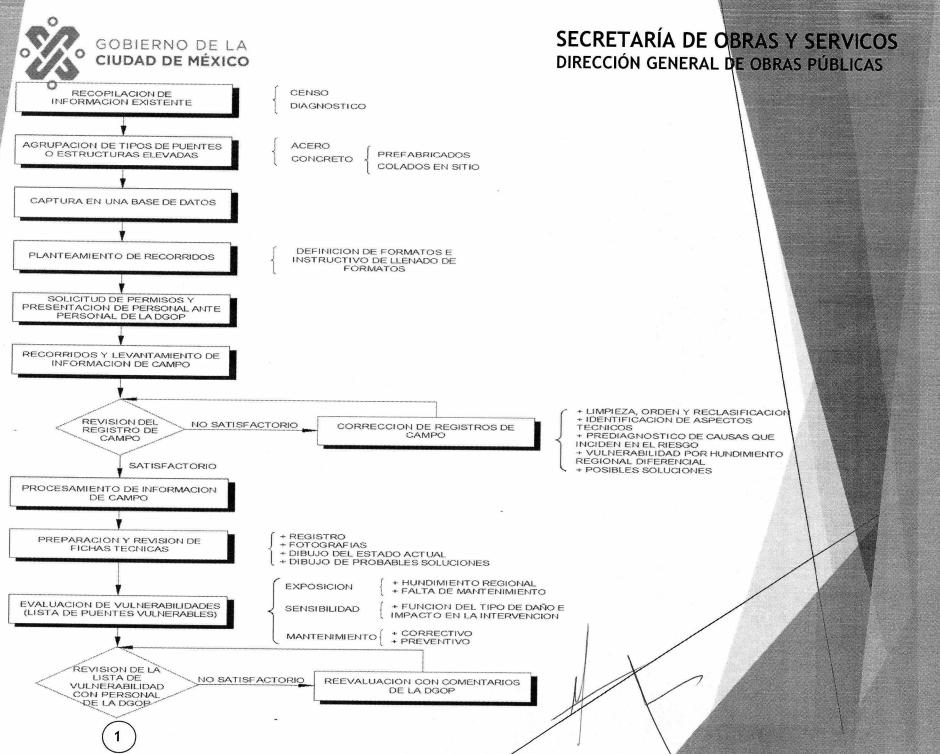






SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

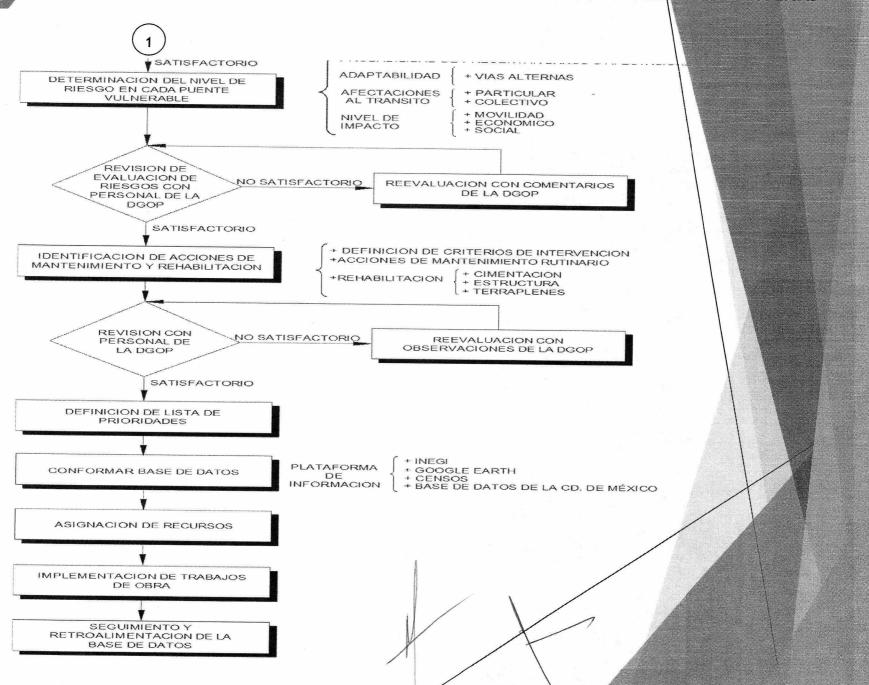






SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Control of the contro	AÑO DE ULTIMA	
PUENTE	INTERVENCION	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
1 ROJO GOMEZ	2013	 REVISION DE CARGAS Y RETENSADO EN TENSORES CALZADO EN EL MASTIL SUR REGISTROS Y LIMPIEZA EN CELDAS DE CIMENTACION(MASTILES) MONITOREO TOPOGRAFICO DE SEGUIMIENTO INSPECC. Y EVALUACION DEL ESTADO DE SEG. Y SERV.
2 CANAL DE SAN JUAN	SIN INTERVENCION	SOLO MONITOREO TOPOGRAFICO
3TELECOMUNICACIONES	2016	 INSPECC. Y EVALUACION DEL ESTADO DE SEG. Y SERV. REHABILITACION DEL TABLERO CENTRAL PARA INDUCIR HOLGURAS EN LA ARTICULACION SENCILLA Y EN LA DOBLE REVISION DE CARGAS Y RETENSADO EN TENSORES MONITOREO TOPOGRAFICO DE SEGUIMIENTO
4 CRISOSTOMO BONILLA	SIN INTERVENCION	 SOLO MONITOREO TOPOGRAFICO INSPECCION OCULAR DE FORMA PRELIMINAR
5 REPUBLICA FEDERAL	2012	 INSPECC. Y EVALUACION DEL ESTADO DE SEG. Y SERV. REHABILITACION DE TABLERO CENTRAL PARA INDUCIR HOLGURAS (SUSTITUCION DEL TABLERO) REPARACION DE VIGAS PRINCIPALES EN EL APOYO 4 CAMBIO DE NEOPRENOS EN TODOS LOS APOYOS DEL LADO SUR REVISION DE CARGAS Y RETENSADO EN TENSORES APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS ESTRUC. DE ACERO Y CONCRETO MONITOREO TOPOGRAFICO DE SEGUIMIENTO REGISTROS Y LIMPIEZA EN CELDAS DE CIMENTACION (MASTILES)
6 AMADOR SALAZAR	2016	 MANTENIMIENTO A LOS DISP. DE CONTROL APOYOS 4 Y 5 REVISION DE CARGAS Y RETENSADO EN TENSORES INJERTO PARA REDUCIR LAS HOLGURAS EN EL TABLERO CENTRAL (ARTICULACIONES SENCILLA Y DOBLE) MONITOREO TOPOGRAFICO DE SEGUIMIENTO INSPECC. Y EVALUACION DEL ESTADO DE SEG. Y SERV.

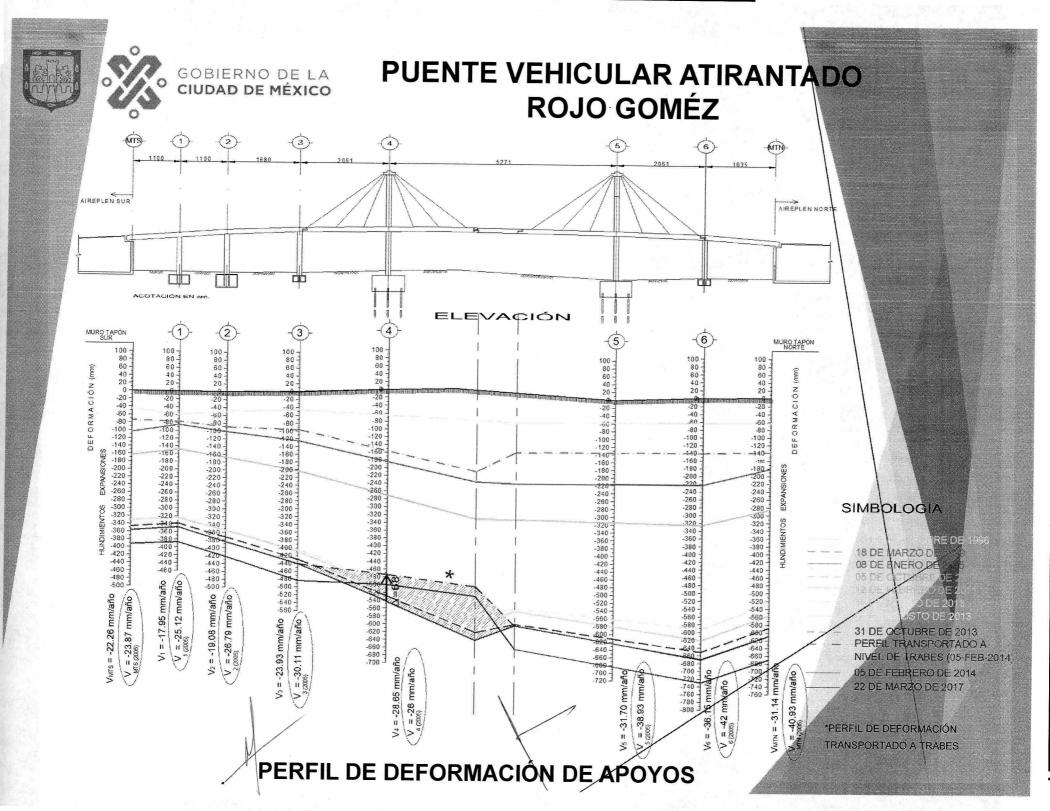

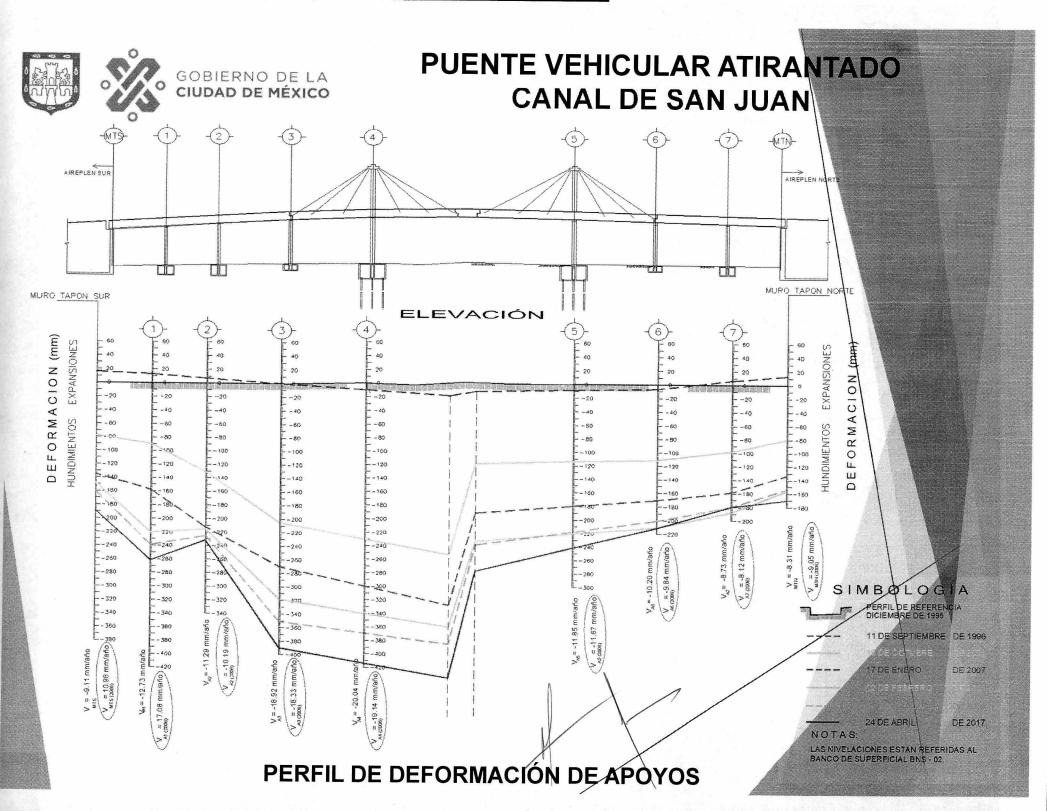

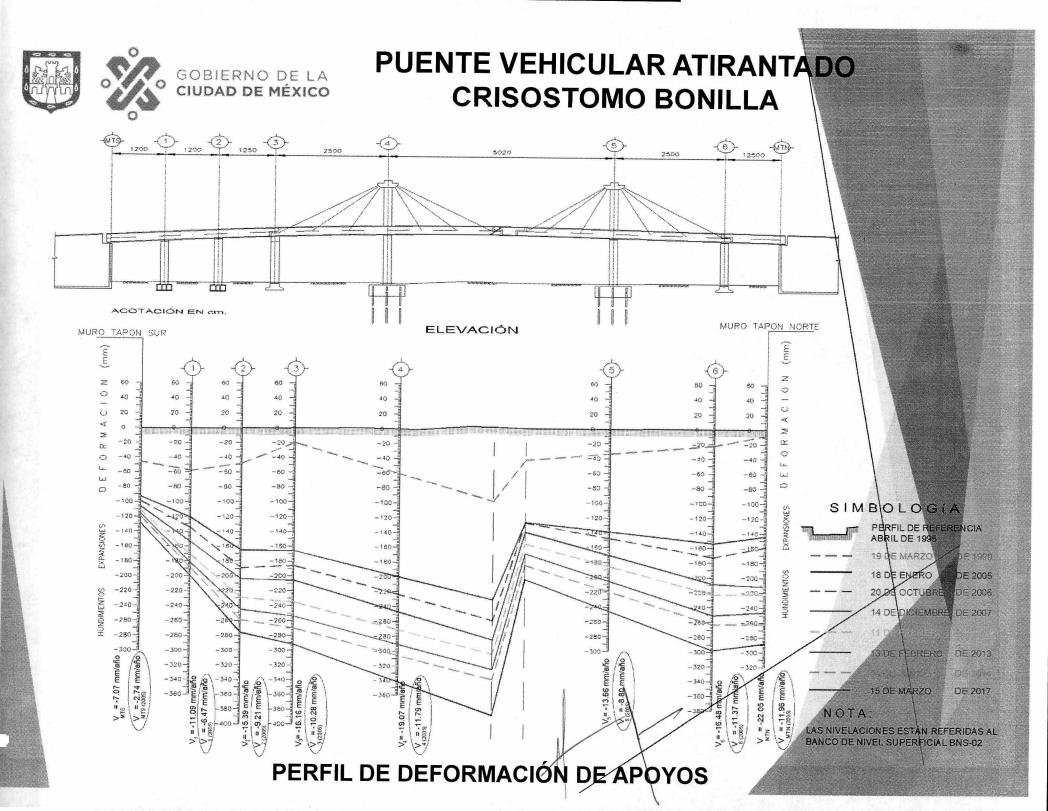

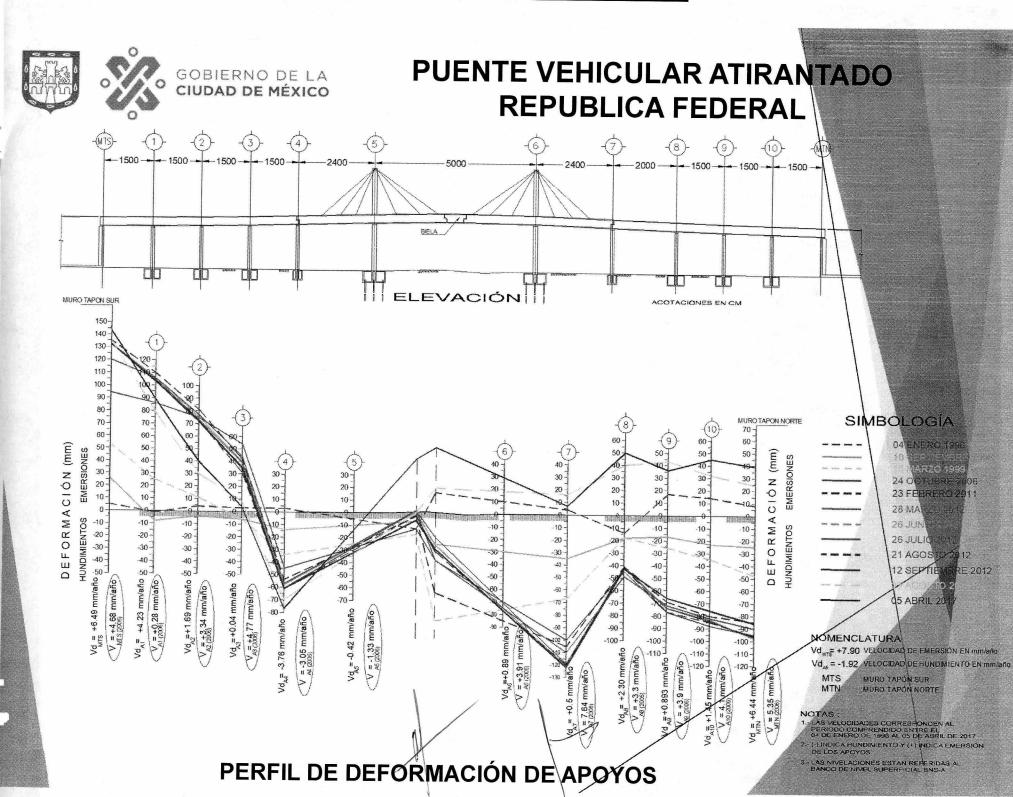



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PUENTE	AÑO 2017	AÑO 2018
1 ROJO GOMEZ	SIN INTERVENCION	MONITOREO TOPOGRAFICO REVISION DE CARGAS INSPECCION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SEGURIDAD Y SERVICIO
2 CANAL DE SAN JUAN	MONITOREO TOPOGRAFICO REVISION DE CARGAS EN TENSORES INSPECCION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SEGURIDAD Y SERVICIO REGISTROS Y LIMPIEZA DE CELDAS DE CIMENTACION EXPLORACION GEOTECNICA	MONITOREO TOPOGRAFICO
3 TELECOMUNICACIONES	SIN INTERVENCION	MONITOREO TOPOGRAFICO DE SEGUIMIENTO INSPECCION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SEGURIDAD Y SERVICIO REVISION DE CARGAS EN TENSORES
4 CRISOSTOMO BONILLA	MONITOREO TOPOGRAFICO REVISION DE CARGAS EN TENSORES INSPECCION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SEGURIDAD Y SERVICIO DEFINICION TECNICA DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES EXPLORACION GEOTECNICA REGISTROS Y LIMPIEZA DE CELDAS DE CIMENTACION (MASTILES)	MONTOREO TOPOGRAFICO DE SEGUIMIENTO RETENSADO DEL SISTEMA ATIRANTADO
5 REPUBLICA FEDERAL	REPARACION DE MENSULA CALZADO DEL APOYO No. 4	MONITOREO TOPOGRAFICO DE SEGUIMIENTO INSPECCION Y EVALUACION DEL ESTADO DE SEGURIDAD Y SERVICIO REVISION DE CARGAS EN TENSORES REHABILITACION ESTRUCTURAL
6 AMADOR SALAZAR	SIN INTERVENCION	MONITOREO TOPOGRAFICO RETENSADO DEL SISTEMA ATIRANTADO SUSTITUCION DE 9 TENSORES MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE CONTROL

ANEXO 2



URGENTE

Cludad de México, a 14 de enero de 2019.

CDMX/SOS/DGAF/0047/2019

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PRESENTE

Por medio del presente, adjunto copia fotostática del oficie No. SAF/SE/0083/2019 y Techo Presupuestal 2019 aprobado por el Congreso Local en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, correspondiente a esa Subsecretaría, con la finalidad que a más tardar el 17 de enero del presente, remita a esta Dirección a mi cargo los calendarios presupuestales respetando los importes del Analítico (CD) y apegándose a lo establecido en el oficio en comento, lo anterior para estar en condiciones de olicitar la autorización de los calendarios en el sistema de "Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP)" conforme a la fecha establecida.

Así mismo, en seguimiento a los oficios CDMX/SOS/DGAF/0022/2019 y CDMX/SOS/DGAF/0024/2019, mediante los cuales se dio a conocer los proyectos que corresponden a esa Subsecretaría (se anexa copia para pronta referencia), le solicito amablemente envíe antes del 1 de marzo del presente, el Formato "Ficha Técnica" debidamente requisitado para cada uno de los Proyectos de Inversión dados a conocer mediante los mismos, a fin de registrar dichos Provectos a través del Sistema GRP en la Cartera de Proyectos de Inversión que integra la Secretaría de Administración y Finanzas.

De igual forma, le solicito informar la distribución por Dirección General y por Dirección de Área, de los proyectos referidos en los oficios antes señalados.

Así también, le requiero tenga bien designar a un enlace, indicando nombre, teléfono y correo electrónico, a fin de dar seguimiento a los asuntos relacionados con este tema.

oro particular, reciba un cordial saludo.	Commence of the Commence of th
TENTAMENTE	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
IC. GABRIELA DEL OLINO ALBARRAN	CDMX 16 EME. 2018 Sound DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS FÚBLICAS RECIBIDO POR:
IRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION FINA	17AS (HORA: 13:55 P.M.
GOBI C.c.c.e. Ing. Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina Secertario de Obras y Reprisios C.P. Lorena Villarruel Salazar Directora de Finanzas en la Secretaria de Ing. Hugo Flores Sánchez- Director General de Obras para Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Gorstrecto iduenteso@cdmx.gob.mx Lic. Ángel Calderón Cruz Subdirector de Programación y Control Fresus	RNO DEL DISTRITO FEDERAL SERVINIAGEOTRAS SERVICIOS ® COMMA GOD. MMX DO SERVINIA DE COMPANO MENTO DE COMPANO MANON MMX 13 SECRETAR DE COMPANO MENTO DE COMPANO DE C
DA/LIVS/ACC/LEE/kmc*	ECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 0098' OBRAS PÚBLICAS "B3" RA 135
Plaza de la Constitución 1 2do niso Col Contro	noldia Cusubtaman C. D. nonna Cudad



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1ª. SESION ORDINARIA 2019

10. Asuntos Generales

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

La Licenciada Gabriela Del Olmo Albarrán, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaria de Obras y Servicios, con fundamento en los artículos 41 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De México; 92 y 115 fracción IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 169 del Código Fiscal del Distrito Federal, así como del artículo 21 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 8 de su Reglamento, emite el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS AÑO 2019

PROYECTO DE OBRA	MONTO AUTORIZADO (Pesos)	
Construcción de la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte, tramo Mixcoac Observatorio	1,554,742,148.00	
Bacheo y Pavimentación	1,100,000,000.00	
Construcción de Centros de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares)	1,000,000,000.00	
Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales	894,733,353.00	
Metrobús Eje 3 Ote./San Lázaro Glorieta de Vagueritos Línea 5	800,000,000.00	
Modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la red vial primaria	530,102,857.00	
Mantenimiento de Escuelas dañadas por el sismo	500,000,000.00	
Repavimentación de Central de Abastos	500,000,000.00	
Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México 2019	450,000,000.00	
Banquetas y Guarniciones	400,000,000.00	
Construcción del corredor vial para el transporte público Línea 5 del Metrobús, segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	388,560,909.00	
Construcción del Hospital General de Cuajimalna	350,000,000.00	
Creación, modernización, conservación y mantenimiento de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca Etiopía	348,444,444.00	
Cruces Conflictivos	300,000,000.00	
Residuos Sólidos	300,000,000.00	
Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público y Gestión del Mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial	294,362,222.00	
Alumbrado del Bosque de Chapultepec	250,000,000.00	
Centro Histórico	250,000,000.00	
Mantenimiento al Parque Ecológico Cuitláhuac	250,000,000.00	
Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México	200,000,000.00	
Edificio Reclusorio Santa Martha	200,000,000.00	
Renovación centros de transferencia modal CETRAMS	200,000,000.00	
Construcción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco	170,000,000.00	
Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	150,000,000.00	
Hospital Topilejo	150,000,000.00	
Modernización Planta de Asfalto	150,000,000.00	
Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías Rápidas, Vías Primarias y Ejes Viales de la Ciudad de México	149,087,907.00	
Construcción de Preparatoria del IEMS	100,000,000.00	
Estación de transferencia en Colonia Industrial Vallejo	100,000,000.00	
Mantenimiento a Bosque de Aragón	100,000,000.00	
Áreas Verdes Gran Canal	100,000,000.00	
Ampliación de la estación Terminal del Metrobús El Caminero	100,000,000.00	
Centros de Salud	100,000,000.00	
Áreas Verdes Parque Ecológico Xochimilco	100,000,000.00	
Construcción cuarto Bici estacionamiento masivo	100,000,000.00	

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
70,000,000.00
95,000,000.00

^{*}Los datos de este programa son de carácter informativo, por lo que no implica compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar sin responsabilidad para el Gobierno de la Ciudad de México.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 1 de febrero de 2019

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

(Firma)	
LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN	
