



AMPLIACIÓN LÍNEA 5 DEL METROBÚS Segunda etapa



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



Ampliación **Metrobús Línea 5**

San Lázaro - Preparatoria 1

2,154 mdp

Inversión total



18.5

kilómetros de longitud

34

estaciones

135 mil

personas beneficiadas

Conexión con sistemas masivos de transporte



Terminal Oriente
TAPO



Alcaldías beneficiadas: Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



Ampliación **Metrobús Línea 5** Primera Etapa


San Lázaro - Calzada de las Bombas

1,711 mdp

Inversión

27 estaciones

14.5 kilómetros

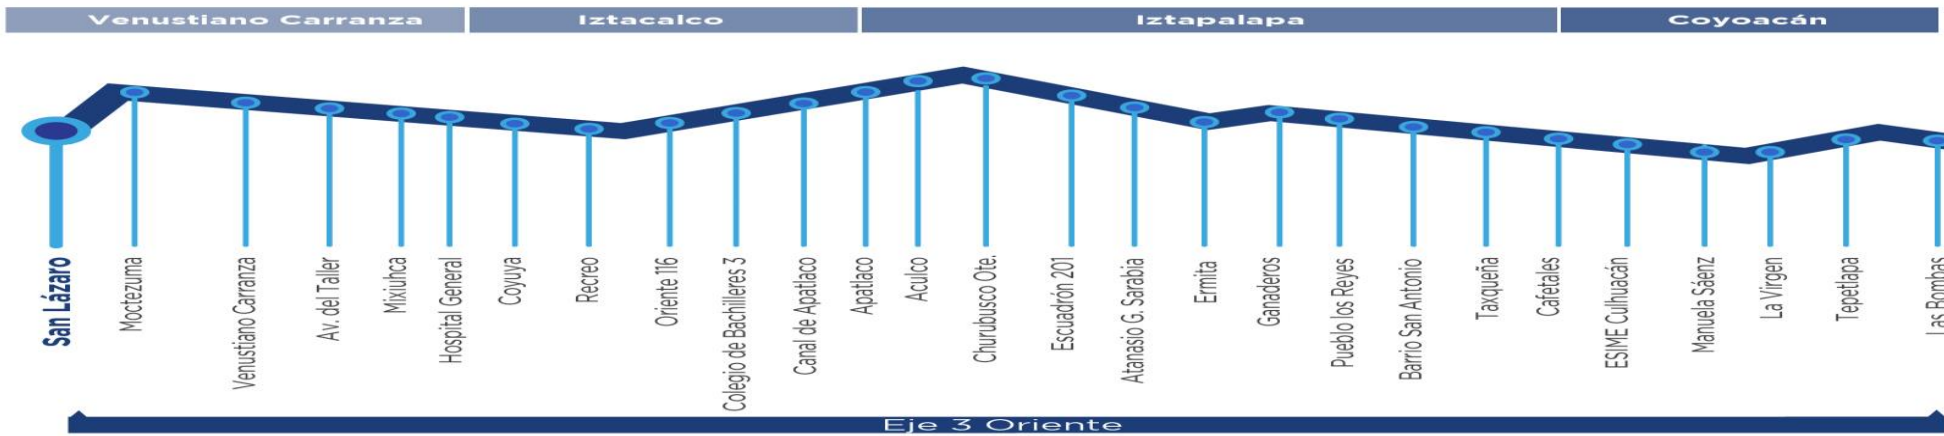

Ampliación **Metrobús Línea 5 Segunda Etapa**

Calzada de las Bombas - Preparatoria 1

443 mdp

Inversión

Coyoacán Tlalpan Xochimilco

3.98


kilómetros de longitud

7


estaciones

96 %


avance

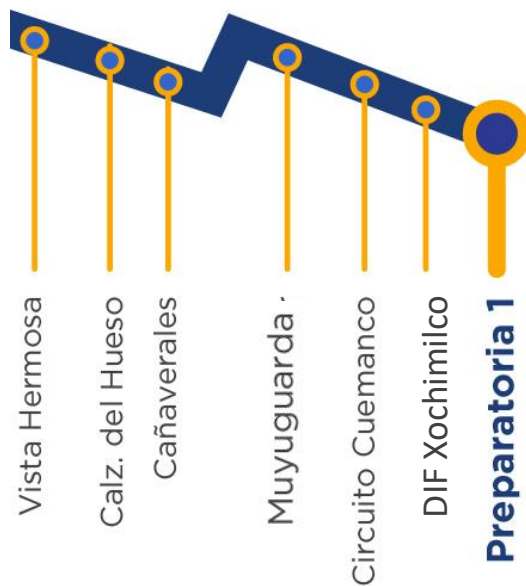

98 %
Avance

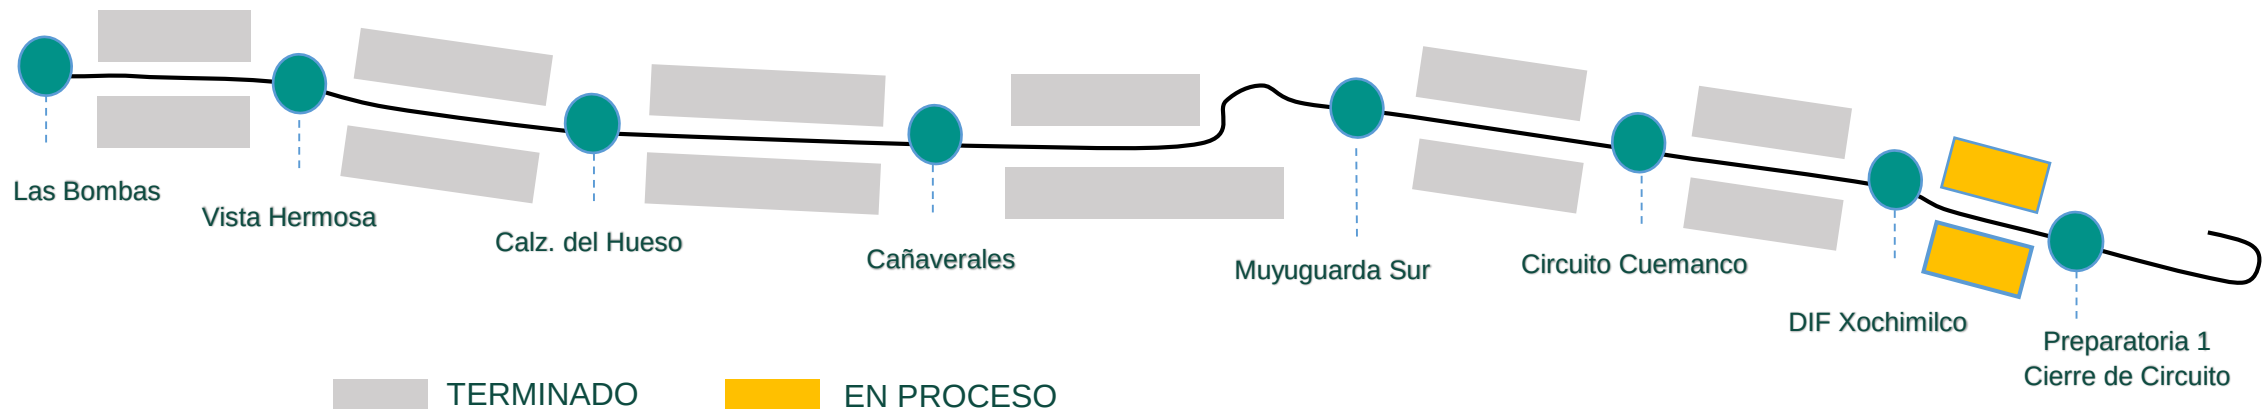

CARRIL CONFINADO

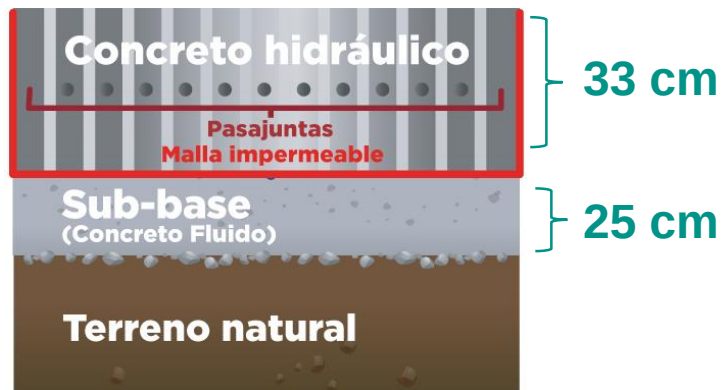

	Avance	Meta	Longitud
Asfalto (Puente Muyuguarda)	100%	5,440 m ²	.85 km
MR-45	99%	24,470 m ²	3.13 km



Carriles **Adyacentes**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS




MB

	Avance	Avance m2	Meta	Longitud
Asfalto	87%	46,757.4 m2	53,547.4 m2	3.98 km



95 %
Avance

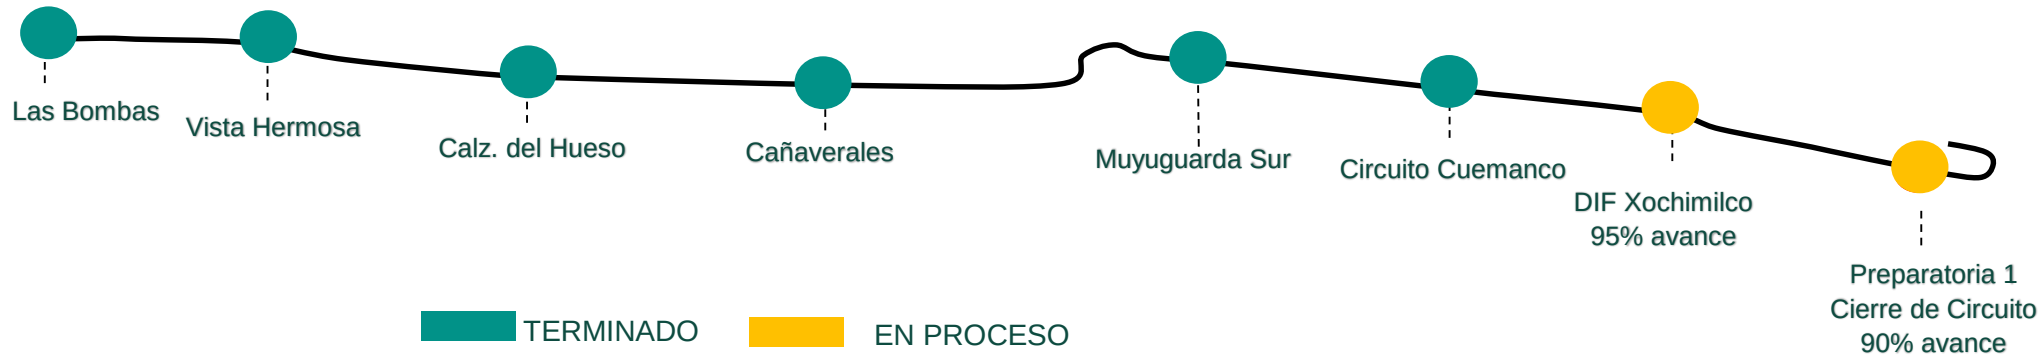


Características de las Estaciones

- Estructura de acero
- Mamparas de cristal
- Techumbre de policarbonato
- Acceso universal a nivel de vialidad
- Guía táctil en accesos, rampa y en interior
- Tactogramas
- Pasarela con barandal de acero
- Cámaras de videovigilancia
- Luminarias LED en interior y acceso
- Módulos de servicios



Estación	Agua potable	Torres de alta tensión	Agua tratada	Drenaje	Gas	Rejillas	Descargas domiciliarias
Vista hermosa	240 m		300 m				
Calzada del Hueso	70 m		320 m				
Cañaverales	900 m		680 m		150 m		
Muyuguarda				760 m	31 m		30 descargas
Circuito Cuemanco				1240 m		50 pzas	
DIF Xochimilco				1720 m		69 pzas	
Preparatoria 1	190 m	3 sustituciones		360 m	200 m		
TOTAL	1400 m	3 torres	1300 m	4080 m	381 m	119 piezas	30 descargas

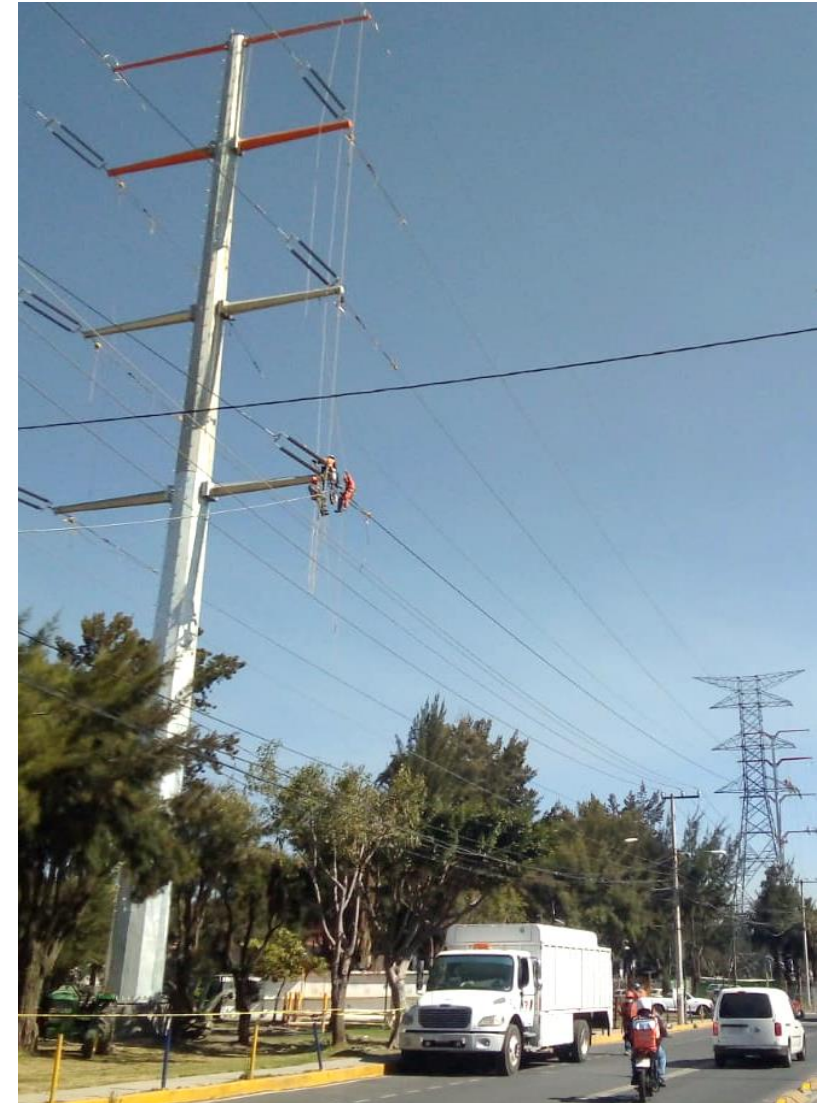

- Sustitución de 3 torres de CFE por poste troncocónico

Estación Vista Hermosa




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



100 %
Avance

Construcción	Altura	Tipo de Estación
339 m ²	4.5 m	Acceso a nivel / 1 cuerpo

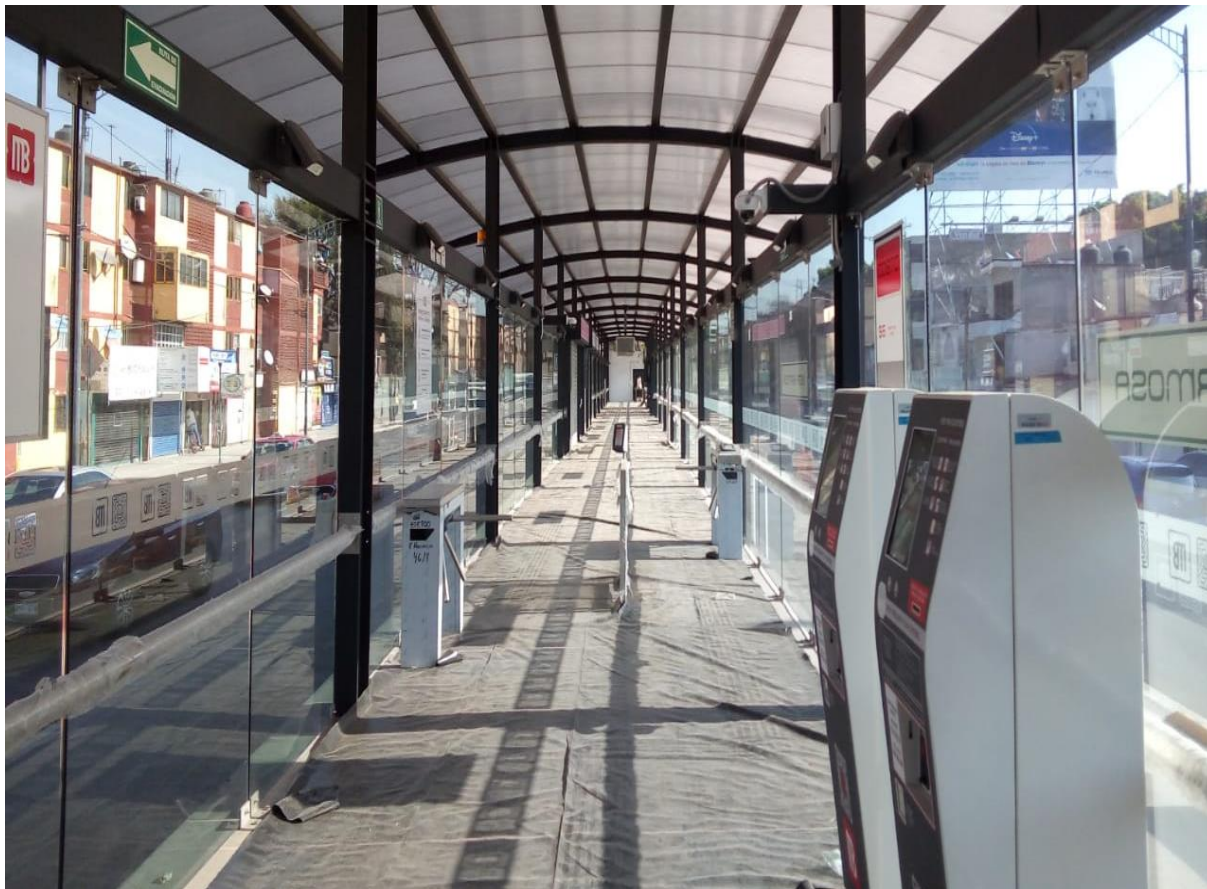

- Máquinas de recaudo y señalética



- Detalles en muro verde

Estación Calzada del Hueso



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



100 %
Avance

Construcción

339 m²

Altura

4.5 m

Tipo de Estación

Acceso a nivel / 1 cuerpo



- Torniquetes de acceso



- Señalética exterior

Estación Cañaverales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



100 %
Avance

Construcción

244 m²

Altura

4.5 m

Tipo de Estación

Acceso a nivel / 1 cuerpo



- Colocación de cenefa en mamparas



- Sistema de pararrayos

Estación Muyuguarda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



MB

100 %
Avance

Construcción

304 m²

Altura

4.5 m

Tipo de Estación

Acceso a nivel / 1 cuerpo



- Limpieza de mamparas y andén



- Detalles en muro de andén

Estación Circuito Cuemanco



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



100 %
Avance

Construcción


304 m²

Altura


4.5 m

Tipo de Estación

Acceso a nivel / 1 cuerpo

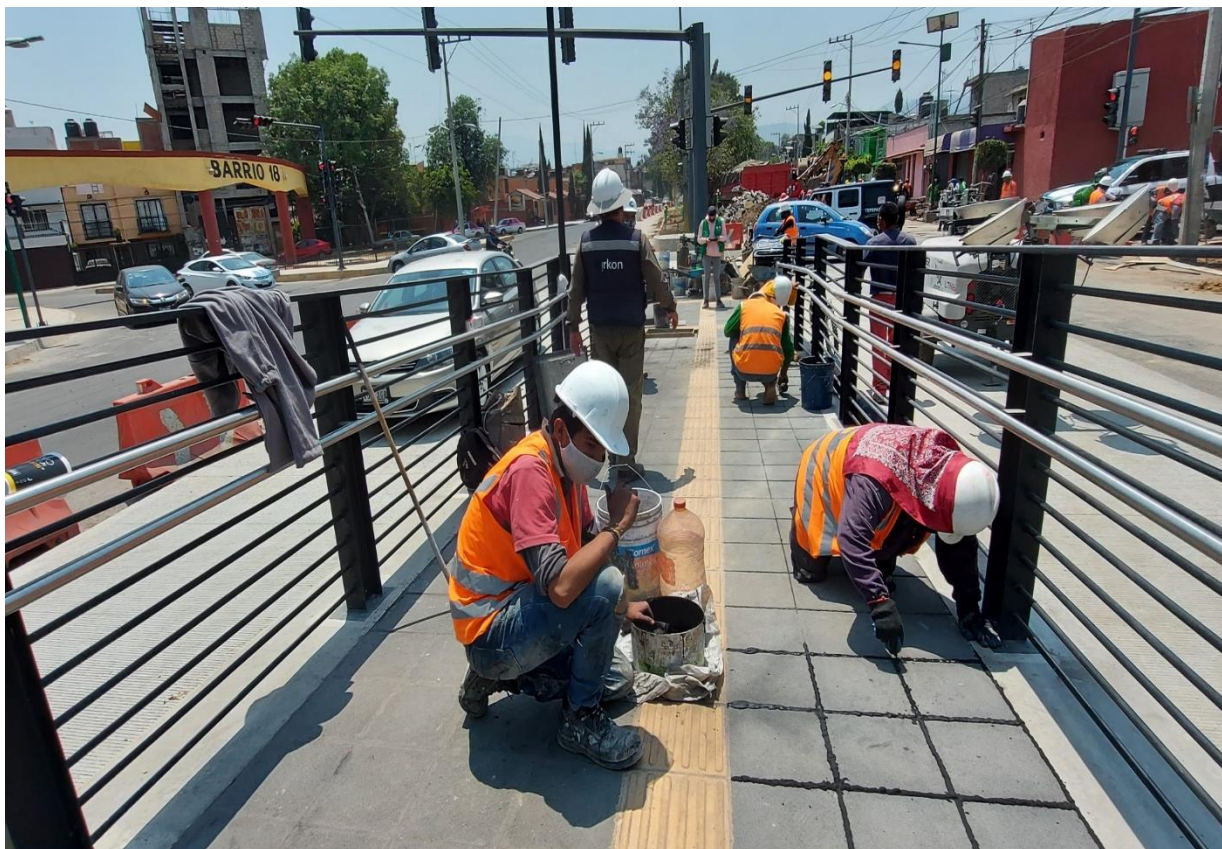

- Colocación de guía táctil

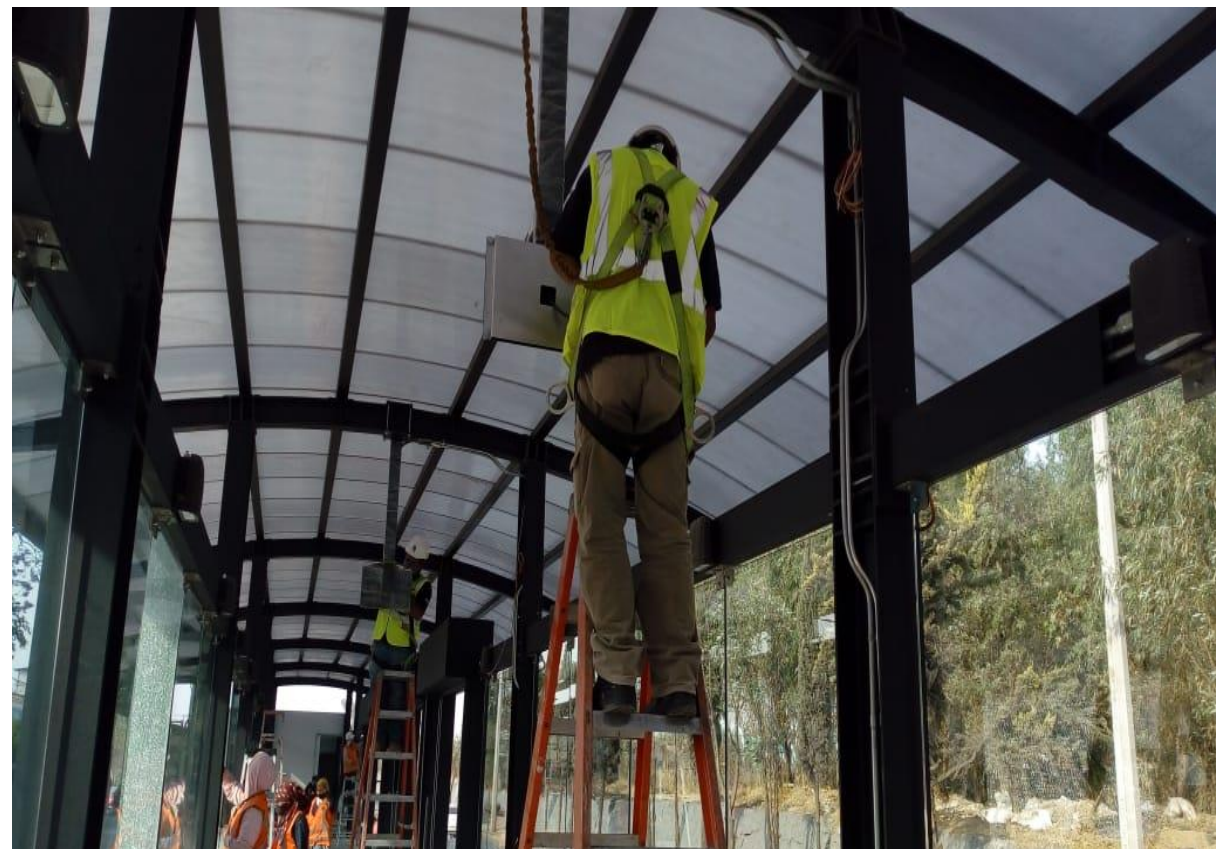

- Colocación de pantallas

Estación DIF Xochimilco



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



95 %
Avance

Construcción

315 m²

Altura

4.5 m

Tipo de Estación

Acceso a nivel / 1 cuerpo



- Colocación de mamparas de cristal



- Detalles en pisos, herrería e instalaciones

Estación Preparatoria 1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



90 %
Avance

Construcción

421 m²

Altura

4.5 m

Tipo de Estación

Acceso a nivel / 2 cuerpos



- Detalles en pisos y guía táctil



- Colocación de mamparas de cristal y policarbonato

Guarniciones y Banquetas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



12.5 km
guarniciones

19,000 m²
banquetas

90 %
Avance




7 Cruces Seguros



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

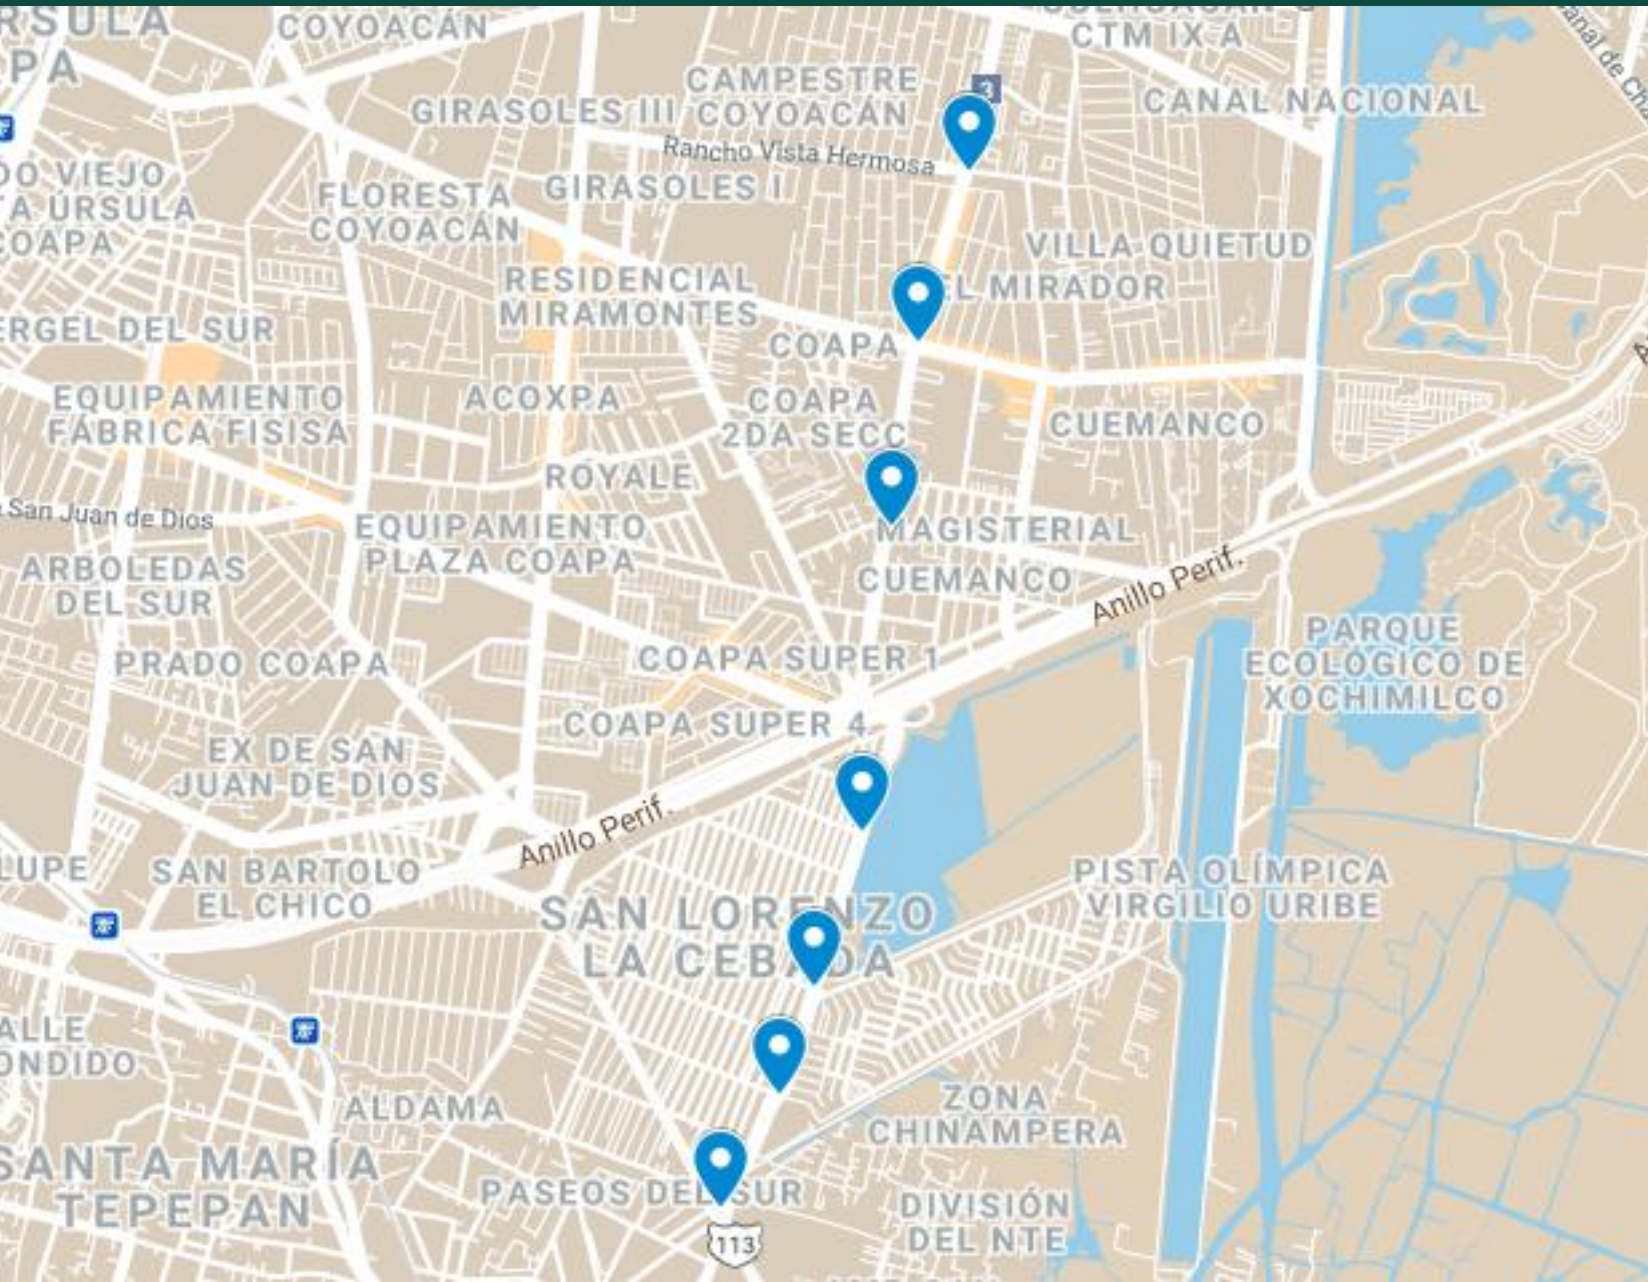

1. Av. Cafetales y Rancho Vista Hermosa
2. Av. Cafetales y Calzada del Hueso
3. Av. Cafetales y Cañaverales
4. Muyuguarda y Bases Orgánicas
5. Muyuguarda y Constitución de 1857
6. Muyuguarda y Constitución de 1824
7. Muyuguarda y Prol. División del Norte



- Muros verdes en estaciones

2,206 árboles plantados



15,000 plantas y arbustos



17,738 m² pintura en fachadas



Tramos intervenidos	Luminarias
Calzada de las Bombas - Periférico Sur	80
Calzada de las Bombas - Periférico Sur	60
Bajo puente de Muyuguarda	22
Total	162



Actividades	19 de abril	20 al 30 de abril	1 de mayo
Conclusión de la obra			
Pruebas operativas			
Inicio de operaciones			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS
