REHABILITACIÓN AV. CEYLÁN

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

AV. CEYLÁN

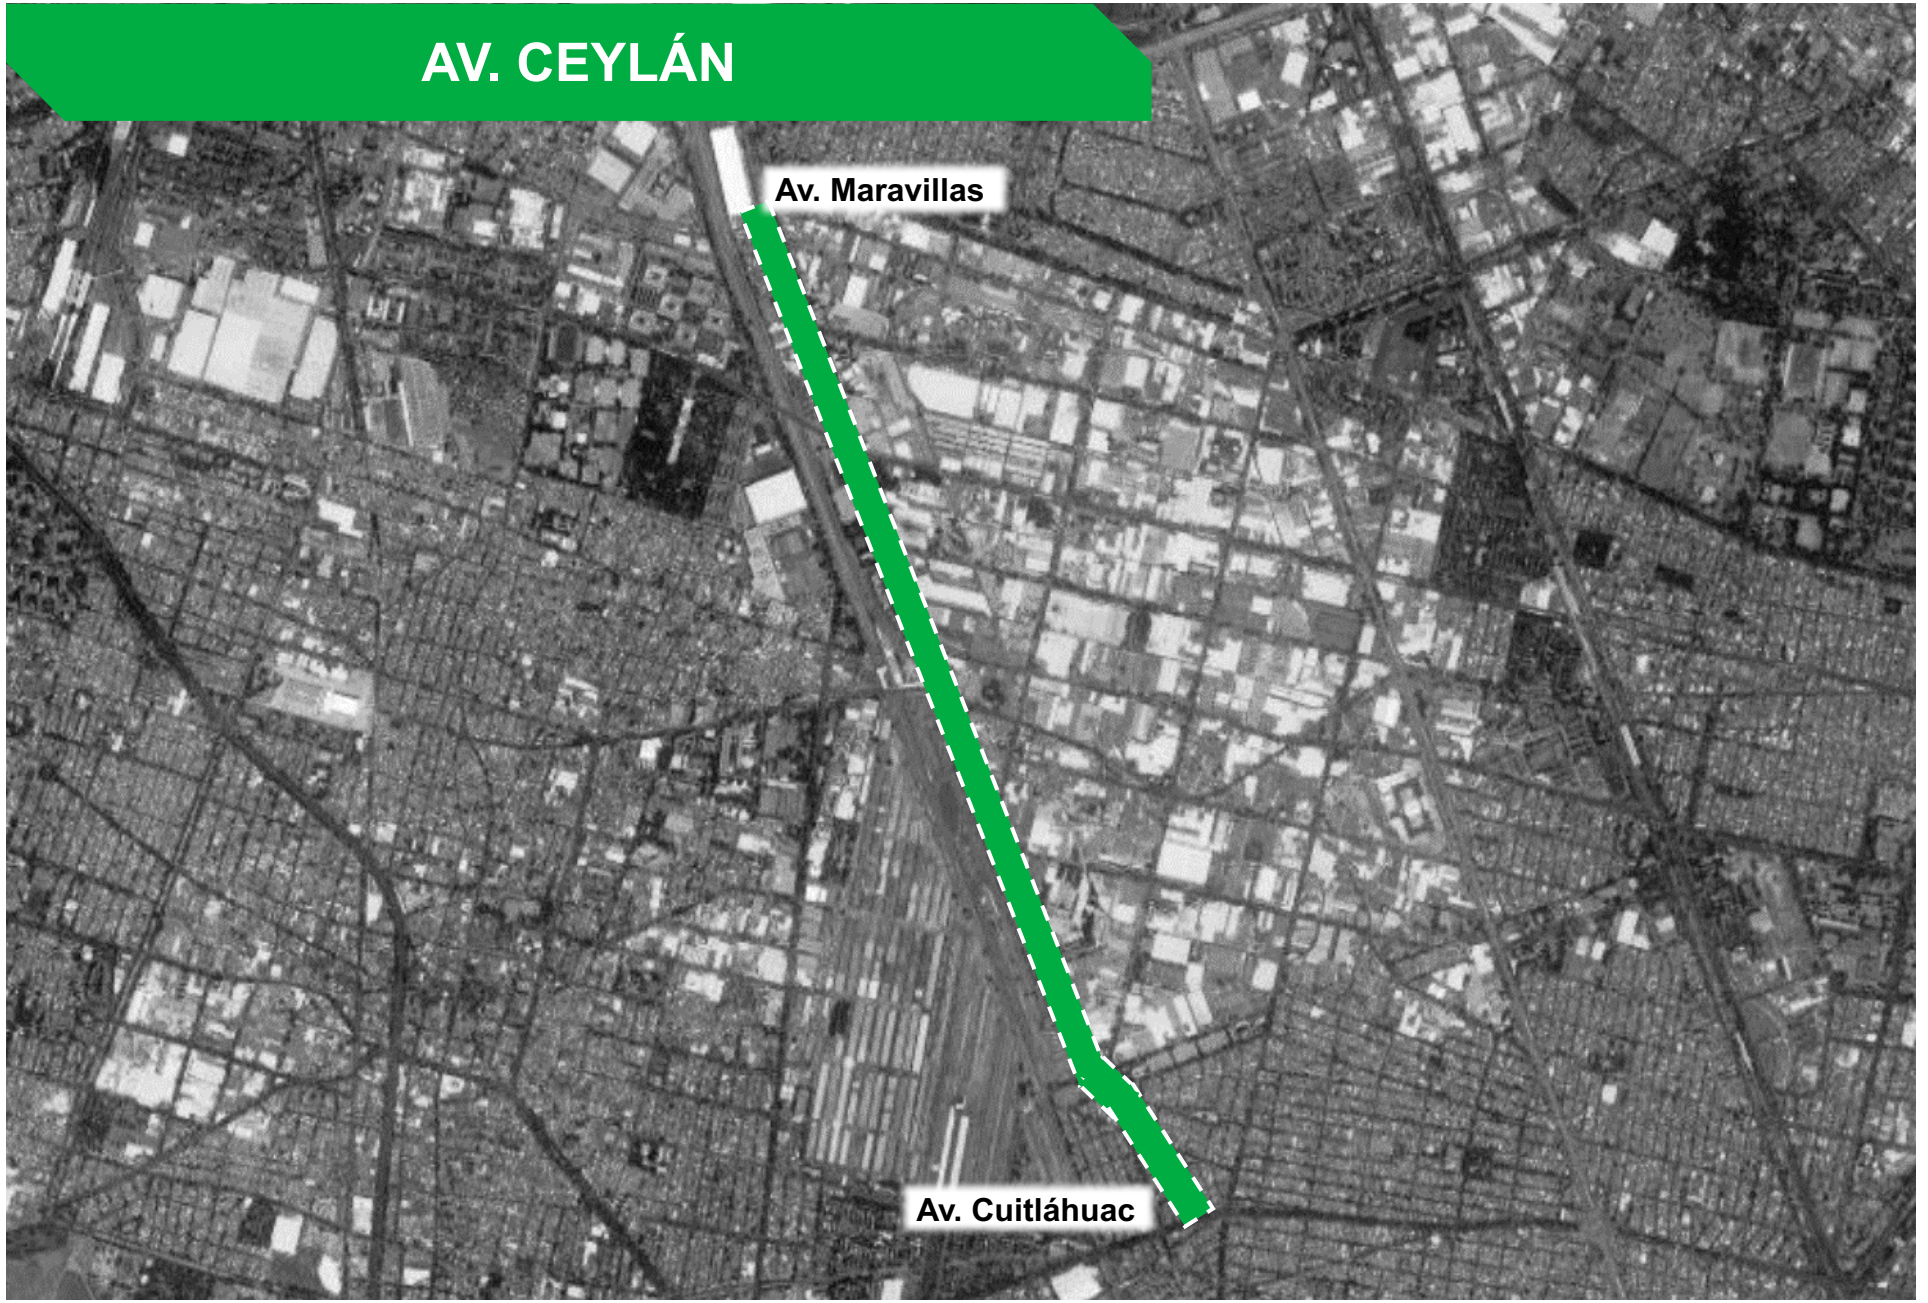

INVERSIÓN TOTAL

248.7 mdp

129.8 mdp (SOBSE)

118.9 mdp (SACMEX)

4.2

kilómetros de longitud

103,049 m²

de superficie intervenida

1,100,000

personas beneficiadas

AV. CEYLÁN

103, 049 m²
de área total intervenida

5,335 m²
de área peatonal

97,714 m²
de área vial rehabilitada

77
árboles nuevos

100,000
plantas, arbustos, cubresuelos

226
luminarios LED sustituidos y nuevos

BALIZAMIENTO

25, 962 ml
de pintura en señalamiento horizontal (líneas / franjas)

56 pzas
de pintura en señalamiento horizontal (logos / flechas)

420
guías táctiles

192
bolardos

12
cruces seguros

110
señalamientos verticales

AV. CEYLÁN

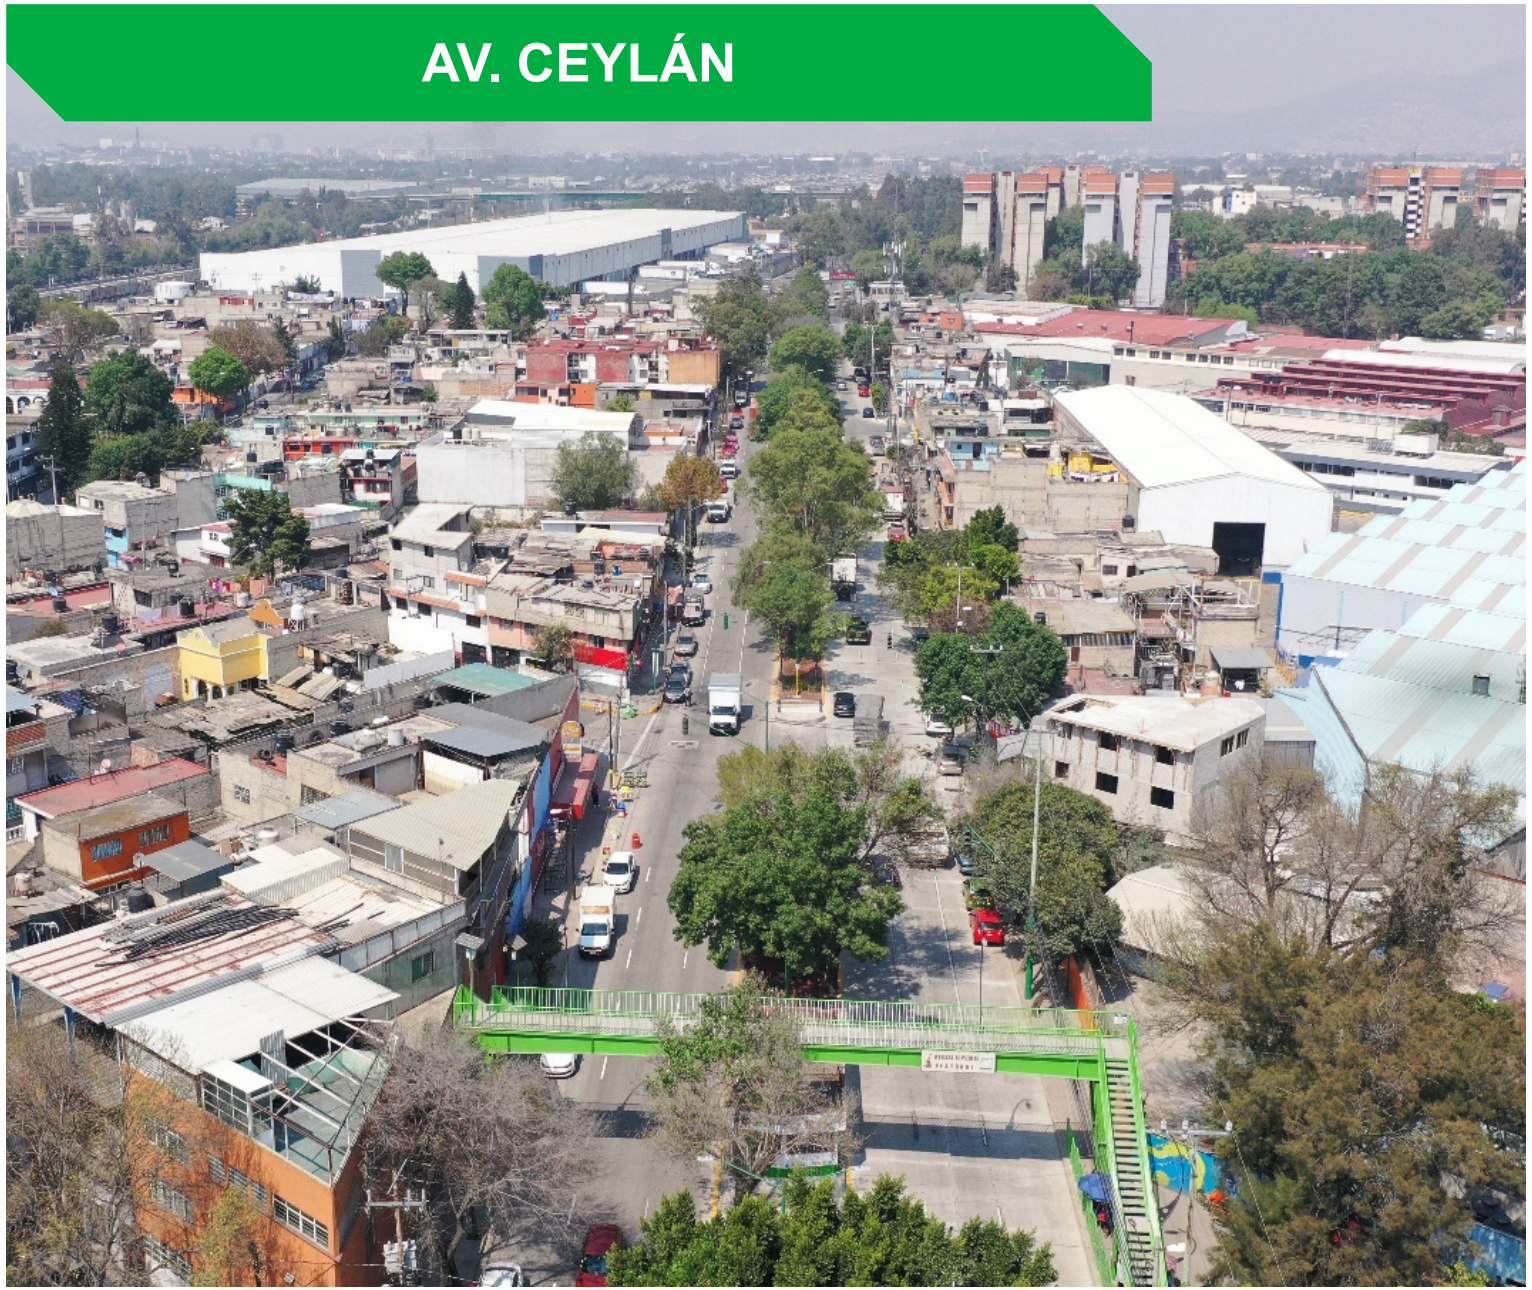

ACCIONES REALIZADAS

- Repavimentación de la vialidad con concreto hidráulico.
- Rehabilitación de banquetas y guarniciones en mal estado.
- Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- Implementación de cruces seguros.
- Reconfiguración vial (incorporación de señalamiento horizontal).
- Renovación y nivelación de pavimentos.
- Nueva infraestructura de agua potable y drenaje a cargo de (SACMEX).
- Colocación de árboles, plantas y arbustos.
- Colocación de luminarias LED.
- Aplicación de pintura en muros y fachadas con graffiti.
- Colocación de ducto de polietileno de alta densidad (PAD) de 4” para Baja y Media tensión.

CONCRETO HIDRÁHULICO

97, 714 m²
de área vial rehabilitada

75,275 m²
de área vial rehabilitada con **concreto hidráulico**

22,439 m²
de área vial rehabilitada con **carpeta asfáltica**

7,360 m²
boca calles y mapeo

15,079 m²
repavimentación
Puente Eje 4 Norte

BANQUETAS

5,335 m²
de área banquetas y cruces atendidas

2,282 ml
de guarniciones

MUROS Y FACHADAS

6,800 m²
de aplicación de pintura
en bardas y fachadas
con graffiti

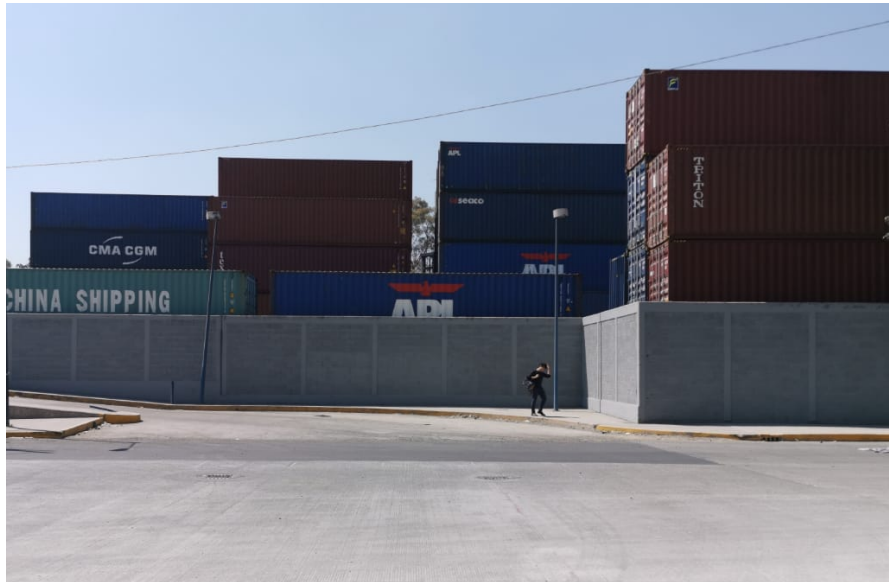

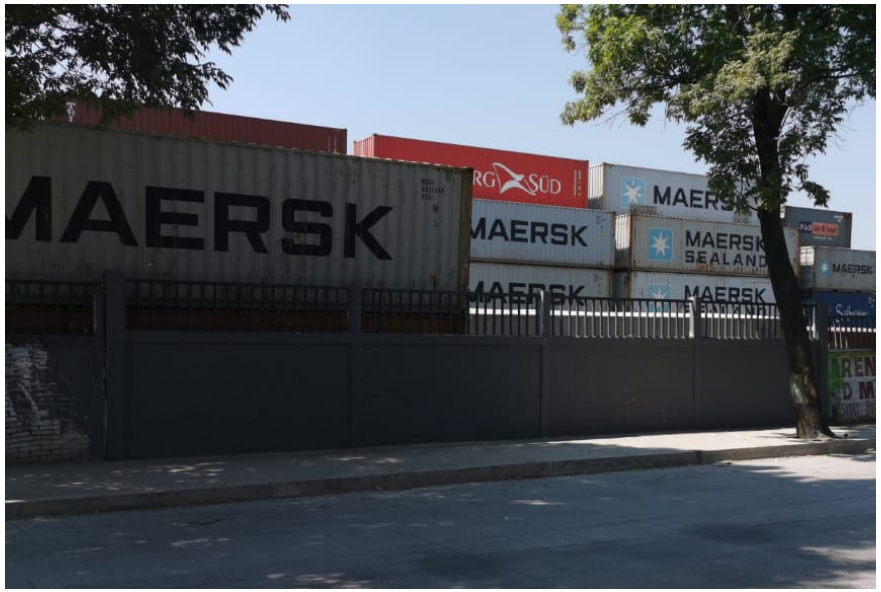

MURALES

9
murales

2770 m2

MURALES

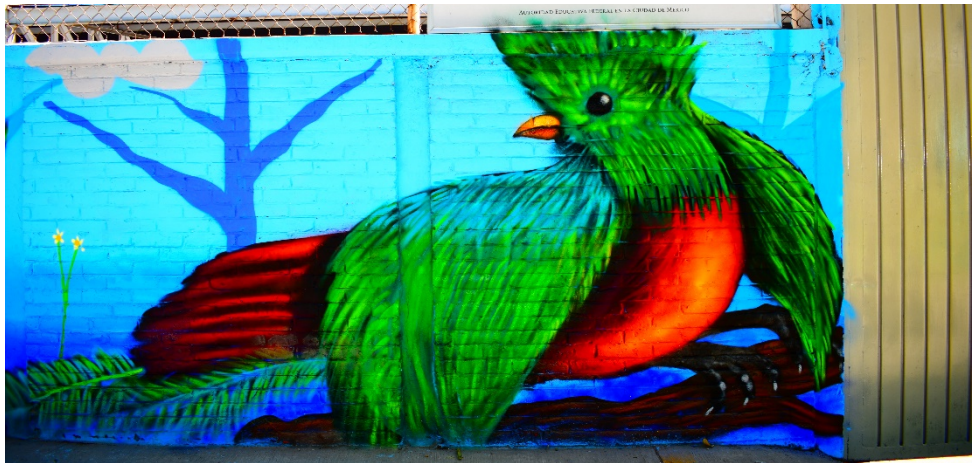

MURALES

MURALES

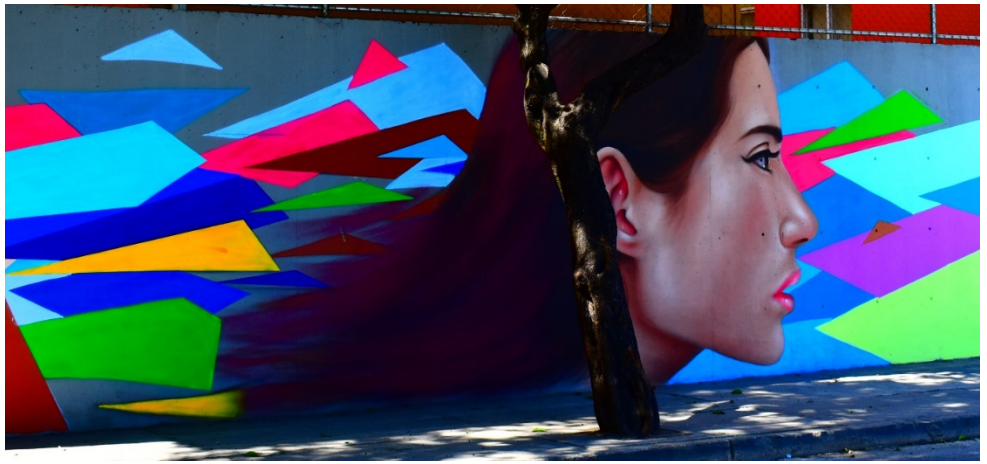

OBRA CIVIL EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN

3,338 ml

de ducto PAD para baja y media tensión



1,077 ml

de ducto de polietileno de alta densidad (PAD) de 4”

2,261 ml

de ducto de polietileno de alta densidad (P6A4-PAD) de 6X4”, 2X2”

BURLADEROS EN ESCUELAS

1.- PRIMARIA “15 DE SEPTIEMBRE”

2.- SECUNDARIA “VENUSTIANO CARRANZA”

3.- PRIMARIA “PRESIDENTES DE MÉXICO”

4.- SECUNDARIA “JESÚS F. CONTRERAS”

5.- PRIMARIA “AUSTRIAS”

6.- PRIMARIA “OBRERO MÉXICANO”

112 ml | **95 piezas** de burladeros **6 escuelas**

ANTES Y DESPÚES

ANTES

DESPUÉS

ANTES Y DESPÚES

ANTES

DESPUÉS

12 CRUCES SEGUROS

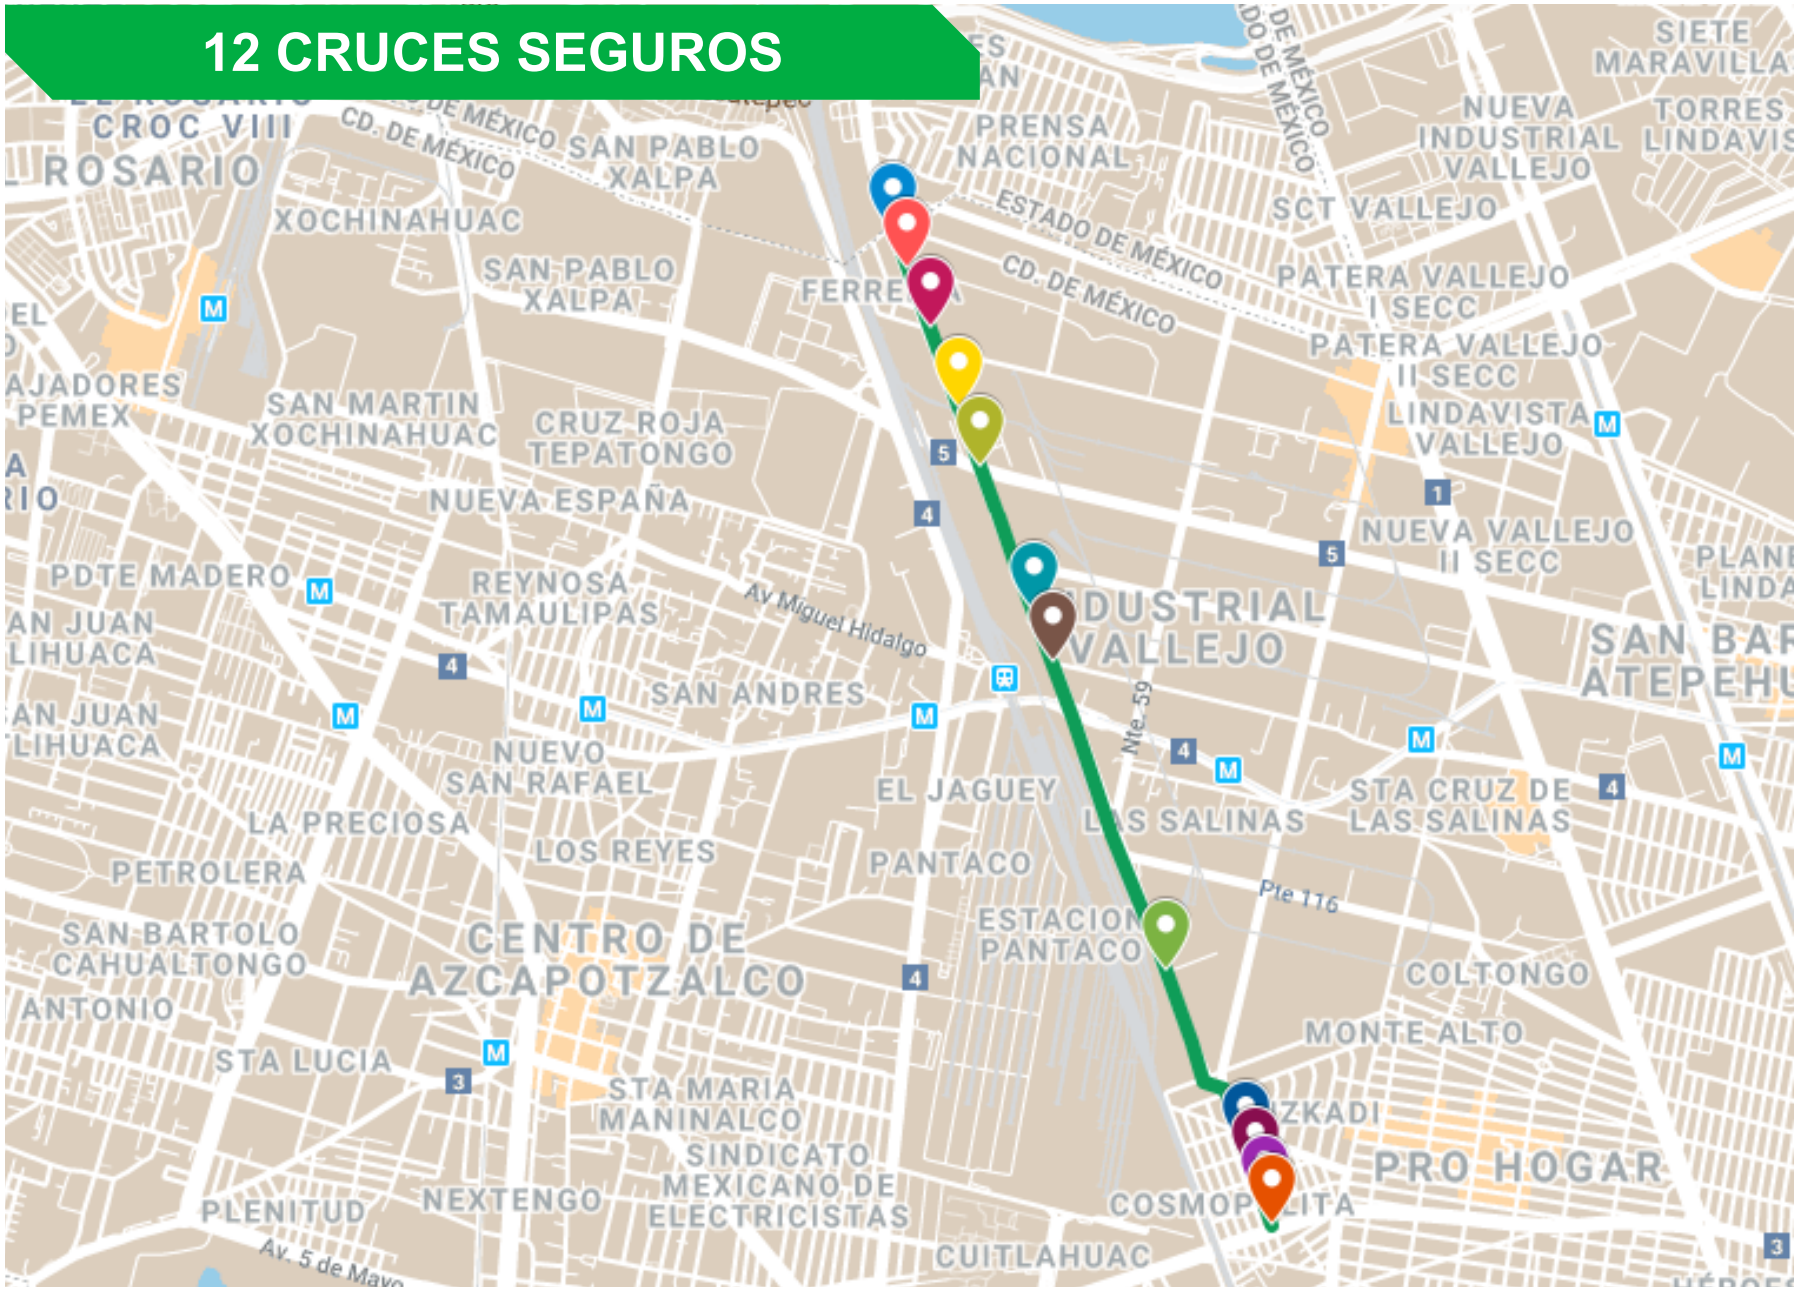

UBICACIÓN

Av. Ceylán

1.-Maravillas

2.- Poniente 148

3.- Colombo

4.- Vías férreas

5.- Poniente 140

6.- Privada Ceylán

7.- Poniente 128

8.- Cerrada Ceylán

9.- Madeira

10.- Aleutianas

11.- Ibiza

12.-Cuitláhuac

CRUCES SEGUROS

1.- Maravillas

2.- Poniente 148

3.- Colombo

4.- Vías Férreas

5.- Poniente 140

6.- Privada Ceylán

CRUCES SEGUROS

7.- Poniente 128

8.- Cerrada Ceylán

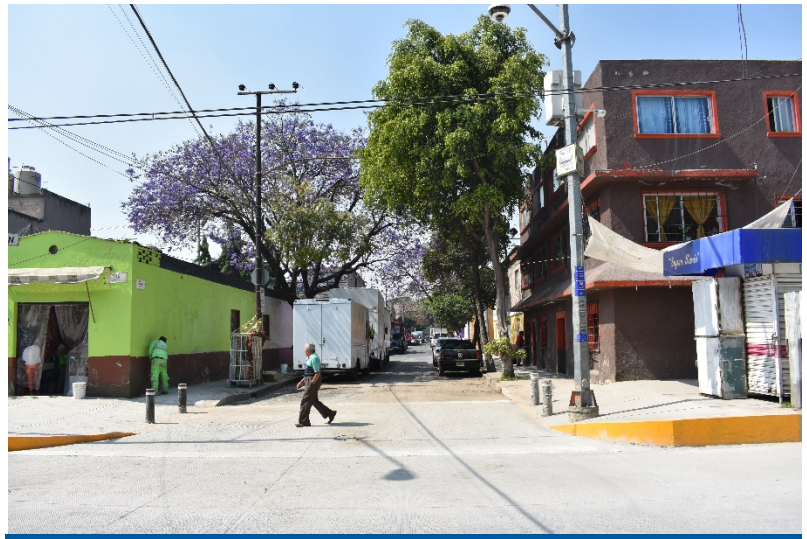

9.- Madeira

10.- Aleutianas

11.- Ibiza

12.- Cuitláhuac

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

AV. CEYLÁN

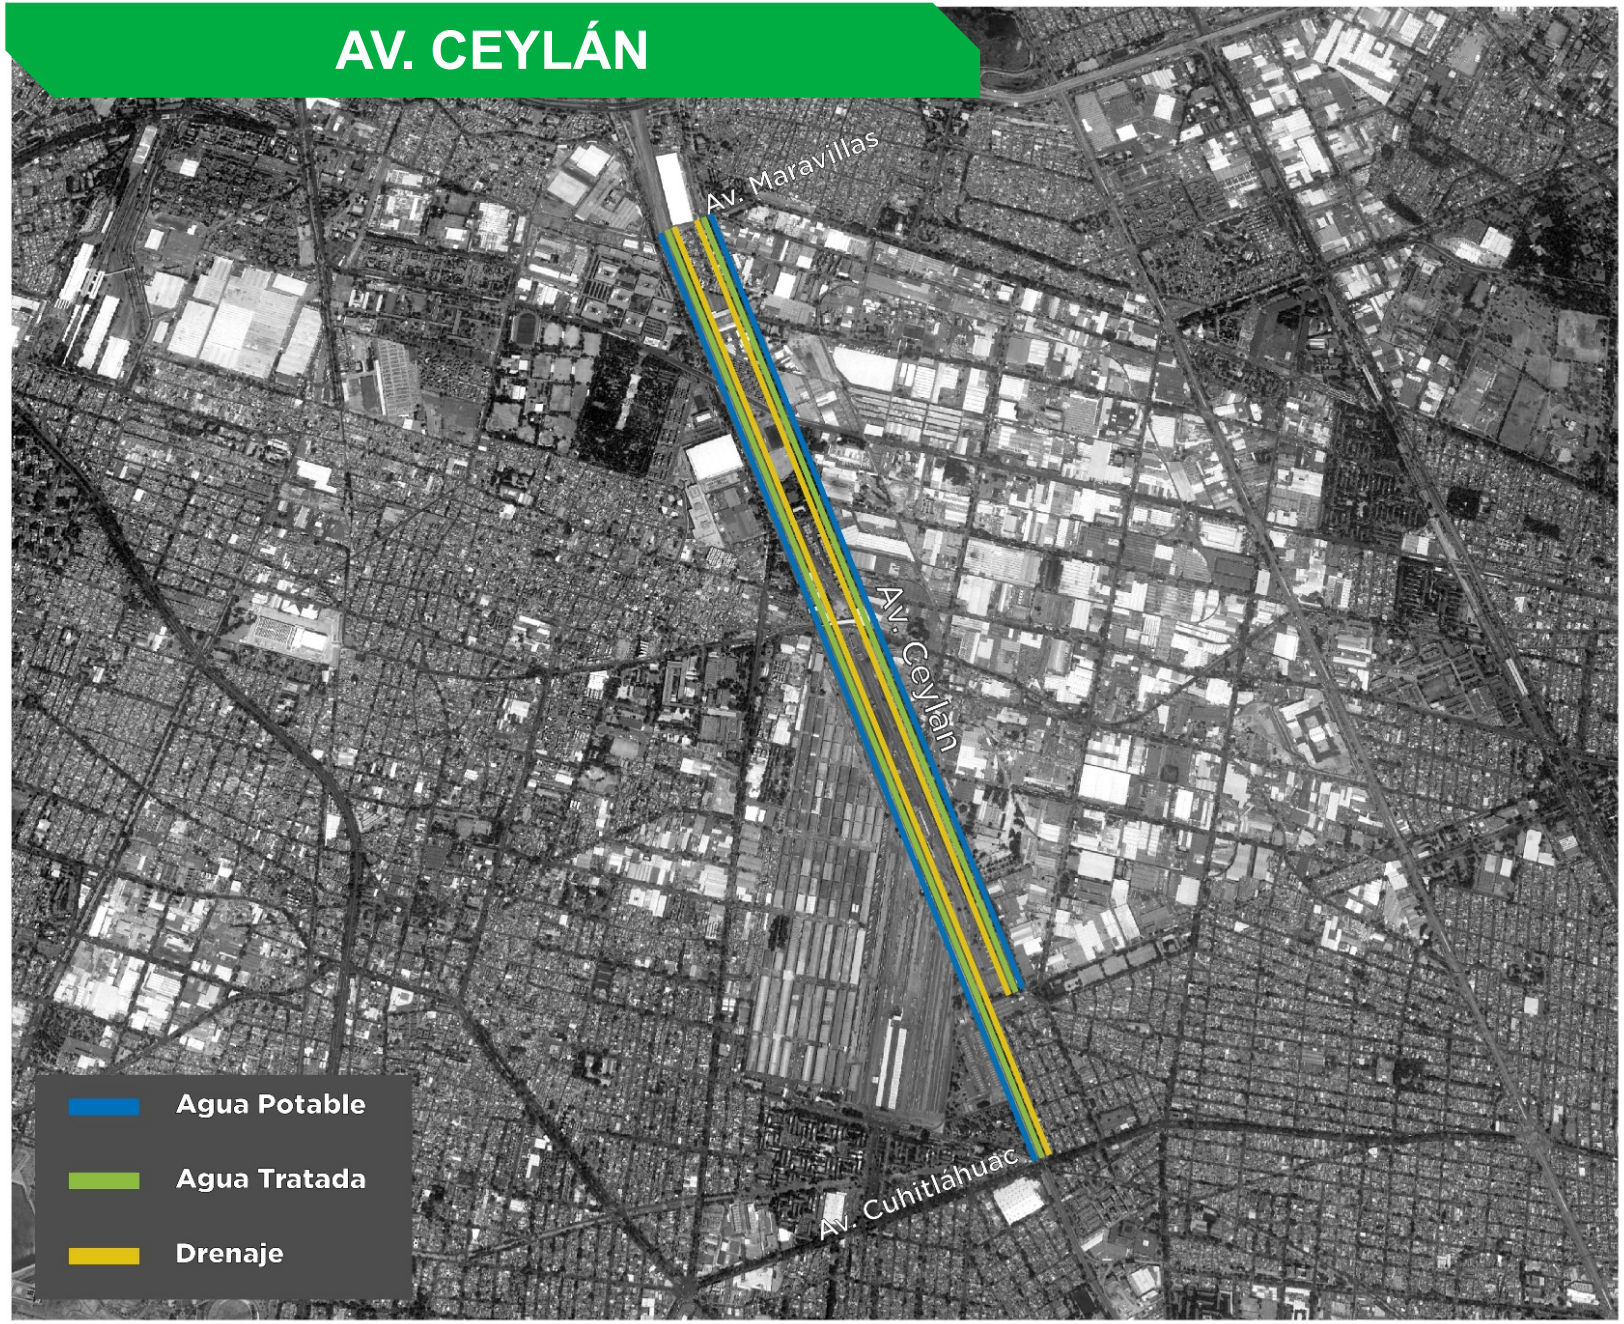

INVERSIÓN

118.90 mdp

17.7

Kilómetros de longitud

35 mil

Habitantes beneficiados

Trabajos

De Av. Maravillas
Hasta la
Av. Cuitláhuac

Sustitución de las Redes de:

Agua Potable
Agua Tratada
Drenaje

AV. CEYLÁN

TRABAJOS EN LA RED DE AGUA TRATADA

Longitud: 3.5 km

Material: Polietileno de alta densidad

Tomas domiciliarias rehabilitadas: 12 cajas y 4 tomas

TRABAJOS EN LA RED DE AGUA POTABLE

Longitud: 7.3 km

Material: Hierro Dúctil

Tomas domiciliarias rehabilitadas:
7 cajas de hierro dúctil,
37 cajas y 119 toma

TRABAJOS EN LA RED DE DRENAJE

Longitud: 6.9 Km

Material: Tubería de polietileno corrugada

Accesorios de drenaje:
205 Descargas de drenaje

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS
